



UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

"2018, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL"

Oficio No. VRAD/E/213/2018.

Teotitlán de Flores Magón, Oax., a 10 de septiembre de 2018.

ACUSE

**DOCTOR
SALVADOR ALEJANDRO MALO ALVAREZ**
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA DGESU
P R E S E N T E:

Por este conducto y en atención al oficio 511-3/2018.-0511 de fecha 23 de mayo de 2018 y en alcance al similar 511/2015.-0373 envió el informe de los avances con fecha corte 31 de agosto de 2018, de las obras apoyada a través del Recurso FAM 2018 (anexo CD con información magnética).

Por lo antes expuesto, remito a usted el reporte actualizado en archivo electrónico formato Excel y de manera electrónica a los correos rocioc@nube.sep.gob.mx, cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx y jcarlosv@nube.sep.gob.mx

Así mismo y en alcance al oficio número: 511-3/2018.-0845 de fecha 31 de agosto de 2018, me permito enviarle el acta administrativa de la obra No. 3 "Equipamiento de Aulas y Modernización de Luminarias en la Universidad de la Cañada del FAM 2017.

Sin otro particular, le reitero mi más distinguida consideración.


ATENTAMENTE

"praeteritum noscere, posterum melior"


L.C.E. ALTONSO MARTÍNEZ LOPEZ
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



VICE-RECTORÍA DE
ADMINISTRACIÓN



C.c.p.- DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ.- Rector de la Universidad de la Cañada.- Para su superior conocimiento.
DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARAZ.- Director de Fortalecimiento Institucional.-Para su conocimiento.
Archivo.

2018

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
agosto_2018
FECHA DE CORTE: 31/08/2018

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad de la Cañada**
Entidad federativa: Oaxaca
Clave Inst 911: 20MSU0032V

RESPONSABLES

Nombre: **L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ**
Cargo: **VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN**
Teléfono: **(236) 372 07 15, Ext.: 200**
Correo electrónico: **vica_admin@unca.edu.mx**

Nombre: **ARO. MELANY CUEVAS MANUEL**
Cargo: **JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**
Teléfono: **(236) 372 07 15, Ext.: 208**
Correo electrónico: **melany60@hotmail.com**

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obras de conservación	Equipamiento	Adquisiciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustancial				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recpción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recpción	Monto de Acta Administrativa
1	Equipamiento del Laboratorio de Investigación de la Universidad de la Cañada	X					\$ 3,119,282.00	\$ -	\$ 3,119,282.00						0			El proyecto se encuentra en trámite administrativo.						
										TOTAL	0	0.00	GLOBAL DEL PROYECTO											
2	Mantenimiento de diversas áreas de la Universidad de la Cañada		X				\$ 950,650.80	\$ -	\$ 950,650.80						0			El proyecto se encuentra en trámite administrativo.						
										TOTAL	0	0.00	GLOBAL DEL PROYECTO											
3	Construcción de una Cancha de Usos Múltiples, en la Universidad de la Cañada.		X				\$ 1,620,282.96	\$ -	\$ 1,620,282.96						0			Con fecha 26 de Junio fue autorizado el cambio de proyecto.						
										TOTAL	0	0.00	GLOBAL DEL PROYECTO											
8	Reemplazo de Boilers de gas por Calentadores solares e implementación de Watthorímetros en el Edificio de Departamentos de la Universidad de la Cañada.			X			\$ 187,532.00	\$ -	\$ 187,532.00						0			El proyecto se encuentra en trámite administrativo.						
										TOTAL	0	0.00	GLOBAL DEL PROYECTO											
							\$5,877,727.76	\$0.00	\$5,877,727.76			GLOBAL DEL PROYECTO												

DR. MOOERTO SEARA VAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de IES


¹ Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas fotos como sea necesario.

² En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

³ Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd/mm/aa.



Universidad de la Cañada
RECTORÍA



Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2018

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
agosto_2018


FECHA DE CORTE: 31/8/2018

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIMORDIA: **1**

Nombre de la obra: **Equipamiento del Laboratorio de Investigación de la Universidad de la Cañada**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

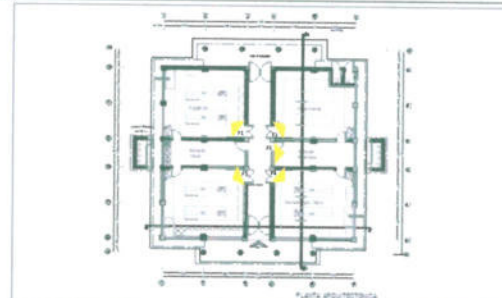

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7, Paraje Tiltlacuatitla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.



Universidad de la Cañada

Porcentaje de avances

0

FOTOS



F1: Vista Interior Inorganica



F2: Vista Interior Instrumental

Comentarios de los trabajos realizados:

Aun no se tienen trabajos realizados, debido a que el estatus de la obra se encuentra "en proceso Administrativo"



F3: Vista Interior Almacan de Reactivos



F4: Vista Interior Bromatologia/Micro



F5: Vista Interior Organica

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES

ING. MELANY CUEVAS MANUEL

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

Es muy importante que se anexe reporte fotografico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma foto, mismo ángulo y lugar, que el antes, durante y despues de la obra.



2018

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES


DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
agosto_2018
FECHA DE COORTE 31/08/2018

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIMORDIA 2 Nombre de la obra: **Mantenimiento de diversas areas de la Universidad de la Cañada**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

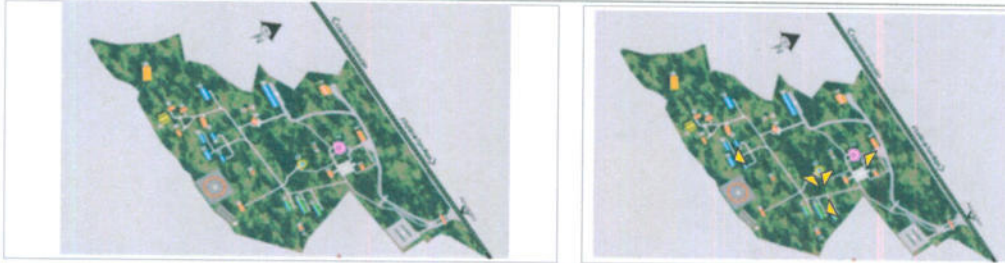

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7; Paraje Tiltlacuettla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.



Universidad de la Cañada

Porcentaje de avance

0

FOTOS



F1: Fachada principal Biblioteca



F2: Área Superior de Biblioteca para instalar Domo

Comentarios de los trabajos realizados:

Aun no se tienen trabajos realizados, debido a que el estatus de la obra se encuentra "en proceso Administrativo"



F3: Fachada Auditorio



F4: Puertas CAPFCE del edificio de Aulas



F5: Fachada Control de Obras

DR. MOSES TO SEARA VAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

Es muy importante que se anexe el reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se pueden captar tantas fotografías como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la planta toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



Universidad de la Cañada

RECTORÍA

Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2018

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
agosto_2018
FECHA DE CORTE: 31/8/2018

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Porcentaje de avance

0

PRORIDAD: 3 Nombre de la obra: **Construcción de una Cancha de Usos Múltiples, en la Universidad de la Cañada.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

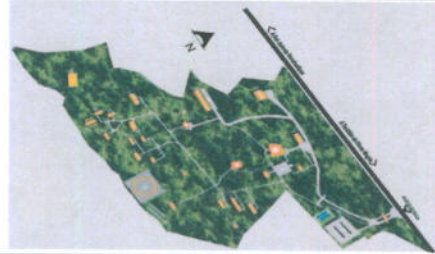

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan-San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7; Paraje Tiltlacuatilla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: Superficie en donde se Construirá la Cancha de Usos Múltiples



F2: Superficie en donde se Construirá la Cancha de Usos Múltiples

Comentarios de los trabajos realizados:

Aun no se Serán trabajos realizados, debido a que el estatus de la obra se encuentra "en proceso Administrativo"



F3: Superficie en donde se Construirá la Cancha de Usos Múltiples



F4: Superficie en donde se Construirá la Cancha de Usos Múltiples

DR. MOESTO SEARA VAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, en donde se especifica el número de fotografías necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capturen en la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



Universidad de la Cañada

RECTORÍA

Universidad de la Cañada
Procediturus novorum, novatum melior
Eschjiteo

Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2018

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
agosto_2018
FECHA DE CORTE: 31/08/2018

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Universidad de la Cañada

Porcentaje de avance

0

PRORIDAD: 8 Nombre de la obra: **Reemplazo de Boilers de gas por Calentadores solares e implementacion de Wathorímetros en el Edificio de Departamentos de la Universidad de la Cañada**

CROQUIS DE LOCALIZACION



UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nahuatipan Km. 1.7; Paraje Tiliacuatilla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: Fachada posterior del Edificio



F2: Fachada posterior lado poniente

Comentarios de los trabajos realizados:

Aun no se tienen trabajos realizados, debido a que el estatus de la obra se encuentra "en proceso Administrativo"



F3: Area para instalacion de Wathorímetros



F4: Fachada posterior



F5: Parapetone fachada posterior


DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES

DR. MELANY CUEVA GONZALEZ

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una پوشа que podrán capturar las fotografías como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la fotografía antes, durante y después de la obra.



Universidad de la Cañada
RECTORÍA



Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
