



UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

"2018, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL"

Oficio No.: VRAD/E/294/2018.

Teotitlán de Flores Magón, Oax., a 10 de diciembre de 2018.

DOCTORA
CARMEN ENEDINA RODRÍGUEZ ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA "DGESU"
P R E S E N T E:

EXCUSE

Por este conducto y en atención al oficio número 511-3/2018.-0511 de fecha 23 de mayo de 2018 y en alcance al similar número 511/2015.-0373 envió el informe de los avances con fecha corte 30 de noviembre de 2018, de las obras apoyada a través del Recurso FAM 2018. (anexo CD con información magnética)

Por lo antes expuesto, remito a usted el reporte actualizado en archivo electrónico formato Excel y de manera electrónica a los correos rocioc@nube.sep.gob.mx, cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx y jcarlosv@nube.sep.gob.mx

Sin otro particular, le reitero mi más distinguida consideración.

ATENTAMENTE

"praeteritum noscere, posterum molior"



~~L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ~~ de la Cañada
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

S. E. P. *Canaves y CD*
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
RECIBIDO
11 DIC 2018
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

- C.c.p.- DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ.- Rector de la Universidad de la Cañada.- Para su superior conocimiento.
- ARQ. MELANY CUEVAS MANUEL.- Jefa del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento.- Para su conocimiento y seguimiento.
- Archivo.

2018



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
noviembre_2018
FECHA DE CORTE 30/11/2018

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre Universidad de la Cañada
Entidad federativa: Oaxaca
Clave Inst 011 20ASX0012V

RESPONSABLES

Planesión
Nombre: L.C. E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ
Cargo: VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Telefono: (296) 372 07 15, E. 4° 200
Correo electrónico: vira_admin@unca.edu.mx

Obras y Mantenimiento
Nombre: APO MELAYI CUEVAS SAMUEL
Cargo: JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
Telefono: (296) 372 07 15 E. 4° 200
Correo electrónico: melayid@netmail.com

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Table with columns: Prioridad, Nombre del proyecto, Tipo de proyecto, Monto autorizado, Monto ejercido, Remanente, Alcance del proyecto, Acciones que sustentan el avance, Acciones por realizar, % de avance, Fechas, Observaciones, Si ya fue inaugurada, Cuenta con Actas.

DR. MODESTO SEARA VAQUEZ
Nombre y firma del Titular de la IES
UNCA logo

UNCA logo
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de IES
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

1 Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanto fotos como sea necesario.
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos realizados, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en día, mes y año.

Universidad de la Cañada
RECTORÍA

2018

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:
noviembre_2018
FECHA DE COBRE: 30/11/2018

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Porcentaje de avance

0

Nombre de la obra: **Equipamiento del Laboratorio de Investigación de la Universidad de la Cañada**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

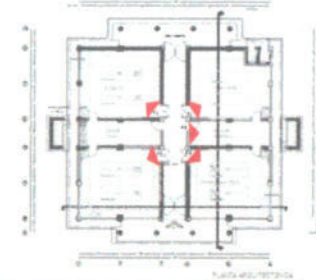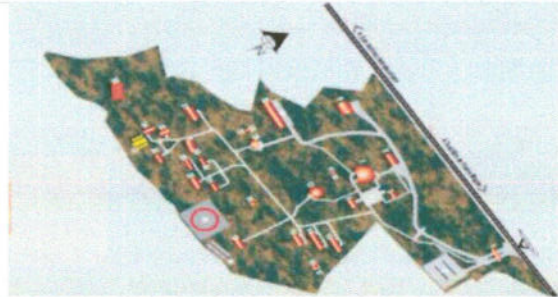

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7; Paraje Titlacuatitla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: Vista Interior Inorgánica



F2: Vista Interior Instrumental

Comentarios de los trabajos realizados:

Aun no se tienen trabajos realizados, debido a que el estatus de la obra se encuentra "en proceso Administrativo"



F3: Vista Interior Almacén de Reactivos



F4: Vista Interior Bromatología/Micro



F5: Vista Interior Orgánica

DR. MODESTO SIERRA VAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES

ARLÉ MELANY OLIVERAS SAMUEL

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial se recomienda que se capture en misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:
noviembre_2018
FECHA DE COPIA: 11/11/2018

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avances
0

Presupuesto: **2** Nombre de la obra: **Mantenimiento de diversas áreas de la Universidad de la Cañada**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7: Paraje Tiltlacuatilla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS




F1: Fachada principal Biblioteca



F2: Área Superior de Biblioteca para instalar Domo

Comentarios de los trabajos realizados:

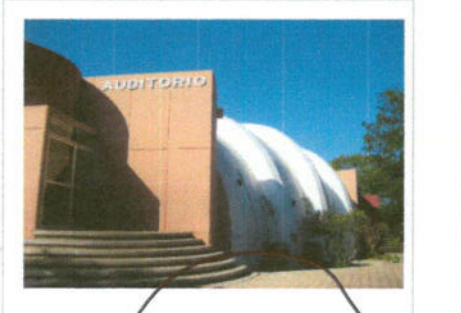

F3: Fachada Auditorio



F4: Puertas CAPCE del edificio de Aulas



F5: Fachada Centro de Alumnos

DR. ROBERTO SERRA VAZQUEZ
Nombre y firma del Titular de la IES

[Handwritten signature]
Nombre y firma del Jefe de Obras y Mantenimiento de la IES



Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una planilla, en la que se copiarán tantas fotografías como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

Universidad de la Cañada
RECTORÍA

2018

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:
noviembre_2018
FECHA DE CREAR: 10/11/2018

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Porcentaje de avance

0

PROYECTOS 3 Nombre de la obra: **Construcción de una Cancha de Usos Múltiples, en la Universidad de la Cañada.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nahuatipan Km. 1.7; Paraje Tildacuattla, Teotitlan de Flores Magon Oaxaca.

FOTOS



F1: habilitado, armado y colocado de acero de refuerzo en columnas



F2: Acero de refuerzo en columnas en zapatas aisladas y colado de plantilla

Comentarios de los trabajos realizados:

Con fecha 23 de octubre de 2018 se dio inicio a los trabajos de la construcción de la cancha de usos múltiples, se realizó el despiece, limpieza, trazo y nivelación, se inició la excavación y se suministraron materiales como acero de refuerzo y tabicón.

Se habilitó el acero para zapatas aisladas, columnas, zapatas corridas, contratabres, cadenas y castillos, se colocaron zapatas, contratabres, dados, cadenas y castillos y se errizó el muro de 28 cm.



F3: Muro de cimentación, zapatas corridas y contratabres, cadenas y castillos



F4: excavación



F5: habilitado y armado de acero de refuerzo en columnas y vigas de cimentación.

DR. VICENTE HERRERA VAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES

* Es muy importante que se entregue reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa un CD por medio del cual se podrá contar con todas las fotografías como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture en el mismo lugar, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Universidad de la Cañada

RECTORÍA

2018

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
noviembre_2018
FOLIO DE 209 DE 210

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance

0

PERIODO: 8 Nombre de la obra: **Reemplazo de Boilers de gas por Calentadores solares e implementación de Wathorímetros en el Edificio de Departamentos de la Universidad de la Cañada**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nahuatipan Km. 1.7; Paraje Titlacuatilla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: Fachada posterior del Edificio



F2: Fachada posterior lado poniente

Comentarios de los trabajos realizados:

Se concluyó el proceso de factación, se adquirieron los equipos y materiales por lo que estamos en espera de la entrega de los mismos para dar inicio a la instalación de los mismos.



F3: Área para instalación de Wathorímetros



F4: Fachada posterior



F5: Perspectiva fachada

DR. LUIGENTO HERRERA VAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES

[Signature]

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una planilla que debe ser diligenciada en cada caso, como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y reparaciones, en especial, se recomienda que se capturen imágenes en tres tomas, mismas ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

Universidad de la Cañada
RECTORÍA

UNCA
Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
