



UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

Oficio No. VRAD/E/210/2019.

Teotitlán de Flores Magón, Oax., a 05 de septiembre de 2019.



DOCTORA
CARMEN ENEDINA RODRIGUEZ ARMENTA
DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA DGESU
P R E S E N T E:

En atención al oficio 511/2019.-0275 de fecha 18 de febrero de 2019; por este conducto me permito enviarle el informe de avance correspondiente al mes de agosto, con fecha corte 31 de agosto de 2019, de las obras apoyadas a través del Fondo de Aportaciones Múltiples del ejercicio 201 (anexo CD con información magnética).

Por lo antes expuesto, remito a usted el reporte actualizado en archivo electrónico formato Excel y de manera electrónica a los correos rocioc@nube.sep.gob.mx, cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx y jcarlosv@nube.sep.gob.mx

Sin otro particular, le reitero mi distinguida consideración.

ATENTAMENTE
"praeteritum noscere, posterum molior"

L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



VICE-RECTORÍA DE
ADMINISTRACIÓN



C.e.p.- DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ.- Rector de la Universidad de la Cañada.- Para su superior conocimiento.
DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARAZ.- Director de Fortalecimiento Institucional.- Para su conocimiento.
Expediente.

2019



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
agosto_2019
 FECHA DE CORTE: 31/08/2019

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad de la Cañada**
 Entidad federativa: **Oaxaca**
 Clave Inst 911: **206SLKZ2V**

RESPONSABLES

Paración
 Nombre: **L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ**
 Cargo: **VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN**
 Teléfono: **(236) 372 07 15. Ext. 200**
 Correo electrónico: **vice_admin@unca.edu.mx**

Obras y Mantenimiento
 Nombre: **ARQ. MELANY CLEVAS MANUEL**
 Cargo: **JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**
 Teléfono: **(236) 372 07 15. Ext. 208**
 Correo electrónico: **supervision-obras@unca.edu.mx, melany00@hotmail.com**

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto			Acciones que sustentan el avance	Acciones por realizar	% de avance	Fechas		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas			
		Obras de construcción	Equipamiento	Adquisición y reparación	Mantenimiento				Proyecto de infraestructura	Español	Cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta físico)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Construcción de un edificio diez Aulas Pedagógicas en la Universidad de la Cañada	X				\$ 5,668,129.96	\$ -	\$ 5,668,129.96				Acero de refuerzo en construcción, columnas, muros, cobado de cimentación, murete de enrase y habilitación de esdema de despende.	Continuar el cobado de cadena de despende, relleno de material inerte, muros de 14 y 20 cm, cadenas castillos, columnas, muros de concreto armado, etc.	10%	15/07/19	11/11/19	En Proceso de Ejecución.	NO	-	-	NO	NO	\$0.00	
GLOBAL DEL PROYECTO																								
2	Construcción de un Centro de Investigación en Nutrición y Alimentación en la Universidad de la Cañada (C.I.N.A.)	X				\$ 5,042,429.96	\$ -	\$ 5,042,429.96						0%			Se realizó el proceso de licitación, mismo que tiene periodo de ejecución del 03-sep-2019 al 31-dic-2019	NO	-	-	NO	NO	\$0.00	
GLOBAL DEL PROYECTO																								
					\$10,710,559.92	\$0.00	\$10,710,559.92																	


DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES

ARQ. MELANY CLEVAS MANUEL

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

- 1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas fotos como sea necesario.
- 2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
- 3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en día, mes y año.



Universidad de la Cañada
 RECTORÍA



Universidad de la Cañada
 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2019

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
agosto_2019

FECHA DE CORTE: 31/08/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance

10

Prioridad 1

Nombre de la obra: **Construcción de un edificio diez Aulas Pedagógicas en la Universidad de la Cañada**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

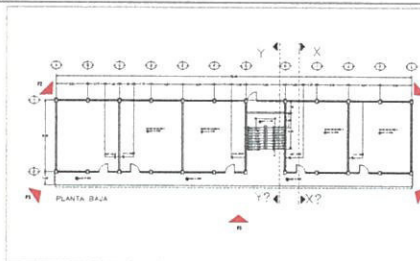

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Tootitlan- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7, Paraje Tifacualifa, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: Habilitado y cobrado de acero de refuerzo y cimbrado de cimentación.




F2: Colado de la cimentación.

Comentarios de los trabajos realizados:


En proceso de ejecución.



F3: Muro de enrase de 28 cm

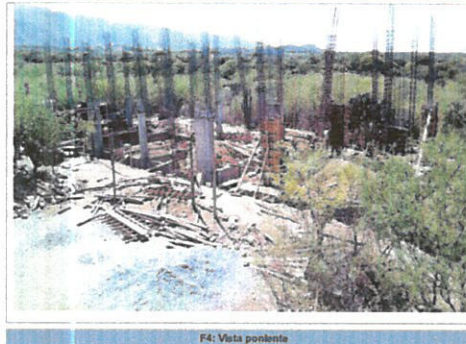

F4: Vista poniente

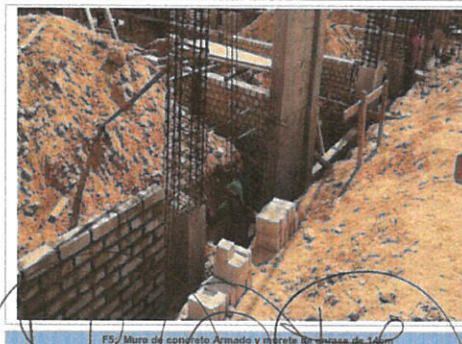

F5: Muro de concreto Armado y murete de enrase de 15cm

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES

DR. MELAY CUEVA-SANCHEZ

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



Universidad de la Cañada

RECTORÍA



Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2019

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:
agosto_2019

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad de la Cañada

Porcentaje de avance

0

PROYECTO 2 Nombre de la obra: **Construcción de un Centro de Investigación en Nutrición y Alimentación en la Universidad de la Cañada (C.I.N.A.)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nahuatlipan Km. 1.7; Paraje Titlacuatitla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: vista del sitio antes de la Edificación.



F2: vista del sitio antes de la Edificación.

Comentarios de los trabajos realizados:

Se realizó el proceso de licitación, mismo que tuvo periodo de ejecución del 03-sep-2019 al 31-dic-2019



F3: vista del sitio antes de la Edificación.



F4: vista del sitio antes de la Edificación.



F5: Fachada Centro de Investigación.

DR. MOJIBTO BEARA VAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES


Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se pedirá copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



Universidad de la Cañada

RECTORÍA



Universidad de la Cañada

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
