



UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

“2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA”

Área:	Vice-Rectoría de Administración.
Oficio No.:	UNCA/VRAD/E-313/2022.
Asunto:	Informe del 3º trimestre del FAM 2022.

Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca; a 07 de octubre de 2022.

Doctor

Eduardo Gerardo Rosas González

Director de Fortalecimiento Institucional
Dirección General de Educación Superior
Universitaria e Intercultural “DGESUP”

Presente:

En atención al oficio número: 511/2022-0826-37 signado con fecha 18 de febrero de 2022 y por instrucciones del Rector de la Universidad de la Cañada, Dr. Modesto Seara Vázquez; por este conducto me permito enviarle el Informe de Avance de los proyectos apoyados a través del Fondo de Aportaciones Múltiples del ejercicio 2022, correspondiente al trimestre julio-septiembre, con fecha corte 30 de septiembre de 2022, debidamente requisitado y digitalizado en formato PDF con sus respectivos archivos en Excel.

Por lo antes expuesto, remito a usted el reporte actualizado en archivo electrónico formatos Excel y PDF a los correos: rocioc@nube.sep.gob.mx y cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

“praeteritum noscere, posterum molior”

L.C.E. Alfonso Martínez López
Vice-Rector de Administración



Universidad de la Cañada

VICE-RECTORÍA DE
ADMINISTRACIÓN

Con copia para:

- Dr. Modesto Seara Vázquez.- Rector de la Universidad de la Cañada.- Para su superior conocimiento.
- Dr. Francisco Luciano Concheiro Bórquez.- Subsecretario de Educación Superior.- Para su conocimiento.
- Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta.- Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural “DGESUP”.- Mismo fin.
- M.A. Magaly Nictexa Fierro Muñoz.- Representante Institucional ante el Programa “RIP UNCA”.- Mismo fin.
- Arq. Melany Cuevas Manuel.- Jefa del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento.- Mismo fin

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad de la Cañada**
Entidad federativa: **Oaxaca**
Clave Inst 911: **20MSU0032V**

Planación
Nombre: **L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ**
Cargo: **VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN**
Teléfono: **(238) 372 07 15, Ext: 209**
Correo electrónico: **vca_admin@unca.edu.mx**

RESPONSABLES

Obras y Mantenimiento
Nombre: **ARG. MELANY CUEVAS MANUEL**
Cargo: **JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**
Teléfono: **(238) 372 07 15, Ext: 209**
Correo electrónico: **supervision-obras@unca.edu.mx**

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		Monto de Acta Administrativa	
		Obras de infraestructura	Equipamiento	Adquisiciones y mejoras	Rehabilitación				Proyecto sustantivo	Espacio/espacios	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Termino	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)		Acta Administrativa de Entrega-Recepción
1	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA. X					\$6,664,028.00	\$ 109,314.92	\$ 6,554,714.38	Sistemas Inteligentes de Distribuidos	1	60.30	Limpia, trazo, excavacion con maquinaria y por medios manuales, plantilla, acero de refuerzo en cimentacion de diferentes diametros, cimbrado y colado de zapatas y contralabos, y acero de refuerzo en elementos estructurales.	Continuacion de muerete de enrasa, cadena de desplante, muros de tabique, cimbrado y colado de muros y columnas.	25%	20/07/22	17/12/22	EN PROCESO DE EJECUCIÓN	NO	-	NO	NO	\$0.00		
		Redes	1	82.30																				
		Electrónica	1	63.40																				
		Vestibulo de acceso y área de Técnico	1	74.60																				
		Sanitarios	1	10.10																				
		Corredor	1	14.30																				
		Investigación de Desarrollo de Software	1	90.20																				
		Área Ux	1	88.00																				
		Innovación Educativa	1	78.00																				
		Vestibulo	1	78.50																				
TOTAL	10	670.00																						
2	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE SERVICIOS GENERALES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA. X					\$2,801,165.00	\$ 127,092.49	\$ 2,674,092.51	Herrería, albañilería y Jardinería	1	24.40	Limpia, trazo, excavacion con maquinaria y por medios manuales, plantilla, acero de refuerzo en cimentacion de diferentes diametros, cimbrado y colado de zapatas y contralabos, murete de enrasa.	Continuacion de cadena de desplante, muros de tabique, cimbrado, colado de muros y columnas.	20%	24/08/22	21/12/22	EN PROCESO DE EJECUCIÓN	NO	-	NO	NO	\$0.00		
		Bodega de Herramientas	1	39.20																				
		Vestibulo	1	45.00																				
		Área de Intendencia	1	18.50																				
		Oficina DPCM	1	25.10																				
		Instalaciones/Chifres	1	18.70																				
		Carpintería	1	21.50																				
		Servicio de Comedor	1	18.10																				
		Área de Trabajo	1	65.40																				
		Lavadero	1	5.60																				
Sanitarios	1	21.50																						
TOTAL	11	322.00																						
					\$9,465,214.00	\$938,407.11	\$8,228,806.89																	

El Sr. Director de la IES
UNCA
Nombre y firma del Titular de la IES
DR. MODESTO GEARA VAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES
ARG. MELANY CUEVAS MANUEL

1 Se capturara los datos de avance del proyecto. Se podrán anexar tantas fotos como sea necesario.
2 En esta sección se requiere de forma clara y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2022

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
JUL-SEP/2022

FECHA DE CORTE 20/09/2022

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Universidad de la Cañada

Porcentaje de avance

25%

Proyecto: **1** Nombre de la obra: **CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

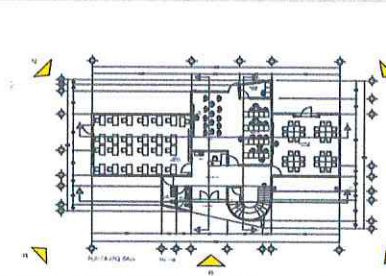

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nahuatlpan Km. 1.7; Peraje Tillacuatilla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN



F2: EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO C

Comentarios de los trabajos realizados:

Limpia, trazo, excavación con maquinaria y por medios manuales, plantilla, acero de refuerzo en cimentación de diferentes diámetros, cimbrado y colado de zapatas y contratabas; y acero de refuerzo en elementos estructurales.



F3: ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS



F4: SUPERFICIE A CONSTRUIR



F5: SUPERFICIE A CONSTRUIR

DR. MOCESTO SEARA VAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES

ARQ. MELANY GUEVAS MANUEL

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES



Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
El reporte fotográfico debe ser claro y adecuado, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

RECTORÍA



Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2022

Año

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
JUL-SEP/2022

FECHA DE CORTE: 30/09/2022

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad de la Cañada

Porcentaje de avance

20%



PRIMORDIAL

2

Nombre de la obra:

CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE SERVICIOS GENERALES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

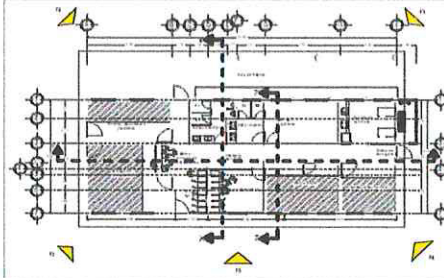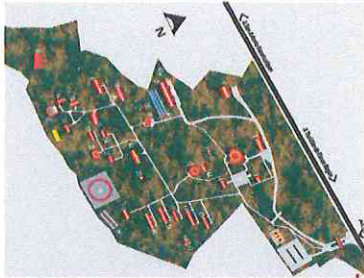

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatpan Km. 1.7; Paraje Titlacuatitla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: SUPERFICIE A CONSTRUIR



F2: SUPERFICIE A CONSTRUIR

Comentarios de los trabajos realizados:

Limpia, trazo, excavación con maquinaria y por medios manuales, plantilla, acero de refuerzo en cimentación de diferentes diámetros, cimbrado y colado de zapatas y contrabases, mureto de errasa.



F3: SUPERFICIE A CONSTRUIR



F4: SUPERFICIE A CONSTRUIR



F5: SUPERFICIE A CONSTRUIR

DR. MODESTO ESPARTEZ VIZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES

ARQ. MELANY GUEVAS MANUEL

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

Universidad de la Cañada
RECTORÍA

Es muy importante que se capture foto fotográfica de todas las obras. Para ello se anega una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
