



UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

Área:	Vice-Rectoría de Administración.
Oficio No.:	UNCA/VRAD/E-112/2023.
Asunto:	Informe trimestral del FAM 2023.

Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca; a 10 de abril de 2023.

Doctora

Carmen Enedina Rodríguez Armenta
Directora General de Educación Superior
Universitaria e Intercultural "DGESUP"
Secretaría de Educación Pública

Presente:

Con At'n a: **Dr. Eduardo Gerardo Rosas González**
Director de Fortalecimiento Institucional

En seguimiento al oficio número: 511/2023-0913-37 signado con fecha 17 de febrero de 2023 y por instrucciones de la Mtra. María de los Ángeles Peralta Arias, Rectora de la Universidad de la Cañada; por este conducto me permito remitirle el informe de avance de los proyectos apoyados a través del Fondo de Aportaciones Múltiples del ejercicio 2023, correspondiente al trimestre enero-marzo, con fecha de corte 31 de marzo de 2023, debidamente requisitado y digitalizado en formato PDF con su respectivo archivo en Excel.

Por lo antes expuesto, remito a usted el reporte actualizado en archivo electrónico formatos Excel y PDF, a los correos: rocioc@nube.sep.gob.mx y cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

CORREO ELECTRÓNICO




E-231804

Atentamente

"praeteritum noscere, posterum molior"

L.C.E. Alfonso Martínez López
Vice-Rector de Administración



VICE-RECTORÍA DE
ADMINISTRACIÓN

Con copia para:

- Mtra. María de los Ángeles Peralta Arias.- Rectora de la Universidad de la Cañada.- Para su superior conocimiento.
 - Dr. Francisco Luciano Concheiro Bórquez.- Subsecretario de Educación Superior.- Para su conocimiento.
 - M.A. Magaly Nictexa Fierro Muñoz.- Representante Institucional UNCA.- Mismo fin.
 - I.E. Armando Marín Nieto.- Encargado del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento.
- Archivo.

2023

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Más reportado
ENE-MAR/2023
 FECHA DE CORTE: 31/03/2023

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad de la Cañada**
 Entidad federativa: **Oaxaca**
 Clave Inst 911: **20MSU0032V**

RESPONSABLES

Planeación	Obras y Mantenimiento
Nombre: L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ	Nombre: ING. ARMANDO MARIN NIETO.
Cargo: VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN	Cargo: ENC. DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
Teléfono: (236) 372 07 15, Ext.: 200	Teléfono: (236) 372 07 15, Ext.: 208
Correo electrónico: vice_admin@unca.edu.mx	Correo electrónico: supervision-obras@unca.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO


OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas			
		Obras de continuidad	Equipamiento	Adquisiciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recpción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recpción	Monto de Acta Administrativa
4	AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA		X			\$2,715,771.00	\$ -	\$ 2,715,771.00	CAFETERIA	1 EDIFICIO	-		Cimentación, Estructura, Albañilería y acabados, Instalación eléctrica	0%	-	-	SE SOLICITARÁ RECTIFICACIÓN DEL PROYECTO	NO	-	-	NO	NO	\$0.00	
									TOTAL	1 EDIFICIO	0.00													
5	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE DOCENCIA Y SALAS DE CÓMPUTO DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.		X			\$2,981,343.00	\$ -	\$ 2,981,343.00	3 SALAS DE COMPUTO	2 EDIFICIOS	-		Adquisición de computadoras para salas de computos, Reemplazo de climas en Laboratorio de Química, Biología, Biblioteca, Rectoría, Vice-Rectoría y departamento para profesores.	0%	-	-	SE SOLICITARÁ RECTIFICACIÓN DEL PROYECTO	NO	-	-	NO	NO	\$0.00	
									1 AUDITORIO	1 EDIFICIO	-													
									1 BIBLIOTECA	1 EDIFICIO	-													
									1 RECTORIA	1 EDIFICIO	-													
									2 DEPARTAMENTOS PARA PROFESORES	2 EDIFICIO	-													
									1 VICE-RECTORIA ACADEMICA	1 EDIFICIO	-													
									TOTAL	10 EDIFICIOS	0.00													
						\$10,956,227.00	\$0.00	\$10,956,227.00																

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS.
 RECTORA

ING. ARMANDO MARIN NIETO.
 ENC. DEPTO. PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.
 2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
 3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.



Universidad de la Cañada
 RECTORÍA



Universidad de la Cañada
 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2023

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

ENE-MAR/2023

FECHA DE CORTE: 31/03/2023

REPORTÉ FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



PRIORIDAD

1

Nombre de la obra:

TERMINACION DE UN LABORATORIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

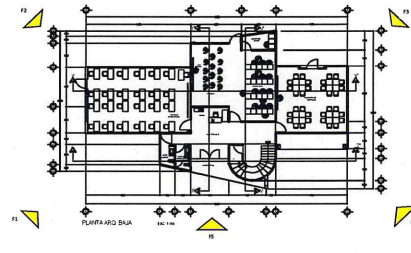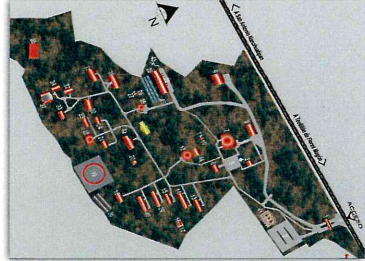

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7, Paraje Titlacuatitla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.



Porcentaje de avance

0%

FOTOS



F1: TERMINACION



F2: TERMINACION

Comentarios de los trabajos realizados:

EN PROCESO ADMINISTRATIVO



F3: TERMINACION



F4: TERMINACION




F5: TERMINACION

DRA. MARIA DE LOS ANGELES PERALTA ARIAS.
RECTORA


ING. ARMANDO MARIN NIETO.
ENC. DEPTO. PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña por cada una de las obras. Para el caso de obras que requieran de varias pestañas, se anexa una pestaña por cada una de ellas. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma en el momento de inicio y final de las obras, durante y despues de la obra.



Universidad de la Cañada

RECTORÍA



Universidad de la Cañada

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2023

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

ENE-MAR/2023

FECHA DE CORTE: 31/03/2023

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



PRIORIDAD

2

Nombre de la obra:

TERMINACIÓN DE UN EDIFICIO DE SERVICIOS GENERALES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

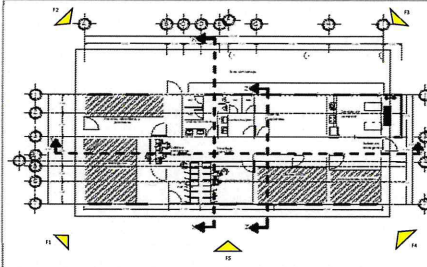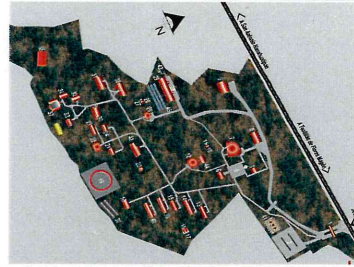

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7; Paraje Titlacuatitla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.



Universidad de la Cañada

Porcentaje de avance

0%

FOTOS



F1: TERMINACIÓN



F2: TERMINACIÓN

Comentarios de los trabajos realizados:



F3: TERMINACIÓN



F4: TERMINACIÓN




F5: TERMINACIÓN

DRA. MARIA DE LOS ANGELES PERALTA ARIAS.
RECTORA


ING. ARMANDO MARIN NIETO.
ENC. DEPTO. PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña con fotografías con las medidas correspondientes. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma fotografía en el mismo ángulo y lugar antes, durante y después de la obra.



Universidad de la Cañada

RECTORÍA



Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2023

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES




DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

ENE-MAR/2023

FECHA DE CORTE: 31/03/2023

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

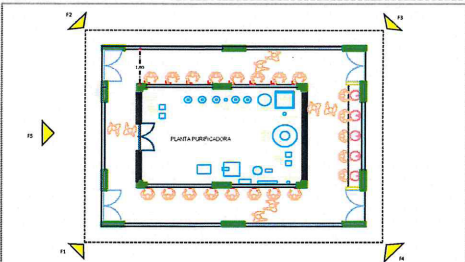 Universidad de la Cañada Porcentaje de avance <h1>0%</h1>	PRIORIDAD 3 Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.	CROQUIS DE LOCALIZACIÓN 	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7; Paraje Titlacuatilla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.
	FOTOS		




F1: SUPERFICIE A CONSTRUIR



F2: SUPERFICIE A CONSTRUIR

Comentarios de los trabajos realizados:

EN PROCESO ADMINISTRATIVO

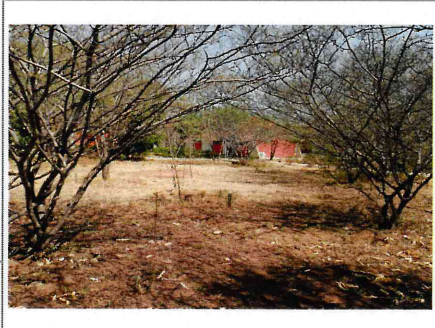


F3: SUPERFICIE A CONSTRUIR



F4: SUPERFICIE A CONSTRUIR




F5: SUPERFICIE A CONSTRUIR


 DRA. MARIA DE LOS ANGELES PERALTA ARIAS.
 RECTORA



 ING. ARMANDO MARÍN NIETO.
 ENC. DEPTO. PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña por cada una de las pestañas con el caso necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma información en el mismo lugar y en los mismos momentos, durante y después de la obra.



Universidad de la Cañada

RECTORÍA



Universidad de la Cañada

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2023

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

ENE-MAR/2023

FECHA DE CORTE: 31/03/2023

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

4

Nombre de la obra:

AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE CAFETERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA





Universidad de la Cañada

Porcentaje de avance

0%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

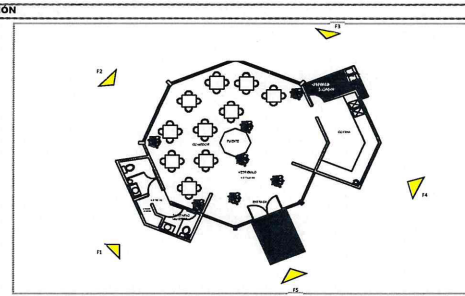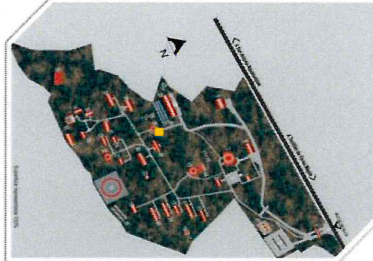

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7; Paraje Titlacuatilla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS

EN PROCESO ADMINISTRATIVO

F1: SUPERFICIE A CONSTRUIR

EN PROCESO ADMINISTRATIVO

F2: SUPERFICIE A CONSTRUIR

Comentarios de los trabajos realizados:

EN PROCESO ADMINISTRATIVO

F3: SUPERFICIE A CONSTRUIR

EN PROCESO ADMINISTRATIVO

F4: SUPERFICIE A CONSTRUIR


EN PROCESO ADMINISTRATIVO

F5: SUPERFICIE A CONSTRUIR

DRA. MARIA DE LOS ANGELES PERALTA ARIAS.
RECTORA


ING. ARMANDO MARÍN NIETO.
ENC. DEPTO. PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña de fotos por cada una de las obras. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma en el momento de la obra y durante y después de la obra.



Universidad de la Cañada

RECTORÍA



Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2023

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

ENE-MAR/2023

FECHA DE CORTE: 31/03/2023

REPORTÉ FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

5

Nombre de la obra:

EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE DOCENCIA Y SALAS DE CÓMPUTO DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.





Universidad de la Cañada

Porcentaje de avance

0%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

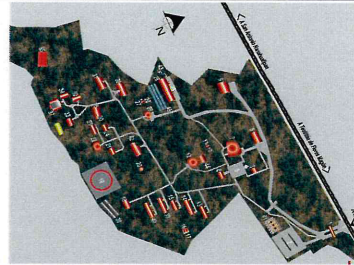

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7; Paraje Titlacuatilla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS

EN PROCESO ADMINISTRATIVO

F1: TERMINACIÓN

EN PROCESO ADMINISTRATIVO

F2: TERMINACIÓN

Comentarios de los trabajos realizados:

EN PROCESO ADMINISTRATIVO

F3: TERMINACIÓN

EN PROCESO ADMINISTRATIVO

F4: TERMINACIÓN


EN PROCESO ADMINISTRATIVO

F5: TERMINACIÓN

DRA. MARIA DE LOS ANGELES PERALTA ARIAS.
RECTORA

ING. ARMANDO MARIN NIETO.
ENC. DEPTO. PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestanía, o se anexan tantas pestanías como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma fotografía en el momento de inicio y logro de la obra, durante y después de la obra.



Universidad de la Cañada

RECTORÍA



Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
