

Oficio No.: VRAD/E/005/2019.

Teotitlán de Flores Magón, Oax., a 09 de enero de 2019.

DOCTORA
CARMEN ENEDINA RODRÍGUEZ ARMENTA
DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA "DGESU"
P R E S E N T E:

Por este conducto y en atención al oficio número 511-3/2018.-0511 de fecha 23 de mayo de 2018 y en alcance al similar número 511/2015.-0373 envió el informe de los avances con fecha corte 31 de enero de 2018, de las obras apoyadas a través del Recurso FAM 2018. (anexo CD con información magnética)

Por lo antes expuesto, remito a usted el reporte actualizado en archivo electrónico formato Excel y de manera electrónica a los correos rocioc@nube.sep.gob.mx, cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx y jcarlosv@nube.sep.gob.mx

Sin otro particular, le reitero mi más distinguida consideración.

ATENTAMENTE

"praeteritum noscere, posterum molior"


L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Universidad de la Cañada
VICE-RECTORÍA DE
ADMINISTRACIÓN



C.c.p.- DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ.- Rector de la Universidad de la Cañada.- Para su superior conocimiento.
ARQ. MELANY CUEVAS MANUEL.- Jefa del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento.- Para su conocimiento y seguimiento.
Archivo.

2018

AÑO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
diciembre_2018
FECHA DE CORTE: 31/12/2018

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre Universidad de la Cañada

Entidad federativa: Oaxaca

Clave Inst 911 20MSU0032V

Planes y Programas
Nombre: L. C. E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ
Cargo: VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Teléfono: (236) 372 07 15, Ext. 200
Correo electrónico: vice_admin@unca.edu.mx


RESPONSABLES

Obras y Mantenimiento
Nombre: AYO MELANY CUEVAS MARQUEL
Cargo: JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
Teléfono: (236) 372 07 15, Ext. 208
Correo electrónico: melany60@hotmail.com


DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Cuenta con Actas							
		Obras de construcción	Equipamiento	Adquisiciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta final)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa		
1	Equipamiento del Laboratorio de Investigación de la Universidad de la Cañada	X				\$ 3,119,262.00	\$ 1,513,026.06	\$ 1,606,235.94				Adquisición de equipos de oficina	Suministro de muebles de Laboratorio	48%	05/12/18	17/02/18	Se tiene comprometido el recurso y se realizó la entrega del artículo. Los equipos de laboratorio se encuentran en proceso de fabricación y únicamente se recibió el mobiliario de oficina.									
									TOTAL	0	0.00	GLOBAL DEL PROYECTO														
2	Mantenimiento de diversas áreas de la Universidad de la Cañada		X			\$ 950,650.80	\$ 950,650.80	\$ -	Edificios de la Universidad de la Cañada atendidos	18	7,569.04	Se realizaron los trabajos de pintura de impermeabilización de biblioteca y auditorio, se adquirieron las puertas y esta en proceso de colocarlo y se adquirió y colocó el domo de biblioteca.	Colocación de Puertas tipo Caplice	98%	05/11/18	31/12/18	Se concluyeron los trabajos de pintura, impermeabilización, se colocó el domo y se adquirieron las puertas tipo Caplice mismas que están en proceso de colocación.									
									TOTAL	18	7690.04	GLOBAL DEL PROYECTO														
3	Construcción de una Cancha de Usos Múltiples, en la Universidad de la Cañada.			X		\$ 1,620,262.96	\$ 1,620,262.96	\$ -	Cancha de Usos Múltiples	1	710.00	ENCUADRO A MANO REALIZADO: MATERIAL DE SUELO, TUBERÍAS DE PVC Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO. MARCO DE CONTROL DE PROYECTO Y 200 MONTAJE DE LOSA MANOSTERNO DE PIEDRA, DE 3 X 3 METROS EN LASSE DE CANCHA Y ESPESOR 120 CM. BARRAS DE ACERO # 4 Y 10. BASE PARA POSTES DE VOLANTE, FABRICACIÓN O SOMETRIMIENTO DE SUELO PARA BARRERAS, TUBERÍA, SUELO.		98%	23/10/18	31/12/18	Se tiene comprometido el recurso la obra está en proceso de ejecución.									
									TOTAL	1	710.00	GLOBAL DEL PROYECTO														
8	Reemplazo de Boilers de gas por Calentadores solares e implementación de Wathorímetros en el Edificio de Departamentos de la Universidad de la Cañada.			X		\$ 187,532.00	\$ 187,532.00	\$ -	Calentadores Solares	13	0.00	Se realizó la adquisición de los materiales y los equipos. Se instalaron los calentadores.	La instalación de los wathorímetros debido a un retraso en el suministro.	99%	26/11/18	30/12/18	Se concluyó con los trabajos de instalación de calentadores solares y actualmente se encuentran en uso, debido a cuestiones ajenas a la institución, hubo un retraso en la entrega de los wathorímetros, la fecha estimada para la realización de la misma es del 11-ene-19.									
									TOTAL	27	0.00	GLOBAL DEL PROYECTO														
						\$6,877,727.76	\$4,271,481.92	\$1,606,235.94																		



DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
Nombre y firma del Titular de la IES



Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturan las acciones que sustentan la obra en proceso. Se podrán anexar tantas fotos como sea necesario.
2 En esta sección se reportan los trabajos a realizarse, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que los datos de los días sean actualizados. Todos en dos dígitos: 04, mes y 05.

2018

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

diciembre_2018

FECHA DE CORTE: 31/12/2018

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD 1

Nombre de la obra: **Equipamiento del Laboratorio de Investigación de la Universidad de la Cañada**




Universidad de la Cañada

Porcentaje de avance

48


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

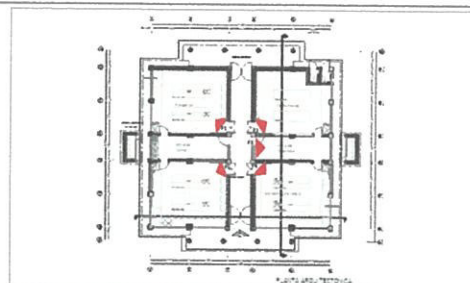

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7, Paraje Tittacuattita, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS

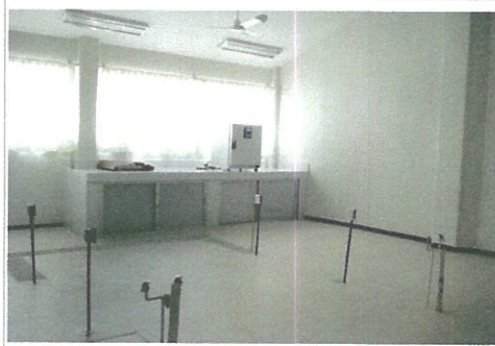

F1: Vista Interior Inorganica



F2: Vista Interior Instrumental

Comentarios de los trabajos realizados:

A la fecha se tiene suministrado únicamente el mobiliario de oficina (F5), el mobiliario y equipo de laboratorio está en proceso de fabricación.

El material de oficina esta resguardado en Área de Orgánica en el Edificio de Laboratorio de Investigación, para que una vez que se tenga el mobiliario y equipo de laboratorio se distribuya en las diferentes áreas.



F3: Vista Interior Almacen de Reactivos



F4: Vista Interior Bromatología/Micro



F5: Vista Interior Organica (resguardo de material de oficina)

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES


ANA MELANÍ GUEVAS MANUEL

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES



Universidad de la Cañada

RECTORÍA



Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
En el equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2018

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
diciembre_2018

FECHA DE CORTE: 31/12/2018

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

99

PRIORIDAD: 2 Nombre de la obra: **Mantenimiento de diversas areas de la Universidad de la Cañada**


CROQUIS DE LOCALIZACION



UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7; Paraje Titlacuattitla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: Fachada principal Biblioteca (edificio pintado e impermeabilizado)



F2: Arco Superior de Biblioteca Domo instalado



F3: Fachada Auditorio (impermeabilizado y pintado)



F4: Puertas CAPFCE del edificio de Aulas (por cambiar)

Comentarios de los trabajos realizados:

Los trabajos realizados fueron:
*Impermeabilización de biblioteca
*Mantenimiento de la impermeabilización de Auditorio
*Mantenimiento de de pintura en los edificios de: módulos de aulas del 1-4, módulo de aulas del 5-8, módulos de aulas del 9-11, Rectoría, Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría de Administración, Biblioteca, Casa del Rector, Departamento de Profesores, Cafetería, Instituto de Farmacobiología, Sala de Computo 1, Sala de Auto acceso, Centro de Idiomas, Laboratorio de Biología, Laboratorio de Química, Laboratorio de Farmacología y Auditorio
*Fabricación y colocación de estructura de Domo de acero y policarbonato en la superficie de biblioteca



F5: Fachada Cuatro pisos (pintado)

DR. MODESTO SERRA VAZQUEZ
Nombre y firma del Titular de la IES

[Handwritten signature]
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES



Universidad de la Cañada
RECTORÍA

Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Es muy importante que se anexa reporte fotografico de todas las obras. Para ello se anexa una pestiña, se podrán copiar tantas pestiñas como sea necesario.
Para el seguimiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma tema, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2018

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
diciembre 2018
FECHA DE CORTE: 31/12/2018

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance

99

PRIORIDAD 3

Nombre de la obra: **Construcción de una Cancha de Usos Múltiples, en la Universidad de la Cañada.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7, Paraje Tiltlacuátlitla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: concreto armado en columnas



F2: piso de concreto 1'x200 kg/cm2

Comentarios de los trabajos realizados:

Con fecha 23 de octubre de 2018 se dio inicio a los trabajos de la construcción de la cancha de usos múltiples, se realizó el despalme, limpieza trazo y nivelación, se inició la excavación y se suministraron materiales como acero de refuerzo y labores.
Se habilitó el acero para zapatas, arriales, columnas, zapatas corridas, contrarribes, cadenas y castillo, se colocaron zapatas, contrarribes, dadas, cadenas y castillo y se enterró el mazo de 20 cm.



F3: estructura de acero para portería y tablero.



F4: retiro de escombros del interior de la superficie de cancha.



F5: armado de acero para periferia y perimetro.

DR. MODESTO SEARA VANDER

Nombre y firma del Titular de la IES

ARO ISLANY CARRASQUEL

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

Es muy importante que el reportero fotográfico de todas las obras. Para ello se arena una pastafila, se podrán copiar tantas pastafilas como sea necesario. Para equipamiento, mediciones y adecuaciones, en especial: se recomienda que se capture la misma forma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



Universidad de la Cañada

RECTORÍA

Universidad de la Cañada

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2018

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
diciembre_2018
FECHA DE CORTE: 21/12/2018

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance

99

Nombre de la obra: **Reemplazo de Bóilers de gas por Calentadores solares e Implementación de Wathorímetros en el Edificio de Departamentos de la Universidad de la Cañada**


CROQUIS DE LOCALIZACION

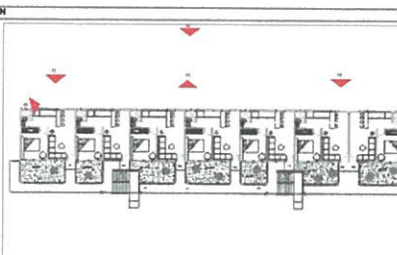


UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipán Km. 1.7; Paraje Tiltacuatilla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS

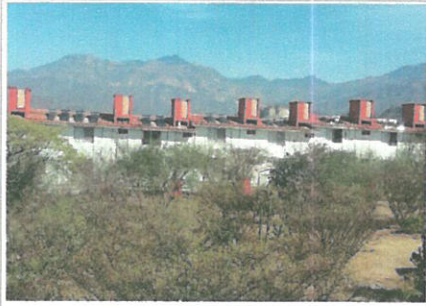

F1: Fachada posterior del Edificio (calentadores solares instalados)

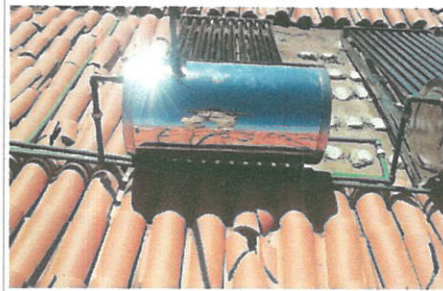


F2: Fachada posterior lado poniente (calentador instalado)

Comentarios de los trabajos realizados:
Se concluyó con los trabajos de instalación de calentadores solares y actualmente se encuentran en uso, debido a condiciones ajenas a la instalación, hubo un retraso en la entrega de los wathorímetros, la fecha estimada para la realización de la misma es del 11-ene-19.



F3: Área para instalación de Wathorímetros

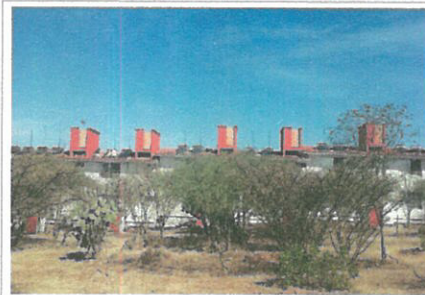

F4: Fachada posterior (instalación de calentadores solares)



F5: Perspectiva fachada posterior (descarga de agua caliente)

UN MEXICOSTO SEARA VAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Universidad de la Cañada

RECTORÍA
