


ACUSE

Oficio No.: VRAD/E/040/2019.

Teotitlán de Flores Magón, Oax., a 01 de marzo de 2019.

DOCTORA
CARMEN ENEDINA RODRÍGUEZ ARMENTA
DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA "DGESU"
PRESENTE:



Por este conducto y en atención al oficio número: 511-3/2018.-0511 de fecha 23 de mayo de 2018 y en alcance al similar número: 511/2015.-0373 envió el informe de los avances correspondientes al mes de enero y febrero de 2019, así como las actas administrativas de entrega-recepción de las obras apoyadas a través del Recurso FAM 2018 (anexo CD con información magnética).

Dicha información se envía de manera electrónica a los correos rocio@nube.sep.gob.mx, cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx y jcarlosv@nube.sep.gob.mx

Sin otro particular, le reitero mi más distinguida consideración.


ATENTAMENTE

"praeteritum noscere, posterum molior"



L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN



C.c.p.- DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ.- Rector de la Universidad de la Cañada.- Para su superior conocimiento.
ARQ. MELANY CUEVAS MANUEL.- Jefa del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento.- Para su conocimiento y seguimiento.
Archivo.

2018

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

enero_2018

FECHA DE CORTE: 31/1/2018

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad de la Cañada


Porcentaje de avance

48

PRIVIDAD 1

Nombre de la obra: **Equipamiento del Laboratorio de Investigación de la Universidad de la Cañada**

GEOGRÁFICA DE LOCALIZACIÓN

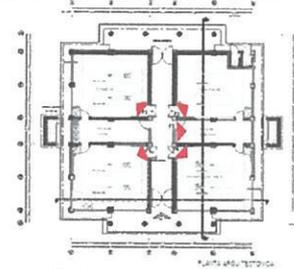

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatpan Km. 1.7, Paraje Titlacuattlia, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.


FOTOS



F1: Vista Interior Inorganica



F2: Vista Interior Instrumental

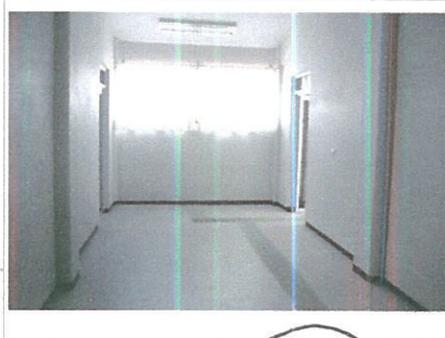

F3: Vista Interior Almacen de Reactivos



F4: Vista Interior Bromatología/Micro

Comentarios de los trabajos realizados:

A la fecha se tiene suministrado únicamente el mobiliario de oficina (F5), el mobiliario y equipo de laboratorio está en proceso de fabricación.

El material de oficina está resguardado en Área de Orgánica en el Edificio de Laboratorio de Investigación, para que una vez que se tenga el mobiliario y equipo de laboratorio se distribuya en las diferentes áreas.



F5: Vista Interior Organica (resguardo de mobiliario de oficina)

DR. MOCESTO SEARÁN VAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2018

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
enero_2018

FECHA DE EDITE 31/1/2018

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

99

PRIMORDIA 2

Nombre de la obra: **Mantenimiento de diversas áreas de la Universidad de la Cañada**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN




UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nahuatipan Km. 1.7; Paraje Titlacuatilla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: Fachada principal Biblioteca (edificio pintado e impermeabilizado)



F2: Área Superior de Biblioteca. Domo instalado

Comentarios de los trabajos realizados:

Los trabajos realizados fueron:
*Impermeabilización de biblioteca
*Mantenimiento de la impermeabilización de Auditorio
*Mantenimiento de de pintura en los edificios de módulos de aulas del 1-4, módulo de aulas del 5-E, módulos de aulas del 9-11, Rectoría, Vice-Rectoría Académica, Vice-Rectoría de Administración, Biblioteca, Casa del Rector, Departamento de Profesores, Cátedra Instituto de Farmacobiología, Sala de Computo 1, Sala de Auto servicio, Centro de Idiomas, Laboratorio de Biología, Laboratorio de Química, Laboratorio de Farmacología y Auditorio
*Fabricación y colocación de estructura de Domo, de acero y polícarbonato en la superficie de tablé, teca
OBRA CONCLUIDA AL 100%



F3: Fachada Auditorio (impermeabilizado y pintado)



F4: Puertas CAPCE del edificio de Aulas (por cambiar)



F5: Fachada Centro de Identidad (pintado)

PROYECTO SARA VAZQUEZ
Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestiña, se podrán copiar tantas pestiñas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones especiales, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
enero_2018

FECHA DE CORTE: 31/1/2018

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance

99

PRIORIDAD **3** Nombre de la obra: **Construcción de una Cancha de Usos Múltiples, en la Universidad de la Cañada.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nahuatlapan Km. 1.7. Paraje Tildacuatilla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: Cancha de Usos Múltiples Concluida




F2: Cancha de Usos Múltiples Concluida

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra concluida



F3: Cancha de Usos Múltiples Concluida

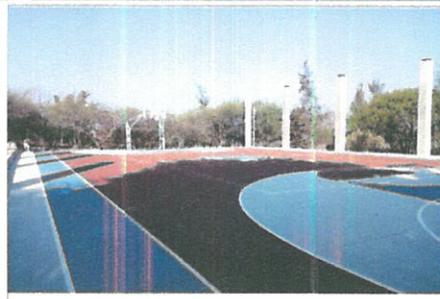

F4: Cancha de Usos Múltiples Concluida



F5: Cancha de Usos Múltiples Concluida

UN MODESTO SEARA VAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
enero_2018

FECHA DE CORTE: 31/1/2018

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance

99

PRORIDAD: **8** Nombre de la obra: **Reemplazo de Boilers de gas por Calentadores solares e implementación de Wathorímetros en el Edificio de Departamentos de la Universidad de la Cañada**


CRONOGRAMA DE LOCALIZACIÓN




UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nahuatipan Km. 1.7; Paraje Titlacuatilla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS

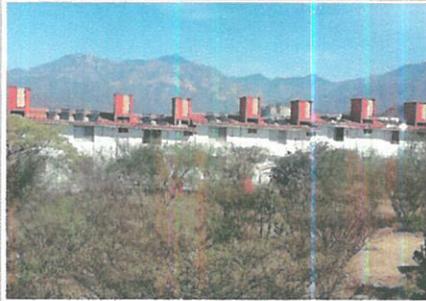


P1: Fachada posterior del Edificio (calentadores solares instalados)

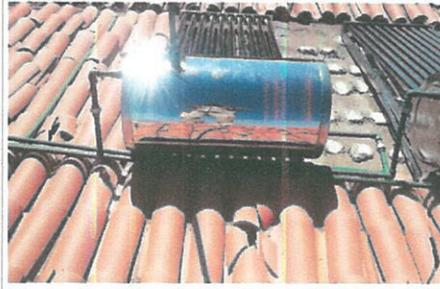

P2: Fachada posterior lado poniente (calentador instalado)

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra concluida

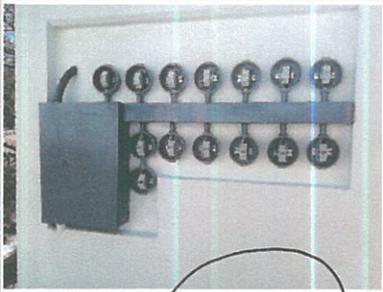

P3: Wathorímetros instalados



P4: Fachada posterior (instalación de calentadores solares)



P5: Pared posterior Fachada poniente (instalación de agua caliente)


DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES

DR. MELANY GUEVARA

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adrecciones, en especial: se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2018

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
febrero 2019
FECHA DE CORTE: 29/02/2019

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



NOMBRE Universidad de la Cañada

Entidad federativa: Oaxaca

Código Inst 911 20MSJ0032V

Planeación

NOMBRE L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ
Cargo VICE-RECTOR DE ADMNISTRACIÓN
Teléfono (236) 372 07 15, Ext. 200
Correo electrónico vice_admin@unca.edu.mx

RESPONSABLES

Obras y Mantenimiento
Nombre ARG. MELANY CUEVAS MANUEL
Cargo JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
Teléfono (236) 372 07 15, Ext. 208
Correo electrónico melany60@hotmail.com

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada				
		Obras de construcción	Equipamiento	Adquisición y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Especial/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	Entrega-Recepción (Acta final)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa	
																							¿Cuenta con fotos del evento?
1	Equipamiento del Laboratorio de Investigación de la Universidad de la Cañada	X				\$ 3,119,262.00	\$ 3,119,262.00	\$ -	Laboratorio de investigación	1	0.00	Suministro e instalación de muebles de Laboratorio	Otra terminada	100%	05/12/18	17/02/19	Se concluyeron los trabajos	SI	-	-	SI	SI	\$3,119,262.00
									TOTAL	1	0.00												
2	Mantenimiento de diversas áreas de la Universidad de la Cañada		X			\$ 950,650.80	\$ 950,650.80	\$ -	Edificios de la Universidad de la Cañada atendidos	18	7,599.04	Se realizaron los trabajos de pintura, de impermeabilización de biblioteca y auditorio, se adquirieron y colocaron las puertas tipo CAFFICE y se adquirió, colgó el domo de biblioteca	Otra terminada	100%	05/11/18	18/01/19	Se concluyeron los trabajos	NO, debido a que solo fueron trabajos de mantenimiento de edificios	-	-	SI	SI	\$950,650.80
									TOTAL	18	7599.04												
3	Construcción de una Cancha de Usos Múltiples, en la Universidad de la Cañada.		X			\$ 1,620,282.96	\$ 1,620,282.96	\$ -	Cancha de Usos Múltiples	1	710.00	EXCAVACIÓN A MANO HELADO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE SUELO, TRABAJOS DE LISA Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO. SE INICIO CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE MANTENCIÓN DE TIERRA, PISO DE 12 CM DE ESPESOR Y 200 KG/M ² BRICOLAS DE 3 CM, BRICOLAS PARA PISO DE VOLEIBOL, FABRICACIÓN CILINDRO DE SUELO PARA BARRIDO PAVIL, BARRIDO PAVIL, PISO DE 12 CM DE ESPESOR Y 200 KG/M ² BRICOLAS DE 3 CM, PINTURA BRICOLAS DE CANCHA Y ACONDICIONADO	Otra terminada	100%	23/10/18	31/01/19	Se concluyeron los trabajos	NO, debido a que únicamente se trata de la primera etapa	-	-	SI	SI	\$1,620,282.96
									TOTAL	1	710.00												
8	Reemplazo de Boilers de gas por Calentadores solares e implementación de Wathorímetros en el Edificio de Departamentos de la Universidad de la Cañada.		X			\$ 197,532.00	\$ 197,532.00	\$ -	Calentadores Solares wathorímetros	13 14	0.00 0.00	Se realizó la adquisición de los materiales y los equipos. Se instalaron los calentadores y los wathorímetros	Otra terminada	100%	26/11/18	18/01/19	Se concluyeron los trabajos	NO, debido a que únicamente se trata de adquisiciones, a un edificio existente	-	-	SI	SI	\$197,532.00
									TOTAL	27	0.00												
						\$6,877,727.76	\$6,877,727.76	\$0.00															

ER MOÉSITO SEARA VAZQUEZ
Nombre y firma del Titular de la IES

ARG. MELANY CUEVAS MANUEL
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas fotos como sea necesario.
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos, dd, mm y aa.

2018

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

febrero_2019


FECHA DE CORTE: 28/2/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD 1

Nombre de la obra: **Equipamiento del Laboratorio de Investigación de la Universidad de la Cañada**

GRUPOS DE LOCALIZACIÓN

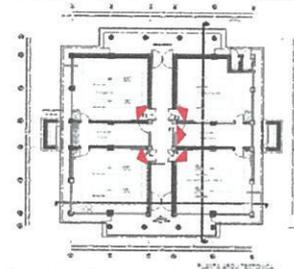

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Hanahuatipan Km. 1.7; Paraje Titlacuattla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.



Universidad de la Cañada

Porcentaje de avance

48

FOTOS



F1: Vista Interior Inorgánica (Equipado)



F2: Vista Interior Instrumental (Equipado)

Comentarios de los trabajos realizados:

EQUIPAMIENTO CONCLUIDO AL 100%



F3: Vista Interior Almacén de Reactivos (Equipado)



F4: Vista Interior Bromatología/Micro (Equipado)



F5: Vista Interior Orgánica (Equipado)

DR. ANTONIO BLANCO VAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
febrero_2019

FECHA DE CORTE: 28/02/2019

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

99

PRIORIDAD **2**

Nombre de la obra: **Mantenimiento de diversas áreas de la Universidad de la Cañada**


CROQUIS DE LOCALIZACION



UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7; Paraje Titlacuatitla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS

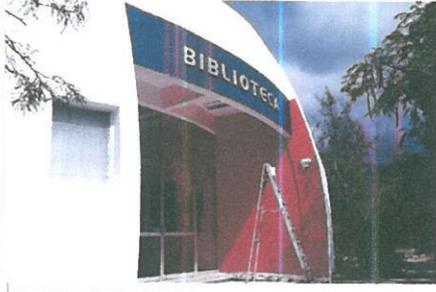

F1: Fachada principal Biblioteca (edificio pintado e impermeabilizado)



F2: Area Superior de Biblioteca. Domo instalado



F3: Fachada Auditorio (impermeabilizado y pintado)



F4: Puertas CAPFCE del edificio de Aulas (HUEVAS)

Comentarios de los trabajos realizados:
Los trabajos realizados fueron:
*Impermeabilización de biblioteca
*Mantenimiento de la impermeabilización de Auditorio
*Mantenimiento de la pintura en los edificios de: módulos de aulas del 1-4, módulo de aulas del 5-6, módulos de aulas del 7-11, Recibida, Vice-Rectoría Académica, Vice-Rectoría de Administración, Biblioteca, Casa del Rector, Departamento de Profesores, Cafetería, Instituto de Farmacobiología, Sala de Computo 1, Sala de Auto acceso, Centro de Idiomas, Laboratorio de Biología, Laboratorio de Química, Laboratorio de Farmacología y Auditorio
*Fabricación y colocación de estructura de Domo de acero y policarbonato en la superficie de biblioteca
*Colocación de 14 Puertas tipo Capfco



F5: Fachada Centro de laboratorios (pintado)

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y edificaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2018

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
febrero_2019
FECHA DE CORTE 18/1/2019

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance

99

PRIORIDAD 3 Nombre de la obra: **Construcción de una Cancha de Usos Múltiples, en la Universidad de la Cañada.**

CROQUIS DE LOCALIZACION



UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Naranhuatipan Km. 1.7; Paraje Tiltacuabilla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: Cancha de Usos Múltiples Concluida



F2: Cancha de Usos Múltiples Concluida



F3: Cancha de Usos Múltiples Concluida



F4: Cancha de Usos Múltiples Concluida



F5: Cancha de Usos Múltiples Concluida

Comentarios de los trabajos realizados:

Cancha de Usos Múltiples Concluida

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2018

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
febrero_2019

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance

99

Nombre de la obra: **Reemplazo de Boilers de gas por Calentadores solares e implementacion de Wathorímetros en el Edificio de Departamentos de la Universidad de la Cañada**


CHORRIS DE LOCALIZACION




UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nahuatlapan Km. 1.7; Paraje Tiltlacuatilla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS

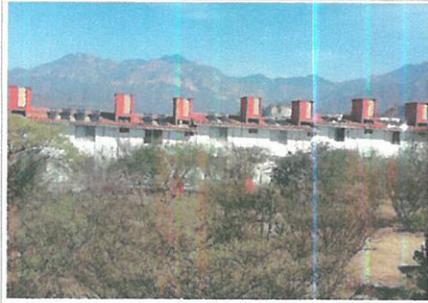


F1: Fachada posterior del edificio (calentadores solares instalados)

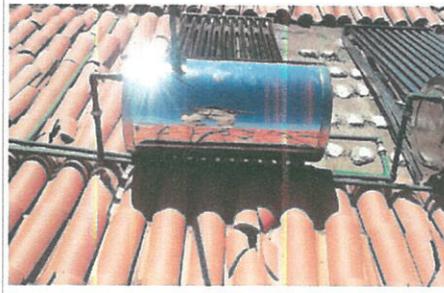

F2: Fachada posterior lado poniente (calentador instalado)

Comentarios de los trabajos realizados:

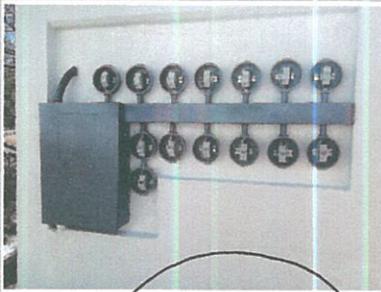

F3: Wathorímetros (instalados)



F4: Fachada posterior (instalacion de calentadores solares)



F5: Perspectiva fachada posterior (carga de agua caliente)

DR. MOCOSTO SEARA VAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la ES

DR. HELMUT LEYVA MANUEL

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la ES

* Es muy importante que se anexe reporte fotografico de todas las obras. Para ello se anexa esta pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.



Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO



UR
Dirección General de
Educación Superior
Universitaria

DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ
RECTOR
UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
PRESENTE

Dirección de
Fortalecimiento
Institucional

Oficio
Informe de Avance
FAM 2018

Folio
511-3/2019.-0463

Referencia
DGESU-2019-001501
DFI-663-19

Lugar
CDMX

Fecha
22 de marzo 2019

En relación al Oficio No. VRAD/E/040/2019, de fecha 01 de marzo del año en curso, signado por el L.C.E. Alfonso Martínez López, Vice-Rector de Administración, mediante el cual envía en CD, el informe de avance de las obras apoyadas a través de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para Educación Superior, ejercicio fiscal 2018, correspondiente a los meses de enero y febrero del 2019 y copia de Actas Administrativas de Entrega-Recepción, de la institución que dignamente dirige.

Comunico a usted que, como resultado de la revisión al CD anexo al oficio arriba citado, se observa que:

- 1) Las obras se han concluido al 100%, ejerciendo el total del monto autorizado de \$5,877,727.76 (Cinco millones ochocientos setenta y siete mil setecientos veintisiete pesos 76/100 M.N.).
- 2) Se acusa de recibido las Actas Administrativas de Entrega-Recepción, con lo que se da por concluido el seguimiento Administrativo de las obras:
 - 1) Equipamiento del laboratorio de investigación de la Universidad de la Cañada.
 - 2) Mantenimiento de diversas áreas de la Universidad de la Cañada.
 - 3) Construcción de una cancha de usos múltiples en la Universidad de la Cañada.
 - 4) Reemplazo de boilers de gas por calentadores solares e implementación de wathorímetros en el edificio de Departamentos de la Universidad de la Cañada.

FAM 2018							
No.	Obra	Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Avance físico	Fecha inicio	Fecha término
1	Equipamiento del Laboratorio de Investigación de la Universidad de la Cañada	3,119,262.00	3,119,262.00	0.00	100.00	05/12/18	17/02/19
2	Mantenimiento de diversas áreas de la Universidad de la Cañada	950,650.80	950,650.80	0.00	100.00	15/11/18	18/01/19
3	Construcción de una cancha de usos múltiples en la Universidad de la Cañada	1,620,282.96	1,620,282.96	0.00	100.00	23/10/18	31/01/19
4	Reemplazo de boilers de gas por calentadores solares e implementación de wathorímetros en el edificio de Departamentos de la Universidad de la Cañada	187,532.00	187,532.00	0.00	100.00	26/11/18	18/01/19
Total		5,877,727.76	5,877,727.76	0.00	100.00		

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



UR
Dirección General de
Educación Superior
Universitaria

Dirección de
Fortalecimiento
Institucional

Oficio
Informe de Avance
FAM 2018

Folio
511-3/2019.-0463

Referencia
DGESU-2019-001501
DFI-663-19

Lugar
CDMX

Fecha
22 de marzo 2019

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Sin otro particular, reciba mis más cordiales saludos.

ATENTAMENTE


DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARAZ
DIRECTOR



S. E. P.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

c.c.p. Dr. Luciano Concheiro Bórquez, Subsecretario de Educación Superior.-Para su conocimiento.
Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria.-Para su conocimiento.
L.C.E. Alfonso Martínez López, Vice-Rector de Administración de la Universidad de la Cañada.-Para su conocimiento.
Arq. Melany Cuevas Manuel, Jefa del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento de la Universidad de la Cañada.-Para su conocimiento.

Av. Universidad 1200, Piso 5 Sector 27, Col. Xoco Alcaldía Benito Juárez, 03330
Ciudad de México, Tel: 3601 2511 Ext. 65644 • www.dgesu.ses.sep.gob.mx
CERA/IEA/RCHM/cesm/cgmr
