



UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA  
VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

S.E.P.  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN  
SUPERIOR UNIVERSITARIA

"2018, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL"

**RECIBIDO**  
11:56  
20 AGO 2018  
JOSUE

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO  
INSTITUCIONAL

Oficio No. VRAD/E/172/2018.

Teotitlán de Flores Magón, Oax., a 14 de agosto de 2018.


**DOCTOR**  
**SALVADOR ALEJANDRO MALO ALVAREZ**  
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN  
SUPERIOR UNIVERSITARIA DGESU  
P R E S E N T E:

Por este conducto y en atención al oficio 511-3/2018.-0511 de fecha 23 de mayo de 2018 y en alcance al similar 511/2015.-0373 envío el informe de los avances con fecha corte 31 de julio de 2018, de las obras apoyada a través del Recurso FAM 2018. (Anexo CD con información magnética).

Por lo antes expuesto, remito a usted el reporte actualizado en archivo electrónico formato Excel y de manera electrónica a los correos: [rocioc@nube.sep.gob.mx](mailto:rocioc@nube.sep.gob.mx), [cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx](mailto:cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx) y [jcarlosv@nube.sep.gob.mx](mailto:jcarlosv@nube.sep.gob.mx)

Sin otro particular, le reitero mi más distinguida consideración.

**ATENTAMENTE**

*"praeteritum noscere, posterum melius"*  
  
L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ  
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN



C.c.p.- DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ.- Rector de la Universidad de la Cañada.- Para su superior conocimiento.  
DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARAZ.- Director de Fortalecimiento Institucional.-Para su conocimiento.  
Expediente.

2018

AÑO

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Julio\_2018

FECHA DE CORTE: 31/7/2018

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad de la Cañada

Entidad federativa: Oaxaca

Clave Inst 911: 20MSU0032V

RESPONSABLES

Planeación  
Nombre: L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ  
Cargo: VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
Teléfono: (238) 372 07 15, Ext.: 200  
Correo electrónico: vice\_admin@unca.edu.mx

Obras y Mantenimiento  
Nombre: ARG. MELANY CUEVAS MANUEL  
Cargo: JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO  
Teléfono: (238) 372 07 15, Ext.: 208  
Correo electrónico: melany00@hotmail.com

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada								
		Obras de construcción	Equipamiento	Adquisiciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustancial				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa				
																									Cuenta con Actas			
1	Equipamiento del Laboratorio de Investigación de la Universidad de la Cañada	X					\$ 3,119,262.00	\$ -	\$ 3,119,262.00						0			El proyecto se encuentra en trámite administrativo.										
										TOTAL	0	0.00	GLOBAL DEL PROYECTO															
2	Mantenimiento de diversas áreas de la Universidad de la Cañada		X				\$ 950,850.80	\$ -	\$ 950,850.80						0			El proyecto se encuentra en trámite administrativo.										
										TOTAL	0	0.00	GLOBAL DEL PROYECTO															
3	Construcción de una Cancha de Usos Múltiples, en la Universidad de la Cañada.		X				\$ 1,620,282.96	\$ -	\$ 1,620,282.96						0			Con fecha 26 de Junio fue autorizado el cambio de proyecto.										
										TOTAL	0	0.00	GLOBAL DEL PROYECTO															
4	Reemplazo de Boilers de gas por Calentadores solares e implementación de Wathorímetros en el Edificio de Departamentos de la Universidad de la Cañada.			X			\$ 187,532.00	\$ -	\$ 187,532.00						0			El proyecto se encuentra en trámite administrativo.										
										TOTAL	0	0.00	GLOBAL DEL PROYECTO															
						\$4,877,727.76	\$0.00	\$5,877,727.76																				




DR. MODESTO BEARA VAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES

1 Se capturan en reportes de avance los datos de la obra en proceso. Se podrán anexar tanta fotos como sea necesario.

2 En esta sección se detallan los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

3 Es importante anotar fechas de inicio y término de las actividades. Todas en dos dígitos de mes y año.



Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento

Universidad de la Cañada

RECTORÍA

Universidad de la Cañada  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,  
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO



2018

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**julio\_2018**

FECHA DE CORTE: 31/7/2018

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRORIDAD **1**

Nombre de la obra: **Equipamiento del Laboratorio de Investigación de la Universidad de la Cañada**




Universidad de la Cañada

Porcentaje de avance

**0**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

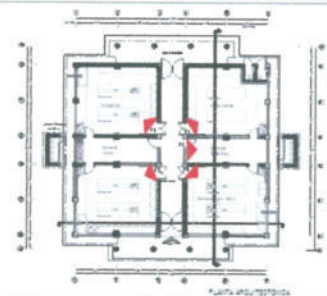

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatpan Km. 1.7; Paraje Titlacuatilla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: Vista Interior Inorganica



F2: Vista Interior Instrumental

Comentarios de los trabajos realizados:  
Aun no se tienen trabajos realizados, debido a que el estatus de la obra se encuentra "en proceso Administrativo"



F3: Vista Interior Almacen de Reactivos




F4: Vista Interior Bromatologia/Micro



F5: Vista Interior Organica



DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ  
Nombre y firma del Titular de la IES



ARD. MELANY CUEVAS MANUEL  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.  
Se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

RECTORÍA

Universidad de la Cañada  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,  
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO



2018

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**julio\_2018**  
FECHA DE CORTE: 31/07/2018

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad de la Cañada


Porcentaje de avance

0

PROYECTO 2

Nombre de la obra: **Mantenimiento de diversas areas de la Universidad de la Cañada**

CROQUIS DE LOCALIZACION

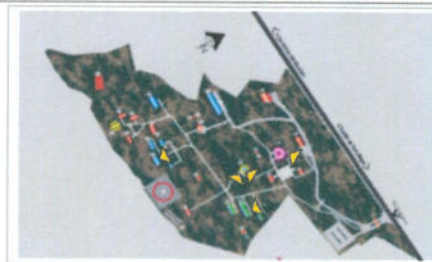

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nahuatipan Km. 1.7; Paraje Tiliacuatitla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: Fachada principal Biblioteca



F2: Área Superior de Biblioteca para instalar Domo

Comentarios de los trabajos realizados:

Aun no se tienen trabajos realizados, debido a que el estatus de la obra se encuentra "en proceso Administrativo"



F3: Fachada Auditorio



F4: Puertas CAPPCE del edificio de Aulas



F5: Fachada Centro de Idiomas

DR. MOCESTO BEAÑA VAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES



Universidad de la Cañada

RECTORÍA



Universidad de la Cañada  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,  
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2018

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**julio\_2018**

FECHA DE CORTE: 31/7/2018

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Porcentaje de avance

0

PRIOREDAD 3 Nombre de la obra: **Construcción de una Cancha de Usos Múltiples, en la Universidad de la Cañada.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

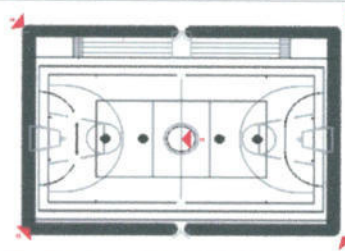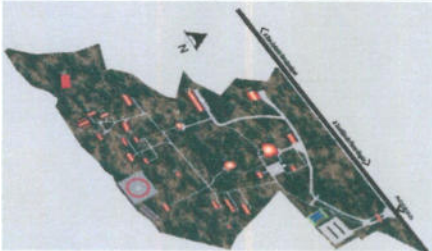

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7; Paraje Tilacuastilla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: Superficie en donde se Construirá la Cancha de Usos Múltiples



F2: Superficie en donde se Construirá la Cancha de Usos Múltiples

Comentarios de los trabajos realizados:

Aun no se tienen trabajos realizados, debido a que el estatus de la obra se encuentra "en proceso Administrativo"



F3: Superficie en donde se Construirá la Cancha de Usos Múltiples



F4: Superficie en donde se Construirá la Cancha de Usos Múltiples

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES

DR. MELANY CURTIS MANUEL

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

En ningún momento que este reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para su uso, recomendamos, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



2018

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**julio\_2018**  
FECHA DE CORTE: 31/07/2018

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Universidad de la Cañada

Porcentaje de avance

0

Nombre de la obra: **Reemplazo de Boilers de gas por Calentadores solares e implementación de Wathorímetros en el Edificio de Departamentos de la Universidad de la Cañada**

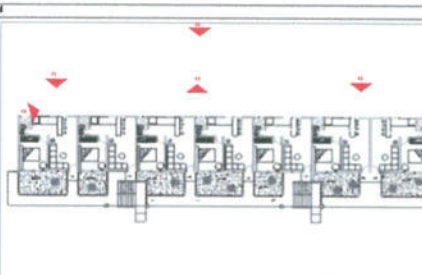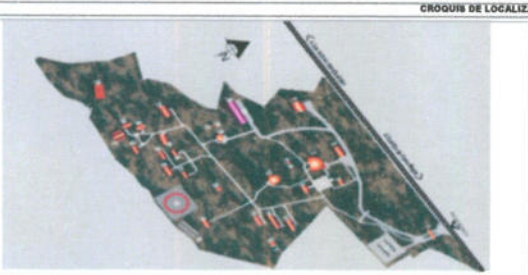

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO  
Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7; Paraje Tilacustitla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: Fachada posterior del Edificio



F2: Fachada posterior lado poniente

Comentarios de los trabajos realizados:

Aun no se tienen trabajos realizados, debido a que el estatus de la obra se encuentra "en proceso Administrativo"



F3: Arreglo instalación de Wathorímetros



F4: Fachada posterior



F5: Perspectiva fachada posterior

DR. MODESTO SEABA HINOJOS

Nombre y firma del Titular de la IES

APD. MELANY CUEVAS MANUEL

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

Este informe fotográfico debe ser el resultado de un reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se genera una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para el establecimiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



Universidad de la Cañada

RECTORÍA



Universidad de la Cañada  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,  
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
