



UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

S.E.P.
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

RECIBIDO
15 AGO 2019
E. Naranjo
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
ACUSE

Oficio No. VRAD/E/183/2019.

Teotitlán de Flores Magón, Oax., a 09 de agosto de 2019.

DOCTORA
CARMEN ENEDINA RODRIGUEZ ARMENTA
DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DGESU
P R E S E N T E:

Por este conducto y en atención al oficio 511/2019.-0275 de fecha 18 de febrero de 2019 envió el informe de avance del mes de julio, con fecha corte 31 de julio de año 2019, de las obras apoyada a través del Fondo de Aportaciones Múltiples del ejercicio 2019. (anexo CD con información magnética).

Por lo antes expuesto, remito a usted el reporte actualizado en archivo electrónico formato Excel y de manera electrónica a los correos rocioc@nube.sep.gob.mx, cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx y jcarlosv@nube.sep.gob.mx

Sin otro particular, le reitero mi distinguida consideración.

ATENTAMENTE
"praeteritum noscere, posterum molior"

L.C.E. ALEJANDRO MARTÍNEZ LÓPEZ
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Universidad de la Cañada
VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN



C.c.p.- DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ.- Rector de la Universidad de la Cañada.- Para su superior conocimiento.
DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARAZ.- Director de Fortalecimiento Institucional.- Para su conocimiento.
Expediente.

2019

A330

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

julio_2019

FECHA DE CORTE: 31/07/2019

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad de la Cañada
Entidad federativa: Oaxaca
Clave Inst 911 20MSU002Y

RESPONSABLES

Planeación
Nombre: L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ
Cargo: VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Teléfono: (296) 372 07 15, Ext. 200
Correo electrónico: vice_admin@unca.edu.mx

Obras y Mantenimiento
Nombre: ARIQ MELANY CUEVAS MANUEL
Cargo: JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
Teléfono: (296) 372 07 15, Ext. 208
Correo electrónico: supervision.obras@unca.edu.mx, melany60@hotmail.com

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO


OBRA CONCLUIDA

| Prioridad | Nombre del proyecto | Tipo de proyecto | | | | Monto autorizado | Monto ejercido | Remanente | Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹ | | | Acciones que sustentan el avance ² | Acciones por realizar | % de avance | Fechas ³ | | Observaciones | ¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas) | Si ya fue inaugurada | | | Cuenta con Actas | | |
|-----------|--|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|---|-----------------|----------|--|---|-------------|---------------------|----------|---------------------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|
| | | Obras de construcción | Equipamiento | Adquisición y mejoras | Mantenimiento | | | | Proyecto sustentable | Especial/equipo | cantidad | | | | metros cuadrados | Inicio | | | Término | ¿Cuenta con fotos del evento? | ¿Quién y cuándo inauguró? | Entrega-Recepción (Acta final) | Acta Administrativa de Entrega-Recepción | Monto de Acta Administrativa |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Construcción de un edificio diez Aulas Pedagógicas en la Universidad de la Cañada | X | | | | \$ 5,668,129.98 | \$ - | \$ 5,668,129.98 | | | | Limpa trazo, excavación, planchales, habilitado y colocado de acero de refuerzo en cimentación | Continuar con los cascabelos de cimentación, posteriormente, estructuras, albañilería y acabados, etc | 4% | 15/07/19 | 11/11/19 | En Proceso de Ejecución | SI | - | - | NO | NO | \$0.00 | |
| TOTAL | | | | | | | | | 0 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Construcción de un Centro de Investigación en Nutrición y Alimentación en la Universidad de la Cañada (C.I.N.A.) | X | | | | \$ 5,042,429.96 | \$ - | \$ 5,042,429.96 | | | | | | 0% | | | En proceso Administrativo | NO, debido a que solo fueron trabajos de mantenimiento de edificios | - | - | NO | NO | \$0.00 | |
| TOTAL | | | | | | | | | 0 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | \$10,710,559.94 | \$0.00 | \$10,710,559.94 | | | | | | | | | | | | | | | | |

DR. MOCÉSTO SEARA VAZQUEZ
Nombre y firma del Titular de la IES

ARIQ MELANY CUEVAS MANUEL
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra del proyecto. Se podrán anexar tantas filas como sea necesario.
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.



Universidad de la Cañada
RECTORÍA



Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2019

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
julio_2019

FECHA DE CORTE: 31/07/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD **1**

Nombre de la obra: **Construcción de un edificio diez Aulas Pedagógicas en la Universidad de la Cañada**





Universidad de la Cañada

Porcentaje de avance

4


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

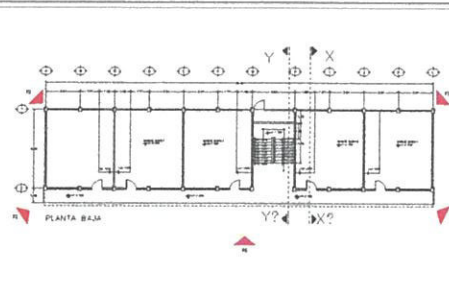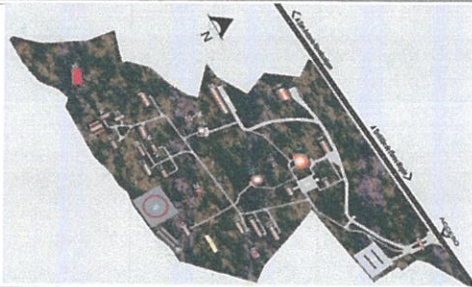

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7; Paraje Titlacuattila, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS

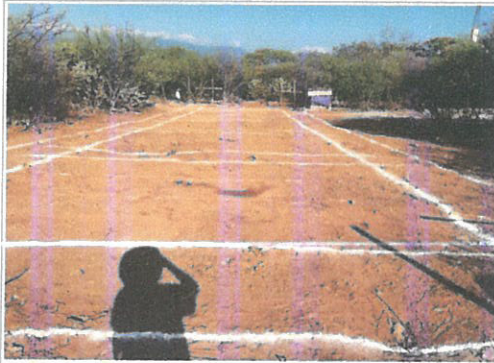

F1: Limpieza y trazo



F2: Excavación en terreno tipo B o C

Comentarios de los trabajos realizados:


En proceso de ejecución.



F3: Plancha de concreto f'c=100kg/cm2



F4: Acero de refuerzo en columnas, zapatas y contratabres.

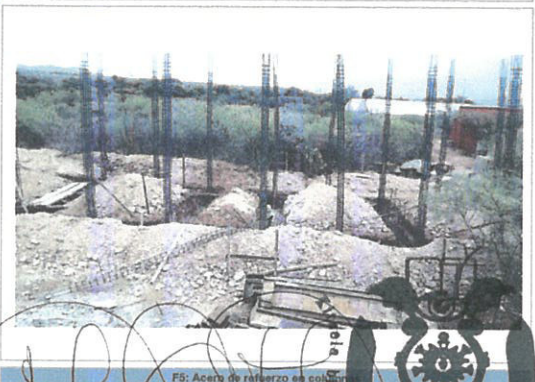

F5: Acero de refuerzo en columnas

DR. MODESTO CARRA VAZQUEZ
Nombre y firma del Titular de la IES

ARG. MELANY CUEVAS MARQUEL
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES



Universidad de la Cañada

RECTORÍA

Es importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

Universidad de la Cañada

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2019

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
julio_2019

FECHA DE CORTE 31/07/2019

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

0

PROYECTOS 2

Nombre de la obra: **Construcción de un Centro de Investigación en Nutrición y Alimentación en la Universidad de la Cañada (C.I.N.A.)**

CRONOGRAMA DE LOCALIZACIÓN



UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nahuatlapan Km. 1.7, Paraje Titlacuutila, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: vista del sitio antes de la Edificación.



F2: vista del sitio antes de la Edificación.



F3: vista del sitio antes de la Edificación.



F4: vista del sitio antes de la Edificación.

Comentarios de los trabajos realizados:

En proceso Administrativo




F5: Fachada Central del Centro (planta)

DR. ROBERTO SEARA VAZQUEZ
Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

Se reportará que se anexa reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestiña, se podrán copiar tantas pestiñas como sea necesario.
El mantenimiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



Universidad de la Cañada

RECTORÍA



Universidad de la Cañada

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
