



UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

Oficio No. VRAD/E/128/2019.

Teotitlán de Flores Magón, Oax., a 05 de junio de 2019.

DOCTORA
CARMEN ENEDINA RODRIGUEZ ARMENTA
DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA DGESU
P R E S E N T E:

Por este conducto y en atención al oficio 511/2019.-0275 de fecha 18 de febrero de 2019 envió el informe de avance del mes de mayo, con fecha corte 31 de mayo del año 2019, de las obras apoyada a través del Fondo de Aportaciones Múltiples del ejercicio 2019. (anexo CD con información magnética).


Por lo antes expuesto, remito a usted el reporte actualizado en archivo electrónico formato Excel y de manera electrónica a los correos rocioc@nube.sep.gob.mx, cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx y jcarlosv@nube.sep.gob.mx

Sin otro particular, le reitero mi distinguida consideración.

ATENTAMENTE

"praeteritum noscere, posterum molior"

~~L.C.E. ALBERTO MARTÍNEZ LÓPEZ~~
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN




Universidad de la Cañada

VICE-RECTORÍA DE
ADMINISTRACIÓN



Anexa en CD

C.c.p.- DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ.- Rector de la Universidad de la Cañada.- Para su superior conocimiento.
DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARAZ.- Director de Fortalecimiento Institucional.- Para su conocimiento.
Expediente.

2019

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

mayo_2019

FECHA DE CORTE: 31/05/2019

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad de la Cañada
Entidad federativa: Oaxaca
Clave Inst 911: 20M8U0032V

RESPONSABLES

Planesión	Obras y Mantenimiento
Nombre: L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ Cargo: VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN Teléfono: (238) 373 07 18, Ext. 200 Correo electrónico: vice_admin@unca.edu.mx	Nombre: ARG. MELANY CUEVAS MANUEL Cargo: JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO Teléfono: (238) 373 07 18, Ext. 200 Correo electrónico: supervision-obras@unca.edu.mx, melany00@hotmail.com

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Casas)	Cuenta con Actas				
		Obras de infraestructura	Obras de rehabilitación	Obras de mantenimiento	Obras de equipamiento				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Construcción de un edificio diez Aulas Pedagógicas en la Universidad de la Cañada	X				\$ 5,008,129.98	\$ -	\$ 5,008,129.98						0%			En proceso Administrativo.	SI	-	-	NO	NO	\$0.00
									TOTAL	0	0.00												
2	Construcción de un Centro de Investigación en Nutrición y Alimentación en la Universidad de la Cañada (C.I.N.A.)	X				\$ 5,042,429.98	\$ -	\$ 5,042,429.98						0%			En proceso Administrativo.	NO, debido a que solo fueron trabajos de mantenimiento de edificios.	-	-	NO	NO	\$0.00
									TOTAL	0	0.00												
						\$10,710,898.94	\$0.00	\$10,710,898.94															

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
 Nombre y firma del Titular de la IES

ARG. MELANY CUEVAS MANUEL
 Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento

1 Se capturarán los espacios físicos en metros cuadrados, considerando el área construida, considerando la planta arquitectónica. Se deberá anexar tanta fotos como sea necesario.
 2 En esta sección se deberá registrar el avance del proyecto, considerando el avance físico y financiero, de manera que se vean reflejados en el reporte fotográfico.
 3 Es importante que las fechas se registren en dos dígitos: dd, mm y aa.

Universidad de la Cañada
RECTORÍA

Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

mayo_2019

FECHA DE CORTE: 31/05/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad de la Cañada


Porcentaje de avance

0

PRIORIDAD 1 Nombre de la obra:

Construcción de un edificio diez Aulas Pedagógicas en la Universidad de la Cañada

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

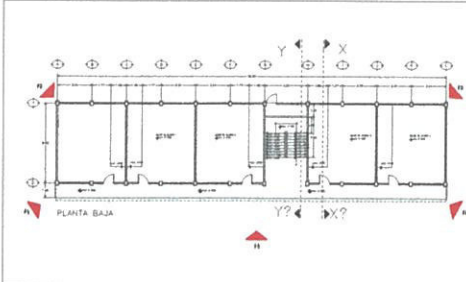

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlán- San Antonio Nanehuatpan Km. 1.7; Paraje Tilitlacuatlán, Teotitlán de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: Vista interior inorgánica (Equipado)



F2: Vista interior instrumental (Equipado)

Comentarios de los trabajos realizados:

En proceso Administrativo.



F3: Vista interior Almacén de Reactivos (Equipado)



F4: Vista interior Bromatología/Micro (Equipado)



F5: Vista interior Organismo de Gestión (Equipado)



DR. MODESTO BEARA VÁSQUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES



Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

Universidad de la Cañada

RECTORÍA

Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2019

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE PORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
mayo_2019

FECHA DE CORTE 31/5/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad de la Cañada


Porcentaje de avance

0

PRIOIRIDAD 2

Nombre de la obra: **Construccion de un Centro de Investigación en Nutrición y Alimentación en la Universidad de la Cañada (C.I.N.A.)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nahuatlipan Km. 1.7; Paraje Titlacuatlil, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: vista del sitio antes de la Edificación.



F2: vista del sitio antes de la Edificación.



F3: vista del sitio antes de la Edificación.



F4: vista del sitio antes de la Edificación.

Comentarios de los trabajos realizados:

En proceso Administrativo.

DR. MODESTO BEARA VAZQUEZ
Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

Universidad de la Cañada

RECTORÍA

Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
