



UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Área: | Vice-Rectoría de Administración |
| Oficio No. | VRAD/E/252/2019. |
| Asunto: | Informe de Avances FAM 2019 |

ACUSE

Teotitlán de Flores Magón, Oax., a 10 de octubre de 2019.

DOCTORA
CARMEN ENEDINA RODRIGUEZ ARMENTA.
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA DGESU
P R E S E N T E:

Por este conducto y en atención al oficio 511/2019.-0275 de fecha 18 de febrero de 2019 envió el informe de avance con fecha corte 30 de septiembre del año 2019, de las obras apoyada a través del Fondo de Aportaciones Múltiples del ejercicio 2019. (anexo CD con información magnética)

Por lo antes expuesto, remito a usted el reporte actualizado en archivo electrónico formato Excel y de manera electrónica a los correos rocioc@nube.sep.gob.mx, cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx y jcarlosv@nube.sep.gob.mx

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE
"praeteritum noscere, posterum molior"



~~L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ~~
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Universidad de la Cañada
VICE-RECTORÍA DE
ADMINISTRACIÓN




C.c.p.- DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ. - Rector de la Universidad de la Cañada. - Para su superior conocimiento.
DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARAZ. - Directora de Fortalecimiento Institucional. - Mismo Fin.
ARQ. MELANY CUEVAS MANUEL. - Jefa del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento. - Mismo Fin.
Expediente.

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

septiembre_2019

FECHA DE CORTE 30/09/2019

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad de la Cañada
Entidad federativa: Oaxaca
Código Inst: 911 2045X0027

RESPONSABLES

| Planeación | | Obras y Mantenimiento | |
|---------------------|---------------------------------|-----------------------|---|
| Nombre: | L. C. E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ | Nombre: | ARO MELANY CUEVAS MARQUEL |
| Cargo: | VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN | Cargo: | JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO |
| Teléfono: | (238) 372 07 15, Ext. 200 | Teléfono: | (238) 372 07 15, Ext. 208 |
| Correo electrónico: | vica_admin@unca.edu.mx | Correo electrónico: | supervisionobras@unca.edu.mx, melany60@hotmail.com |

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

| Prioridad | Nombre del proyecto | Tipo de proyecto | | | | Monto autorizado | Monto ejercido | Remanente | Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹ | | | Acciones que sustentan el avance ² | Acciones por realizar | % de avance | Fechas ³ | | Observaciones | OBRA CONCLUIDA | | | | | |
|--------------|--|--------------------------|--------------|------------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|---|----------------|----------|---|--|-------------|---------------------|---|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------|--------|
| | | Obras de infraestructura | Equipamiento | Adecuaciones y mejoras | Mantenimiento | | | | Proyecto sustentable | Espacio/equipo | cantidad | | | | metros cuadrados | ¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas) | | Si fue inaugurada | | Cuenta con Actas | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ¿Cuenta con fotos del evento? | ¿Quién y cuándo inauguró? | Entrega-Recepción (Acta finalizado) | Acta Administrativa de Entrega-Recepción | Monto de Acta Administrativa | |
| 1 | Construcción de un edificio diez Aulas Pedagógicas en la Universidad de la Cañada | X | | | | \$ 5,668,129.98 | \$ 346,948.02 | \$ 5,321,181.96 | Diez Aulas Pedagógicas | 646.10 | | LOCACIÓN cédulas de diezante, muros de laberinto de 20cm, habilitado y armado de acero de refuerzo y cimbra en trabes, columnas, cédulas, castillos y colado de las mismas, cimbrado, habilitado y armado de acero de refuerzo y colado de losa de entrevano. | Continuar en la segunda planta con rivets de 20cm, habilitado y armado de acero de refuerzo y cimbrado en trabes, columnas, cédulas, castillos y colado de las mismas, cimbrado, habilitado y armado de acero de refuerzo y colado de losa de entrevano. | 26% | 15/07/19 | 11/11/19 | En Proceso de Ejecución | NO | - | - | NO | NO | \$0.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | 0 | 646.10 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Construcción de un Centro de Investigación en Nutrición y Alimentación en la Universidad de la Cañada (C.I.N.A.) | X | | | | \$ 5,042,429.98 | \$ - | \$ 5,042,429.98 | C.I.N.A. | 547.42 | | Excavación por medios mecánicos en terreno tipo B o C habilitado de acero de refuerzo para cimentación. | Continuar con el colado de planta armado de acero de refuerzo en cimentación, colado de cimentación, muros de anclaje, etc. | 4% | 03/09/19 | 31/12/19 | En Proceso de Ejecución | NO | - | - | NO | NO | \$0.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | 0 | 547.42 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | \$10,710,559.96 | \$346,948.02 | \$10,363,611.92 | | | | | | | | | | | | | | | |

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES

- Se capturarán los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas filas como sea necesario.
- En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos realizados, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
- Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.



Universidad de la Cañada
RECTORÍA

Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2019

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
septiembre_2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad de la Cañada

Porcentaje de avance

4

PRORIDAD 2

Nombre de la obra: **Construcción de un Centro de Investigación en Nutrición y Alimentación en la Universidad de la Cañada (C.I.N.A.)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipán Km. 1.7; Paraje Tlalacuattla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: Excavación



F2: Excavación

Comentarios de los trabajos realizados:

Obras en proceso de ejecución.



F3: Excavación



F4: Instalación de acero de refuerzo en columnas, castillos y cadenas.




F5: Instalación de acero de refuerzo en columnas, castillos y cadenas.


DR. MODESTO BEARA VAZQUEZ
Nombre y firma del Titular de la IES

ANQ. MELANY CUEVAS MANUEL
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una constancia de recepción de los trabajos cuando sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma constancia de recepción antes, durante y después de la obra.



Universidad de la Cañada
RECTORÍA



Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2019

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
septiembre_2019
FECHA DE CORTE: 30/09/2019

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Porcentaje de avance

26

PRIORIDAD 1

Nombre de la obra: **Construcción de un edificio diez Aulas Pedagógicas en la Universidad de la Cañada**


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

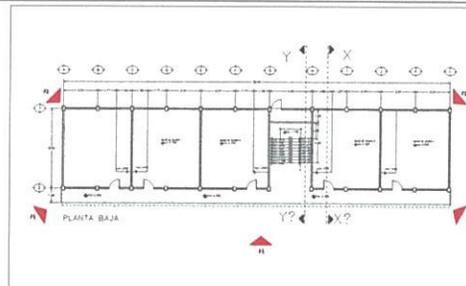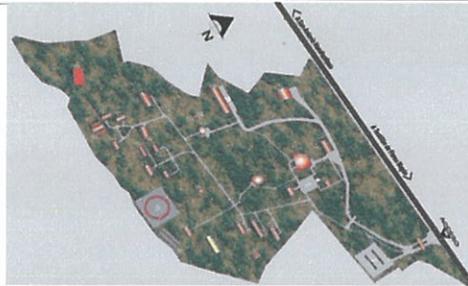

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7; Paraje Titlacuatilla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS

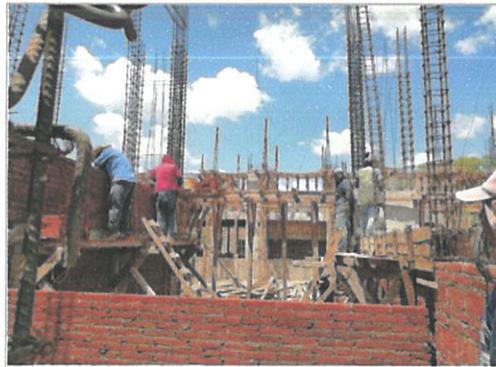

F1: Formero de tabique, habilitado de obra para traba y cadenas, acero de refuerzo en cadenas y castillos.



F2: Cimbrado de traves y votado de losas.

Comentarios de los trabajos realizados:

En proceso de ejecución.



F3: Cimbrado de losa dentro de refuerzo en traves, entornas, cañillas y juntas de refuerzo.



F4: Cimbrado de losa de entrepiso



F5: Obra en obra de entrepiso.

DR. MODESTO BEARA VAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la IEG

ARG. MELANY CUEVAS MANUEL

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IEG

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa un croquis de la obra como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para antes, durante y despues de la obra.

RECTORÍA
