



UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA  
VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

“2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO”

Área:	Vice-Rectoría de Administración.
Oficio No.:	VRAD/E/189/2020.
Asunto:	Informe trimestral del FAM 2020.

Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca; a 09 de octubre de 2020.

**DOCTORA**  
**CARMEN ENEDINA RODRÍGUEZ ARMENTA**  
DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN  
SUPERIOR UNIVERSITARIA “DGESU”  
P R E S E N T E:

En atención al oficio número: 511/2020.-0854-38 de fecha 13 de febrero de 2020 y según el Tercer Comunicado a Universidades Públicas Estatales, Universidades Públicas Estatales de Apoyo Solidario y Universidades Interculturales ante la contingencia del virus SARS Covid 19; por este conducto me permito enviarle el informe de avance correspondiente al trimestre julio-septiembre, con fecha corte 30 de septiembre de 2020, de las obras apoyadas a través del Fondo de Aportaciones Múltiples del ejercicio 2020 (anexo CD con información magnética).

Por lo antes expuesto, remito a usted el reporte actualizado en archivo electrónico formato Excel y de manera electrónica a los correos rocioc@nube.sep.gob.mx, cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx y jcarlosv@nube.sep.gob.mx

Sin otro particular, le reitero mi distinguida consideración.

**ATENTAMENTE**

*“praeteritum noscere, posterum molior”*

L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ  
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



VICE-RECTORÍA DE  
ADMINISTRACIÓN

C.c.p.- DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ.- Rector de la Universidad de la Cañada.- Para su superior conocimiento.  
DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARAZ.- Director de Fortalecimiento Institucional.- Para su conocimiento.  
Archivo.

2020



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**Jul-sep/2020**  
FECHA DE COPIE 30/09/2020

**REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL**

**DATOS DE LA UNIVERSIDAD**



Nombre: **Universidad de la Cañada**  
Entidad federativa: **Ciudad**  
Clave IMI 911: **20M5J002V**

**RESPONSABLES**

Planes  
Nombre: **L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ**  
Cargo: **VICEDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN**  
Teléfono: **(336) 372 07 15, Ext.: 200**  
Correo electrónico: **vma\_admin@unca.edu.mx**

Obras y Mantenimiento  
Nombre: **A.R.C. MELANY CUEVAS MANUEL**  
Cargo: **JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**  
Teléfono: **(336) 372 07 15, Ext.: 200**  
Correo electrónico: **supervision-obras@unca.edu.mx**

**DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO**

**OBRA CONCLUIDA**

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que involucran el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avanza	Fecha <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas						
		Obras de construcción	Equipamiento	Adquisición y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustantivo	Espacios físicos	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recapote (Acta final)	Acta Administrativa de Entrega-Recapote	Monto de Acta Administrativa			
																									Obra	Acta	Monto
1	TÉRMINACIÓN DE UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA (C.I.N.A.)	X				\$ 1,733,607.00	\$ 1,126,206.00	\$ 607,398.91	C.I.N.A.	1	547.42	Se continúa con el estado de paso avanzado; la instalación de equipos de aire acondicionado, calentador solar, gas estacionario, extractores y equipos de red (cableado, sensores y alarma), colocación de barandales metálicos, colocación de ductos y extractor para campanas.	suministro y colocación de cortinas y cortinas, suministro y aplicación de pintura en guarnición, suministro y colocación de luminaria (punto, base de concreto y lampara solar)	97%	08/06/20	01/10/20		NO	-	-	NO	NO	\$0.00				
									TOTAL	1	547.42																
2	EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA (C.I.N.A.)	X				\$ 4,447,001.00	\$ -	\$ 4,447,001.00	MOBILIARIO Y EQUIPO	189	PIEZAS	-					GLOBAL DEL PROYECTO	0%	-	-	El expediente se encuentra en revisión por el Comité de Adquisiciones del Estado de Coahuila.	NO	-	-	NO	NO	\$0.00
									TOTAL	189	PIEZAS	8.80															
3	TÉRMINACIÓN DE UN EDIFICIO PARA AULAS DE DOS NIVELES CON ANEXO SANITARIO EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.	X				\$ 3,902,899.00	\$ 1,124,624.96	\$ 2,828,274.04	AULAS Y ANEXO SANITARIO	1	646.16	Se realizó el colado del firme, la fabricación de muros de bloques, espartales, carp, tanque, chubasco de cable raso, colocación de laveta, acople en baños, salidas fibre ópticas, salidas eléctricas y red, pintura, etc.	Continuar con la aplicación de pintura, instalación de muebles de baño, manjares en sanitarios, instalación de tracción, hidroneumático, colocación de luminarias interiores, etc.	81%	08/06/20	14/10/20		NO	-	-	NO	NO	\$0.00				
									TOTAL	1	646.16																
4	EQUIPAMIENTO Y REEMPLAZO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.	X				\$ 1,304,198.00	\$ -	\$ 1,304,198.00	EQUIPAMIENTO	13	EDIFICIOS	-					GLOBAL DEL PROYECTO	0%	-	-	El expediente se encuentra en revisión por el Comité de Adquisiciones del Estado de Coahuila.	NO	-	-	NO	NO	\$0.00
									TOTAL	13	EDIFICIOS	8.80															
5	ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA DE TRABAJO DEL TALLER DE ALIMENTOS Y DEL LABORATORIO DE FARMACOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.	X				\$ 602,246.00	\$ 148,571.05	\$ 453,674.95	ADECUACIÓN EN TALLER DE ALIMENTOS Y FARMACOLOGÍA	1	277.00	se realizó la colocación del fono plátano, red y colocación de tuberías en T de Alambra; Colocación de Panel, salidas eléctricas, salidas de gas y colocación de luz en piso del Lab. de Farmacología.	Continuar con la colocación de la construcción de canchales de gas, el suministro e instalación de aire acondicionado, colocación de ductos y flexos para gas rotura mesas de trabajo.	50%	07/09/20	01/11/20		NO	-	-	NO	NO	\$0.00				
									TOTAL	1	277.00																
						<b>\$12,823,842.00</b>	<b>\$2,398,404.91</b>	<b>\$9,646,537.90</b>																			

Elisela Blandina T. de  
**UNCA**  
Nombre y firma del Titular de la IES

DR. MOORESTO MARTÍNEZ LÓPEZ  
Nombre y firma del Titular de la IES

**UNCA**  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES



2020

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**Jul-sep/2020**  
FECHA DE ORITE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance

97

PRIMORDIAL 1 Nombre de la obra: **TÉRMINACION DE UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA (C.I.N.A)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlán- San Antonio Nanahuatipán Km. 1.7; Paraje Tilacuatitla, Teotitlán de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1. TANQUE ESTACIONARIO Y CALENTADOR SOLAR



F2. EXTRACTOR PARA CAMPANA

Comentarios de los trabajos realizados:



F3. CORTINAS



F4. PATIO DE MANOBRAS



F5. REDUCTORES PARA CAMPANA Y VENTILACIÓN

PROF. RICARDO BEANA VAZQUEZ  
Nombre y firma del Titular de la IES

PROF. MELANY CORTES SÁNCHEZ  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES



Se recomienda que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una postafila, se podrán copiar tantas postafilas como sea necesario.  
Por otro lado, en el momento de mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

Universidad de la Cañada

RECTORÍA

Universidad de la Cañada  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,  
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2020

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**jul-sep/2020**

FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

0

PRIMORDIAL 2 Nombre de la obra:

**EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA (C.I.N.A.)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nahuatipan Km. 1.7, Paraje Tlilacuatilla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS

El expediente se encuentra en revisión por el Comité de Adquisiciones del Estado de Oaxaca.

El expediente se encuentra en revisión por el Comité de Adquisiciones del Estado de Oaxaca.

Comentarios de los trabajos realizados:



F1

DR. MOJIBTO SEANA VAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES



F2

F4



*[Handwritten signature]*

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES



Es importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pastafila, se podrán copiar tantas pastafilas como sea necesario. Derivado de ello, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

Universidad de la Cañada  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,  
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Universidad de la Cañada  
RECTORÍA



2019

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA


Mes reportado  
**jul- sep/2020**  
FECHA DE CORTE: 10/09/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIMORDIAL 3

Nombre de la obra: **TERMINACIÓN DE UN EDIFICIO PARA AULAS DE DOS NIVELES CON ANEXO SANITARIO EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

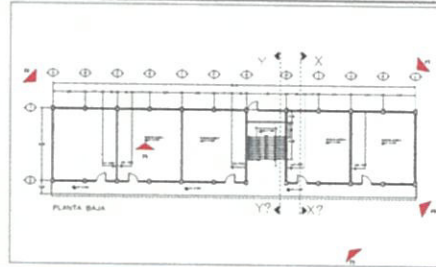

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7; Paraje Tiltacustilla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.



Porcentaje de avance

**81**

FOTOS



F1: INTERIOR DE AULA



F2: PERSPECTIVA PONIENTE

Comentarios de los trabajos realizados:



F3: PERSPECTIVA ORIENTE



F4: PERSPECTIVA FACHADA



F5: OBRA EN PERSPECTIVA SUR

DR. MICHÉLE ROSA VÁSQUEZ  
Nombre y firma del Titular de la IES

ARIQ. MELANY CUEVAS MANUEL  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES



Universidad de la Cañada

RECTORÍA

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

Universidad de la Cañada  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,  
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2019

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**Jul-sep/2020**  
FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance  
**0**

PRIMORDIAL 4 Nombre de la obra: **EQUIPAMIENTO Y REEMPLAZO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO  
Carretera Tecitlán- San Antonio Nahuatpan Km. 1.7, Paraje Titlacuililla, Tecitlán de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS

*El expediente se encuentra en revisión por el Comité de Adquisiciones del Estado de Oaxaca.*

*El expediente se encuentra en revisión por el Comité de Adquisiciones del Estado de Oaxaca.*

Comentarios de los trabajos realizados:



DR. MODESTO SERRANO VILLALBA  
Nombre y firma del Titular de la IES

ARQ. DELANTONIANO MANUEL  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.





2019

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**jul-sep/2020**  
FECHA DE CORTE: 16/09/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance  
**50**

PRIMARIDAD 5 Nombre de la obra:

**ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA DE TRABAJO DEL TALLER DE ALIMENTOS Y DEL LABORATORIO DE FARMACOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.**

ESQUEMAS DE LOCALIZACIÓN

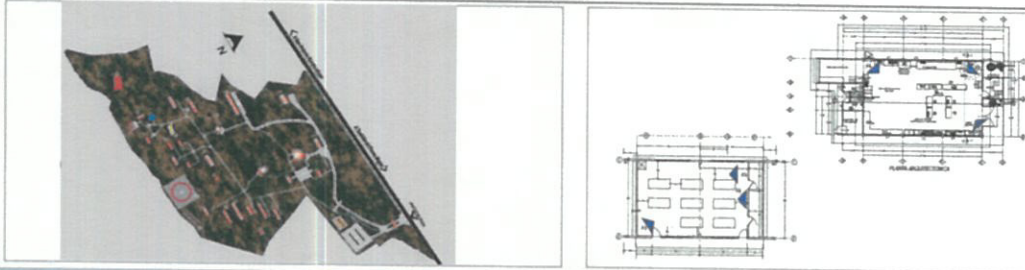

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Tecuilán- San Antonio Nanahuatipán Km. 1.7; Paraje Titlacuatilla, Tecuilán de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1. INSTALACION ELECTRICA Y DE GAS, LAB. DE INVESTIGACION



F2. PISO DE LOSETA, LAB. DE INVESTIGACION

Comentarios de los trabajos realizados:



F3. FALSO PLAFONDO, LAB. DE INVESTIGACION



F4. INSTALACION ELECTRICA, TALLER DE ALIMENTOS



F5. FALSO PLAFONDO, TALLER DE ALIMENTOS

DR. ROBERTO BEARA VAZQUEZ  
Nombre y firma del Titular de la IES

ING. MELANY CUEVAS MANUEL  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

