

Área:	Vice-Rectoría de Administración.
Oficio No.:	VRAD/E/005/2021.
Asunto:	Informe trimestral del FAM 2020.

Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca; a 08 de enero de 2021.

**DOCTORA**  
**CARMEN ENEDINA RODRÍGUEZ ARMENTA**  
DIRECTORA GENERAL DE  
EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
P R E S E N T E:

En atención al oficio número: 511/2020.-0854-38 de fecha 13 de febrero de 2020 y según el Tercer Comunicado a Universidades Públicas Estatales, Universidades Públicas Estatales de Apoyo Solidario y Universidades Interculturales ante la contingencia del virus SARS Covid 19; por este conducto me permito enviarle el informe de avance correspondiente al trimestre octubre-diciembre, con fecha corte 31 de diciembre 2020, de las obras apoyadas a través del Fondo de Aportaciones Múltiples del ejercicio 2020 (anexo CD con información magnética).

Por lo antes expuesto, remito a usted el reporte actualizado en archivo electrónico formato Excel y de manera electrónica a los correos [rocioc@nube.sep.gob.mx](mailto:rocioc@nube.sep.gob.mx), [cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx](mailto:cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx) y [jcarlosv@nube.sep.gob.mx](mailto:jcarlosv@nube.sep.gob.mx)

Sin otro particular, le reitero mi distinguida consideración.

**ATENTAMENTE**

*"praeteritum noscere, posterum molior"*

L.C.E. ~~ALFONSO~~ MARTÍNEZ LÓPEZ  
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Universidad de la Cañada

VICE-RECTORÍA DE  
ADMINISTRACIÓN

C.c.p.- DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ.- Rector de la Universidad de la Cañada.- Para su superior conocimiento.  
DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARAZ.- Director de Fortalecimiento Institucional.- Para su conocimiento.  
Archivo.

2020

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:  
**oct-dic/2020**  
FECHA DE CORTE: 31/12/2020

**REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL**

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad de la Cañada  
Entidad federativa: Oaxaca  
Clave Inst: 23MSU002V

Paración  
Nombre: L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ  
Cargo: VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
Teléfono: (238) 372 07 15, Ext. 200  
Correo electrónico: vica\_rplh@unca.edu.mx

RESPONSABLES

Otros y Mantenimiento  
Nombre: ANQ. MELANY CUEVAS MANUEL  
Cargo: JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO  
Teléfono: (238) 372 07 15, Ext. 208  
Correo electrónico: supervisión-otras@unca.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Cuenta con Actas							
		Otras de construcción	Equipamiento	Adquisición y registro	Mantenimiento	Proyecto sustantivo				Espacios físicos	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con libro del evento?	¿Quem y cuándo inauguró?	Entrega Recepción (Acta Freyjufo)	Acta Administrativa de Entrega Recepción	Monto de Acta Administrativa			
1	TÉRMINACION DE UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA (C.I.N.A.)	X					\$ 1,733,807.00	\$ 1,733,807.00	\$ -	C.I.N.A.	1	547.42	suministro y colocación de cortinas y cortineros, suministro y aplicación de pintura en guarnición, suministro y colocación de luminaria (poste, base de concreto y lampara solar)		100%	08/06/20	01/10/20	Obras concluidas.	NO	-	-	SI	SI	\$1,733,807.00			
										TOTAL	1	547.42															
2	EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA (C.I.N.A.)	X					\$ 4,447,201.00	\$ 2,247,142.94	\$ 2,199,958.06	MOBILIARIO Y EQUIPO	199	PIEZAS	Se realizó el pago del anticipo para fabricación de muebles.	Instalación de muebles y equipos.	50%	18/12/20	28/02/21	El recurso de comprometió en su totalidad el 31 de diciembre, sin embargo los tiempos de entrega de los muebles y equipos se considera a febrero del 2021. El importe restante se pagará una vez suministrados los muebles y equipos.	NO	-	-	NO	NO	\$0.00			
										TOTAL	199	PIEZAS	0.00														
3	TÉRMINACION DE UN EDIFICIO PARA AULAS DE DOS NIVELES CON ANEXO SANITARIO EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.	X					\$ 3,952,899.00	\$ 3,952,899.00	\$ -	AULAS Y ANEXO SANITARIO	1	646.10	Aplicación de pintura, instalación de muebles de baño, manoplas en sanitarios, instalación de frentes, Hidroneumático, colocación de luminarias estroboscópicas, etc.		100%	08/06/20	14/10/20	Obras concluidas.	SI	-	-	SI	SI	\$1,952,899.00			
										TOTAL	1	646.10															
4	EQUIPAMIENTO Y REEMPLAZO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.	X					\$ 1,206,984.07	\$ 504,160.03	\$ 702,824.04	EQUIPAMIENTO	13	EDIFICIOS	Se realizó el pago del anticipo	suministro de equipos.	46%	18/12/20	31/01/21	El recurso de comprometió en su totalidad el 31 de diciembre, sin embargo los tiempos de entrega de los equipos y se considera a enero del 2021. El importe restante se pagará una vez suministrados los equipos.	NO	-	-	NO	NO	\$0.00			
										TOTAL	13	EDIFICIOS	0.00														
5	ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA DE TRABAJO DEL TALLER DE ALIMENTOS Y DEL LABORATORIO DE FARMACOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.	X					\$ 602,246.00	\$ 602,246.00	\$ -	ADECUACIÓN EN TALLER DE ALIMENTOS Y FARMACOLOGÍA	1	277.00	Colocación de losetas, construcción de canteo de gases, el suministro e instalación de aire acondicionado, colocación de ductería y fileres para gas sobre mesas de trabajo.		100%	07/09/20	01/11/20	Obras concluidas.	SI	-	-	SI	SI	\$0.00			
										TOTAL	1	277.00															
							\$19,039,942.00	\$6,134,269.96	\$2,905,682.10																		

DR. MODERNO ESARA VAZQUEZ  
Nombre y firma del Titular de la EIS



Nombre y firma del Titular de Otros y Mantenimiento  
ANQ. MELANY CUEVAS MANUEL

1 Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anotar tanto filas como sea necesario.  
2 En esta sección se redacta de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se ven reflejados en el reporte fotográfico.  
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en día digital, día, mes y año.

UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA  
RECTORIA

UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO



2020



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mostrar  
oct-dic/2020  
FECHA DE CORTE: 31-12-2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

46

PROYECTO: 4 Nombre de la obra: **EQUIPAMIENTO Y REEMPLAZO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan-San Antonio Nahuatipan Km. 1.7; Paraje Titlacuatilla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS

F1: El recurso de comprometió en su totalidad al 31 de diciembre, sin embargo los tiempos de entrega de los equipos y se considera a enero del 2021. El importe restante se pagará una vez suministrados los equipos.

F2: El recurso de comprometió en su totalidad al 31 de diciembre, sin embargo los tiempos de entrega de los equipos y se considera a enero del 2021. El importe restante se pagará una vez suministrados los equipos.

Comentarios de los trabajos realizados:

F3: El recurso de comprometió en su totalidad al 31 de diciembre, sin embargo los tiempos de entrega de los equipos y se considera a enero del 2021. El importe restante se pagará una vez suministrados los equipos.

F4: El recurso de comprometió en su totalidad al 31 de diciembre, sin embargo los tiempos de entrega de los equipos y se considera a enero del 2021. El importe restante se pagará una vez suministrados los equipos.

F5: El recurso de comprometió en su totalidad al 31 de diciembre, sin embargo los tiempos de entrega de los equipos y se considera a enero del 2021. El importe restante se pagará una vez suministrados los equipos.

DR. MODERNO BEANA VAZQUEZ  
Nombre y firma del Titular de la IES



ARIQ. MELANY CUEVAS MANUEL  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES



\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una planilla para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la imagen para el antes, durante y después de la obra.

2020

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mostrando:  
oct-dic/2020

FECHA DE CDRTF: 31/12/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance


100

PRORIDAD 5

Nombre de la obra:

**ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA DE TRABAJO DEL TALLER DE ALIMENTOS Y DEL LABORATORIO DE FARMACOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.**

GRUPOS DE LOCALIZACIÓN

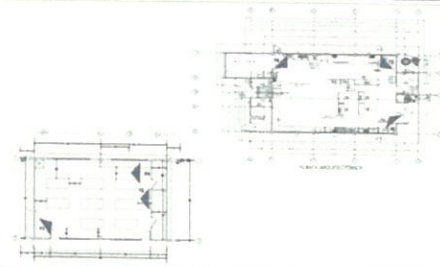

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlán-San Antonio Naranhuatipen Km. 1.7, Paraje Tlacuacatlá, Teotitlán de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: INSTALACION ELECTRICA Y DE GAS\_LAB. DE INVESTIGACION



F3: FALSO PLAFOND\_LAB. DE INVESTIGACION



F2: PISO DE LOSETA\_LAB. DE INVESTIGACION

Comentarios de los trabajos realizados:



INSTALACION ELECTRICA\_TALLER DE ALIMENTOS



FALSO PLAFOND\_TALLER DE ALIMENTOS

DRA. MODESTA ARIAS VAZQUEZ  
Nombre y Firma del Titular de la IES



AJO MELANY CUEVAS MANUEL  
Nombre y Firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES



\*Es muy importante que se envíe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa un formulario que podrá copiar y utilizar como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capturen fotografías antes, durante y después de la obra.

UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA  
RECTORIA

Universidad de la Cañada  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,  
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO



2020

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes: noviembre  
oct-dic/2020

FECHA DE CORTE: 31/12/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Universidad de la Cañada

Porcentaje de avance

100

PRECIOSIDAD 3 Nombre de la obra: **TERMINACIÓN DE UN EDIFICIO PARA AULAS DE DOS NIVELES CON ANEXO SANITARIO EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

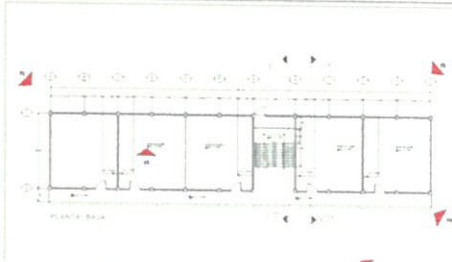

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlán-San Antonio Nahuatlipan Km. 1.7; Paraje Titlacuatitla, Teotitlán de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: PERSPECTIVA POSTERIOR



F2: PERSPECTIVA PONIENTE

Comentarios de los trabajos realizados:



F3: ÁREA DE ESCALERA



F4: PERSPECTIVA FACHADA




F5: SANITARIO

DR. MODISTO BEARA VAZQUEZ  
Nombre y firma del Titular de la IES

ARG. MELANCIÓFAS MANSUEL  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una planilla para copiar tanto el nombre de la obra como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma información antes, durante y después de la obra.



UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA  
RECTORIA



Universidad de la Cañada  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,  
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2020

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes: agosto  
oct-dic/2020

FECHA DE VIGENTE: 31/12/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance

100

PROYECTO 1

Nombre de la obra: **TÉRMINACIÓN DE UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA (C.I.N.A)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



PLANTA ARQUITECTÓNICA BAJA

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlán- San Antonio Nanahuatipén Km. 1.7; Paraje Tiliacuastilla, Teotitlán de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: Escalera helicoidal



F2: Sistema de red Wi-Fi

Comentarios de los trabajos realizados:



F3: Sistema de seguridad (alarmas y cámaras)



F4: Pasillo, instalación de red de fibra óptica, Aire acondicionado, carpetas y acabados.



F5: Fachada exterior del edificio

DR. MODERNO SEARA VAZQUEZ  
Nombre y firma del Titular de la IES



UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA  
RECTORIA

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES



Universidad de la Cañada  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,  
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña separada para cada una de ellas. En caso de ser necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adicciones, en especial, se recomienda que se capture la misma fotografía durante y después de la obra.



2020

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:  
oct-dic/2020

FECHA DE CORTE: 31/12/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance

50%

PRIORIDAD: 2 Nombre de la obra: **EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA (C.I.N.A.)**

CRONOGRAMA DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7; Paraje Titlacuatitla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS

El recurso de comprometió en su totalidad al 31 de diciembre, sin embargo los tiempos de entrega de los muebles y equipos se considera a febrero del 2021. El importe restante se pagará una vez suministrados los muebles y equipos.

El recurso de comprometió en su totalidad al 31 de diciembre, sin embargo los tiempos de entrega de los muebles y equipos se considera a febrero del 2021. El importe restante se pagará una vez suministrados los muebles y equipos.

Comentarios de los trabajos realizados:


El recurso de comprometió en su totalidad al 31 de diciembre, sin embargo los tiempos de entrega de los muebles y equipos se considera a febrero del 2021. El importe restante se pagará una vez suministrados los muebles y equipos.

El recurso de comprometió en su totalidad al 31 de diciembre, sin embargo los tiempos de entrega de los muebles y equipos se considera a febrero del 2021. El importe restante se pagará una vez suministrados los muebles y equipos.

El recurso de comprometió en su totalidad al 31 de diciembre, sin embargo los tiempos de entrega de los muebles y equipos se considera a febrero del 2021. El importe restante se pagará una vez suministrados los muebles y equipos.

DR. MARCELINO MÉNDEZ VAZQUEZ  
Rector y Titular de la IES

ARQ. MELANY DÁVILA SÁNCHEZ  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES



\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una planilla que se encuentra en el formato de anexos que se adjunta. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la información antes, durante y después de la obra.



Universidad de la Cañada  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,  
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
