



UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

Área:	Vice-Rectoría de Administración.
Oficio No.:	UNCA/VRAD/E-086/2022.
Asunto:	Informe trimestral del FAM 2021.

Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca; a 08 de abril de 2022.

DOCTOR

EDUARDO GERARDO ROSAS GONZÁLEZ

DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL "DGESUP"

P R E S E N T E:

En atención al oficio número: 511/2021.-0504-34 signado con fecha 16 de febrero de 2021 y por instrucciones del Dr. Modesto Seara Vázquez, Rector de la Universidad de la Cañada; por este conducto me permito remitirle el Informe de Avance de los proyectos apoyados a través del Fondo de Aportaciones Múltiples del ejercicio 2021, correspondiente al trimestre enero-marzo, con fecha corte 31 de marzo de 2022, debidamente requisitado y digitalizado en formato PDF con sus respectivos archivos en Excel.

Por lo antes expuesto, remito a usted el reporte actualizado en archivo electrónico formatos Excel y PDF a los correos: rocioc@nube.sep.gob.mx y cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx

Así mismo, se hace llegar las Actas de Finiquito y actas de Entrega-Recepción en los formatos correspondientes, de las obras No. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

"praeteritum noscere, posterum melior"

L.C.E. Alfonso Martínez López

Vice-Rector de Administración Universidad de la Cañada



**VICE-RECTORÍA DE
ADMINISTRACIÓN**

Con copia para:

DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ. - Rector de la Universidad de la Cañada.- Para su superior conocimiento.
DR. FRANCISCO LUCIANO CONCHEIRO BÓRQUEZ.- Subsecretario de Educación Superior.- Para su conocimiento.
DRA. CARMEN ENEDINA RODRÍGUEZ ARMENTA.- Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural "DGESUP".- Mismo fin.
M.A. MAGALY NICTEXA FIERRO MUÑOZ.- Representante Institucional UNCA.- Mismo fin.
ARQ. MELANY CUEVAS MANUEL.- Jefa del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento.- Mismo fin.
Archivo.

2021



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
ENE-MAR/2022
FECHA DE CORTE: 31/03/2022

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad de la Cañada**
Entidad federativa: **Oaxaca**
Clave Inst: 911-2002JAX032V

RESPONSABLES

Rectoría		Órgano de Mantenimiento	
Nombre:	L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ	Nombre:	ARQ. MELANY CUEVA BARRIEL
Cargo:	VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN	Cargo:	JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
Teléfono:	(231) 372 07 15, Ext.: 200	Teléfono:	(231) 372 07 15, Ext.: 200
Correo electrónico:	vice_admin@unca.edu.mx	Correo electrónico:	supervisor-obras@unca.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Cuenta con Actas																		
		Obras de consultoría	Equipamiento	Adquisición y entrega	Mantenimiento				Proyecto sustantivo	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa													
1	TERMINACIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA X UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.					\$ 2,771,500.00	\$ 2,771,500.00	\$ -	ÁREA DE JUEGOS	1	510.00	CONTRAFLEABEOS, CONTRAVIENTO S, CANAL FLUVIAL, LAMPARA MULTITECHO, CISTERNA DE ALMACEN FLUVIAL Y PRIMERA ETAPA DE BAÑOS VESTIDORES.	100%	16/08/21	23/11/21	OBRA CONCLUIDA.	NO, AUN FALTA LA TERMINACIÓN DE LOS BANCOS-VESTIDORES.	-	-	SI	SI	\$ 2,771,500.00															
		ÁREA DE SEGURIDAD USRE DE OBSTACULOS	1	102.00																																	
		ÁREA DE GRADOS O ESPECTADORES	1	63.00																																	
		AFSA DE BANCO DE JUGADORES Y MESA DE CONTROL	1	35.00																																	
TOTAL									4	710.00																											
2	REEMPLAZO DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS TECNOLOGÍA LED EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.		X			\$ 390,124.05	\$ 390,124.05	\$ -	ESPACIO EDUCATIVOS	12 EDIFICIOS	0.00	SUMINISTRO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS	100%	15/12/21	09/02/22	CONCLUIDO.	NO, UNA VEZ SUMINISTRADOS LOS BIENES FALTA LA INSTALACIÓN DE LOS MISMOS.	-	-	SI	SI	\$ 390,124.05															
		TOTAL									12 EDIFICIOS												0.00														
				X						\$ 98,557.95	\$ 98,557.95												\$ -	ESPACIO EDUCATIVOS	4 EDIFICIOS	0.00	SUMINISTRO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS	100%	28/12/21	06/01/22	CONCLUIDO.	NO, UNA VEZ SUMINISTRADOS LOS BIENES FALTA LA INSTALACIÓN DE LOS MISMOS.	-	-	SI	SI	\$ 98,557.95
		TOTAL																						4 EDIFICIOS	0.00												
		X			\$ 651,827.70	\$ 651,827.70	\$ -	ALAS Y AUDITORIO	2 EDIFICIOS			0.00	INSTALACIÓN DE EQUIPOS	100%	08/12/21	16/12/21	OBRA CONCLUIDA.	SI	-	-	SI	SI		\$ 651,827.70													
TOTAL									2 EDIFICIOS			0.00																									
		X						\$ 140,205.25	\$ 140,205.25	\$ -	TUBO PVC CONDUC	68 PIEZAS											0.00		SUMINISTRO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS	100%	07/12/21	08/12/21	OBRA CONCLUIDA.	SI	-	-	SI	SI	\$ 140,205.25		
											INTERFLECTORES	2																									
					RELOCACIÓN DE ESCALONERA	1																															
TOTAL											68 PIEZAS	0.00																									
4	ADECUACIÓN Y MEJORA DEL AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.			X		\$ 209,029.00	\$ 209,029.00	\$ -	ADECUACION	1 EDIFICIO	0.00	FORMADO DE ESCALÓN Y COLADO DEL MISMO, REUBICACIÓN DE SILLAS EXISTENTES Y NUEVAS, PINTURA EN ESCALONES Y COLOCACIÓN DE ALFOMERA	100%	20/09/21	14/11/21	OBRA CONCLUIDA.	NO, SOLO SE TRATA DE LA ADECUACIÓN DE UN EDIFICIO EXISTENTE.	-	-	SI	SI	\$ 209,029.00															
		TOTAL									1 EDIFICIO												0.00														

2021

AÑO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
ENE-MAR/2022
FECHA DE CORTE: 31/03/2022

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad de la Cañada**

Entidad federativa: **Oaxaca**

Código Inst 011 20MSU0032V

RESPONSABLES

Plaza: **Nombre: L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ**
Cargo: VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Teléfono: (238) 372 07 15, Ext. 204
Correo electrónico: vice_admin@unca.edu.mx

Plaza: **Nombre: ARO. MELANY CUEVAS MANUEL**
Cargo: JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
Teléfono: (238) 372 07 15, Ext. 204
Correo electrónico: superint@unca.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO


OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada					
		Obras de conservación	Equipamiento	Adquisiciones y mejoras	Mantenimiento				Proyectos sustantivos	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Cuenta con Actas		
																						Entrega- Recepción (Acta friquito)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa
5	EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.	X				\$ 343,335.68	\$ 343,335.68	\$ -	BIBLIOTECA	1	EDIFICIO	-	INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE LAS MESAS	100%	05/11/21	04/12/21	OBRA CONCLUIDA.	SI	-	-	SI	SI	\$343,335.68	
									TOTAL	1	EDIFICIO	0.00												
6	AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.		X			\$ 4,223,000.00	\$ 4,223,000.00	\$ -	SALA DE LECTURA PLANTA BAJA	1	140.00		MUIROS DE TAPIQUE EN SEGUNDO NIVEL ESTRUCTURA DE ACERO EN AZOBEA CON MUYLTY TECHO Y ACABADOS.	100%	23/08/21	28/02/22	OBRA CONCLUIDA.	SI	-	-	SI	SI	\$4,223,000.00	
									SALA DE LECTURA PLANTA ALTA	1	160.00													
									AREA DE ESCALERAS	1	10.00													
									PANILLO DE INTERCONEXION	1	10.00													
									TOTAL	1	325.00													
7	CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA			X		\$ 4,597,651.24	\$ 4,597,651.24	\$ -	CUARTO DE INVERSORES	1	13.33		INSTALACION DE ESTRUCTURA, MODULOS FOTOVOLTAICO S Y CERCADO.	100%	01/10/21	22/01/22	OBRA CONCLUIDA.	SI	-	-	SI	SI	\$4,597,651.24	
									JARDIN SOLAR	1	892.00													
									TOTAL	2	895.33													
						\$13,516,330.00	\$13,016,330.00	\$0.00																

EN: MOJESTO SEARA VAZQUEZ
Nombre y firma del Titular de la IES

ARO. MELANY CUEVAS MANUEL
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1. Se cubrirán los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrá anexar tanta fotos como sea necesario.
2. En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3. Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todos los datos dadas en mm y aa.



Universidad de la Cañada
RECTORÍA



Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2021

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
ENE-MAR/2022
FECHA DE CORTE: 31/03/2022

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad de la Cañada



Porcentaje de avance

100%

PRICIDAD **1**

Nombre de la obra: **TERMINACIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

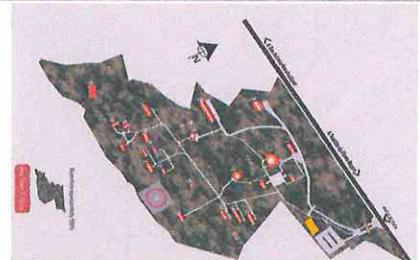

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlán- San Antonio Nanahuatipán Km. 1.7; Paraje Tiliacuatiita, Teotitlán de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: BAÑOS VESTIDORES 1A ETAPA



F2: OBRA CONCLUIDA

Comentarios de los trabajos realizados:



F3: OBRA CONCLUIDA



F4: OBRA CONCLUIDA



F5: OBRA CONCLUIDA

DR. MODESTO SEGAZ RODRIGUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES

ARON MELANDEZUEVAS MANUEL

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una foto de cada una de las etapas de la obra, como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma antes, durante y después de la obra.

Universidad de la Cañada

RECTORÍA

Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2021

ASU

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
ENE-MAR/2022
FECHA DE CORTE: 31/03/2022

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad de la Cañada

Porcentaje de avance

100%



PRIORIDAD

2

Nombre de la obra:

REEMPLAZO DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS TECNOLOGÍA LED EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.

GROUPO DE LOCALIZACIÓN

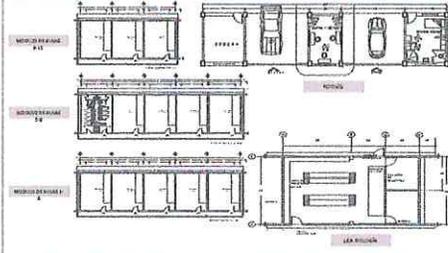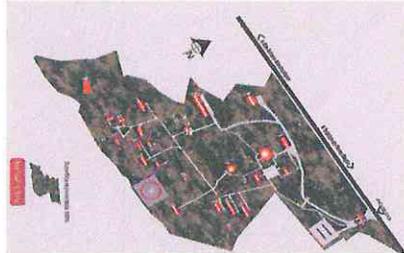

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlán- San Antonio Nanahuatipán Km. 1.7; Paraje Tiliacuautla, Teotitlán de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: INSTALACION DE LAMPARAS EN VICE-RECTORIA DE ADMON.



F2: INSTALACION DE LAMPARAS EN AULAS

Comentarios de los trabajos realizados:



F3: SURABASTRO DE LAMPARAS



F4: SURABASTRO DE LAMPARAS



F5: SURABASTRO DE LAMPARAS

DR. MOCTEZUMA GARCIA VAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES

DR. MELANY CLEVAS MANUEL

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexa reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrá capturar una o varias fotos, según sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y punto de vista antes, durante y después de la obra.

2021

AVO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
ENE-MAR/2022

FECHA DE CORTE: 31/03/2022

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



PRIORIDAD

3

Nombre de la obra:

EQUIPAMIENTO DE AULAS GENERALES, INTERACTIVA Y AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

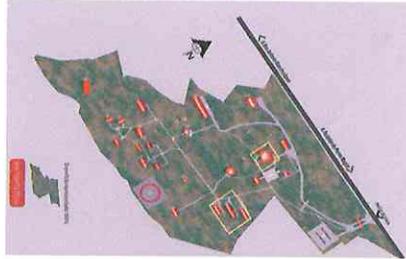

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7; Paraje Titlacuatitla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.




Universidad de la Cañada

Porcentaje de avance

100%

FOTOS

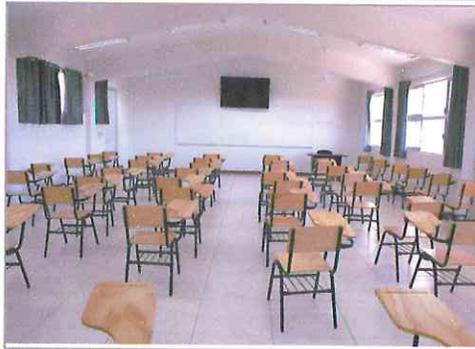

F1: SMART TV EN AULAS



F2: SMART TV EN AULAS

Comentarios de los trabajos realizados:



F3: PROYECTOR EN AUDITORIO



F4: PROYECTOR EN AUDITORIO



F5: PROYECTOR EN AUDITORIO

DR. MOCESTO SEARA MARQUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES

DR. MELCHOR CUEVAS MANUEL

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pegatina, en especial; se recomienda que se capture la misma en los lugares como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma en los lugares para el antes, durante y después de la obra.

Universidad de la Cañada
RECTORÍA

Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2021

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA



Mes reportado
ENE-MAR/2022

FECHA DE CORTE: 31/03/2022

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Procedimiento **4** Nombre de la obra: **ADECUACIÓN Y MEJORA DEL AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

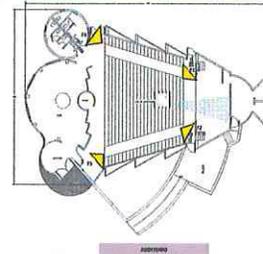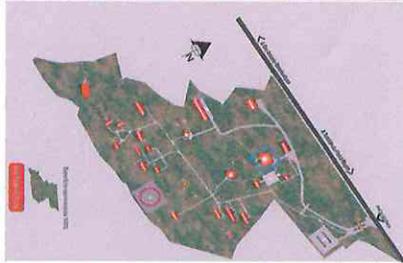

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nahuatlapan Km. 1.7; Paraje Tillacuattila, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.



Porcentaje de avance

100%

FOTOS



F1. MONTAJE DE BUTACAS



F2. MONTAJE DE BUTACAS


Comentarios de los trabajos realizados:



F3. MONTAJE DE BUTACAS



F4. MONTAJE DE BUTACAS

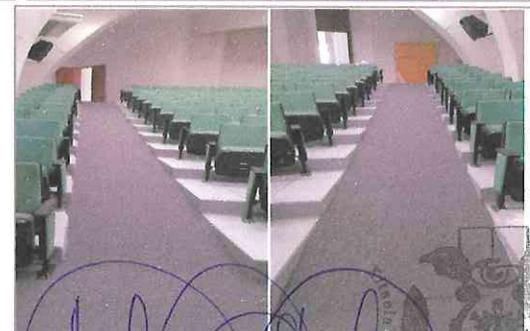

F5. MONTAJE DE BUTACAS

DR. MODESTO GERRA VAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES

ARQ. MELANY CUEVAS MANUEL

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestanía, se podrán copiar tantas pestanías como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adicciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

Universidad de la Cañada
RECTORÍA

Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2021

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
ENE-MAR/2022

FECHA DE CORTE: 31/03/2022

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Universidad de la Cañada

Porcentaje de avance

100%

PRORIDAD: **5** Nombre de la obra: **EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

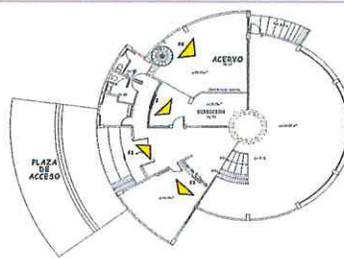

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7; Paraje Tiliacuatlilla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: SUMINISTRO DE SILLAS



F2: SUMINISTRO DE SILLAS


Comentarios de los trabajos realizados:



F3: SUMINISTRO DE MESAS DE TRABAJO



F4: SUMINISTRO DE MESAS DE TRABAJO

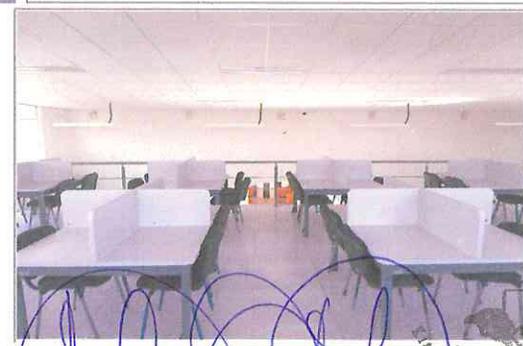

F5: SUMINISTRO DE MESAS DE TRABAJO

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES

ARG. MELMY CUEVAS MANUEL

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una fotografía de cada una de las etapas de la obra, así como se anexa una fotografía de cada una de las etapas de la obra, así como se anexa una fotografía de cada una de las etapas de la obra, así como se anexa una fotografía de cada una de las etapas de la obra.

Universidad de la Cañada

RECTORÍA

Universidad de la Cañada

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2021

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
ENE-MAR/2022
FECHA DE CORTE: 31/03/2022

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad de la Cañada

Porcentaje de avance


100%

PRIOCRIDAD

6

Nombre de la obra: **AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.**

GROQUIS DE LOCALIZACIÓN

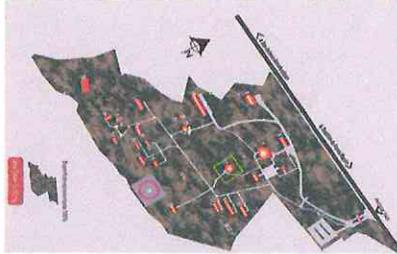

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7, Paraje Tiliacuatlla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: FACHADA NORTE



F2: PERSPECTIVA

Comentarios de los trabajos realizados:



F3: PERSPECTIVA



F4: FACHADA PONIENTE




DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES



ARO MELANY GUEVAS MANUEL

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

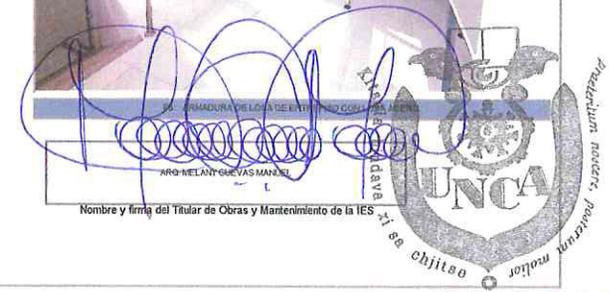

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña con fotos de las obras, en especial, se recomienda que se capture la misma toma antes, durante y después de la obra.

Universidad de la Cañada

RECTORÍA

Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2021

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
ENE-MAR/2022
FECHA DE CORTE: 31/03/2022

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad de la Cañada



Porcentaje de avance

100%

PRECIOSAS 7

Nombre de la obra: **CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA**


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nahuatipán Km. 17, Paraje Tlacualtitla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS

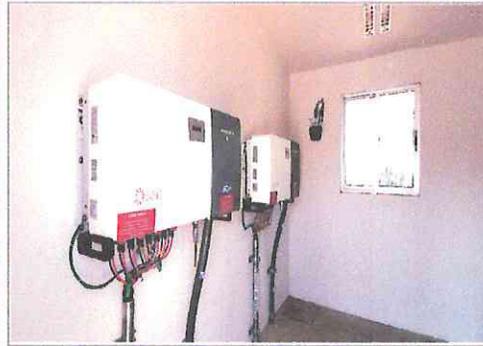


F1: CABETA DE INVERSORES




F2: ÁREA DE JARDÍN SOLAR

Comentarios de los trabajos realizados:

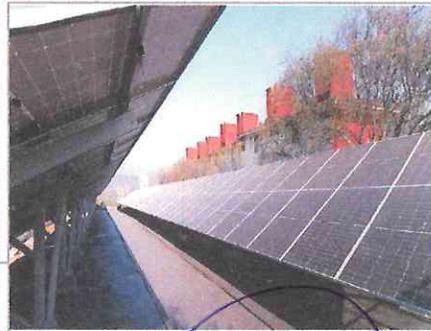

F3: ESTRUCTURA

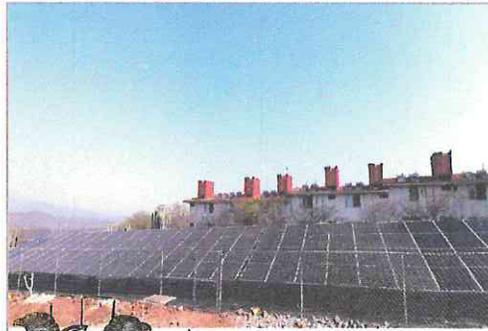

F4: ÁREA DE JARDÍN SOLAR



F5: VISTA ÁREA DE JARDÍN SOLAR

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES

PRO. MELANI CLEVIS MARQUEL

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una fotografía para el equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma en tres momentos: antes, durante y después de la obra.



UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

HOJA No. 1

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

"TERMINACIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA."

OBRA	TERMINACIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.	ESTADO	020 OAXACA
NOMBRE DE ESCUELA	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	NUM. DE OBRA	FAM-IES/0324/210863/2021
LOCALIDAD	0001 TEOTITLAN DE FLORES MAGON	PROGRAMA	127- INCREMENTO A LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR
MUNICIPIO	543 TEOTITLAN DE FLORES MAGON	SUBPROGRAMA	01 CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR
REGION	01 CAÑADA	MODALIDAD	CONTRATO DE OBRA PUBLICA
FECHA DE INICIO	16 de agosto de 2021	FUENTE	E RECURSO FEDERALES
FECHA DE TÉRMINO	23 de noviembre de 2021	RAMO	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
		FONDO	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES - EDUCATIVA SUPERIOR CAPITAL, FAM IES CAPITAL, EJERCICIO 2021

EN LA CIUDAD DE TEOTITLAN DE FLORES MAGON, OAX. A LAS 10:00 HRS. DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2021. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN ABAJO MENCIONADA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA	
AMPLIACIÓN	
REPARACIÓN	
TERMINACIÓN	X
EQUIPO Y MOBILIARIO	

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA					
A	L	T	A	L	O
AULAS	LABORATORIO	TALLER	ANEXOS	ADAPTACIONES LOCALES	OTROS CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
					X

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: "TERMINACIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA."

LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE 710 M2, CONSTA DEL SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ARMADURAS PARA TECHADO DE ACERO A BASE DE PERFILES PRT DE DIFERENTES PULGADAS Y CALIBRES 14, 12 Y 11 RESPECTIVAMENTE, CONEXIONES DE TENSORES, LARGUEROS, MONTANTES, CONTRAFLAMBEOS, CONTRAVIENTOS, SOLDADURA, COLOCACIÓN DE LÁMINA MULTIPANEL DE 1 1/2 CALIBRE 26/26; INCLUYE CABALLETES, CANALONES, MATERIAL DE FIJACIÓN Y MISCELÁNEOS; PINTURA EN TODO ELEMENTO DE ACERO A BASE DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, ESMALTE 100, SUMINISTRO DE CISTERNA Y BAÑOS VESTIDORES EN OBRA GRIS. LOS TRABAJOS ABARCAN EL ÁREA DE JUEGOS (ACABADOS, HERRERÍA) CON 510 M2, ÁREA DE SEGURIDAD LIBRE DE OBSTACULOS (ACABADOS, HERRERÍA) CON 102 M2, ÁREA DE GRADAS O ESPECTADORES (ACABADOS, HERRERÍA) CON 63 M2, ÁREA DE BANCO DE JUGADORES Y MESA DE CONTROL (ACABADOS, HERRERÍA) CON 35 M2, BAÑOS VESTIDORES (CIMENTACION, ESTRUCTURAS, ALBAÑILERÍA) CON 77 M2.

AREA CONSTRUIDA:	787 M ²	INVERSIÓN EJERCIDA	\$	2,771,590.00
EDIFICIOS:	M ²	CONSTRUCCIÓN:	\$	2,771,590.00
PAVIMENTOS:	M ²	MOB. Y EQUIPO:	\$	
OTROS:	M ²			
SUP. TERRENO:	M ²			

SERVICIOS MUNICIPALES
 EL EDIFICIO SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:
 AGUA DRENAJE ELECTRIFICACIÓN

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACIÓN



Universidad de la Cañada

HOJA No. 3

NUM. DE OBRA

FAM-IES/0324/210863/2021

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA Y ACTO SEGUIDO LA EMPRESA ARGUTSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. , REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ARQ. JOSÉ ASUNCIÓN ARIAS GUTIÉRREZ EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, HACE ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ, VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.

1.- OBRA CIVIL	_____	1.1. EDIFICACIÓN	_____	100%
2. MOBILIARIO	_____	1.2 OBRA EXTERIOR	_____	_____
3.-EQUIPO	_____			
3.-REPARACIÓN	_____			

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

ENTREGA POR LA CONTRATISTA
ARGUTSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CALLE SANTA ANA #117 DEL COL. SAN JOSE LA HUERA
C.A. 52000
AVANCA DE JUAN P. GONZALEZ
R.F.C. ARGUTSA03
CALLE 15 DE SEPTIEMBRE #100
C.A. 52000
REGISTRADO EN EL REGISTRO PUBLICO
DE EMPRESAS DE C.V. EN EL ESTADO DE QUERETARO
C.F. 10/2010

RECIBE POR LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

FIRMA _____

NOMBRE: ARQ. JOSÉ ASUNCIÓN ARIAS GUTIERREZ

CARGO: Administrador Único de la Empresa:
ARGUTSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

FIRMA _____

NOMBRE: L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ

CARGO: VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION UNCA
REPRESENTANTE LEGAL



TESTIGOS:

POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

FIRMA _____

NOMBRE: _____

CARGO: _____

POR LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

FIRMA _____

NOMBRE: ARQ. MELANY CUEVAS MANUEL

CARGO: JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA UNCA

FIRMA _____

NOMBRE: CP. CLAUDIA ARELI SANTIAGO DELGADO

CARGO: JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA
UNCA

OBSERVACIONES:
NINGUNA



UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Clave interna de identificación de la obra: **FAM-IES/0324/210863/2021**

Siendo las 10:00 hrs del día 23 del mes de noviembre del año 2021, se reunieron los CC. LCE. Alfonso Martínez López, Vice-Rector de Administración de la Universidad de la Cañada y el Arq. José Asunción Arías Gutierrez, Administrador Unico de la empresa Constructora ARGUTSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. en la sede de la obra abajo descrita, a fin de constatar lo siguiente:



DATOS GENERALES DE LA OBRA

Descripción de la Obra	Clave interna de Identificación de la Obra	Modalidad de Ejecución		Fecha de:	
		Administración Directa	Licitación/ Concurso	Inicio de la Obra	Términación de la Obra
"TERMINACIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA."	FAM-IES/0324/210863/2021		X	16-ago-21	23-nov-21

Obra de continuidad	SI (X)	NO ()
Etapas Número	2 (DOS)	

SEDE DE LA OBRA

Dirección postal	Localidad, Población o Ciudad	Municipio	Clave y nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus
Universidad de la Cañada, Carretera Teotitlán-San Antonio Nanahuatipan Km 1.7, Paraje Titlacuatitla	Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	20ESU3009F	Universidad de la Cañada	Universidad de la Cañada




ARGUTSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
 CALLE 18 N° 113, COL. SAN ANTONIO
 C.P. 62420, TEOITILÁN DE FLORES MAGÓN,
 PUEBLA, PUE. TEL. (01) 221 411 6255 FAX (01) 221 411 6255
 TELCEL 95112206675 www.argutsa.com



Universidad de la Cañada

UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN


Clave interna de identificación de la obra: FAM-IES/0324/210863/2021

TRABAJO EJECUTADO	
Construcción, nueva obra (terminación)	
Remodelación/Adecuación/Ampliación	X

NÚMERO DE ESPACIOS QUE INCLUYE LA OBRA	
Descripción	Número
Aulas/Salones	
Talleres	
Laboratorios	
Cubículos	
Bibliotecas	
Auditorios	
C. de Cómputo	
C. de Lenguas	
Aulas Magnas/Usos Múltiples	
Oficinas administrativas	
Áreas comunes	X
Otros	

RECURSOS FAM	
A) Obra apoyada una sola vez	
Año de financiamiento	2021
Monto aportado por el FAM	2,771,590
Monto total ejercido del FAM	2,771,590
Remanente	0
Costo total de la Obra	2,771,590
B) Obra apoyada en más de un ejercicio	
Año	Monto
2014	
2015	
2016	
2017	
2018	1,620,282.96
2019	
Total aportado por FAM	4,391,872.96
Costo total de la Obra	4,391,872.96
Total metros cuadrados de la obra	787 M²

Los asistentes proceden a hacer un recorrido por la obra mencionada y acto seguido el Arq. José Asunción Arías Gutierrez hace entrega de la misma al L.C.E. Alfonso Martínez López, Vice-Rector de Administración de la Universidad de la Cañada, quien recibe a entera satisfacción, firmando al calce para constancia



Entrega
<p>ARQ. JOSÉ ASUNCIÓN ARÍAS GUTIERREZ Administrador Unico de la Empresa: ARGUTSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.</p>

Recibe
<p>L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ Vice-Rector de Administración de la Universidad de la Cañada</p>

Testigo
<p>ARQ. MELANY CUEVAS MANUEL Jefe de Depto. de Proyectos, Construcción y Mantenimiento de la Universidad de la Cañada.</p>

Universidad de la Cañada
VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN



UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Clave interna de identificación de la obra:

FAM-IES/0864/211892/2021
FAM-IES/1441/212750/2021

Siendo las 16:00 hrs del día 09 de febrero del año 2022, se reunieron los CC. LCE. Alfonso Martínez López, Vice-Rector de Administración de la Universidad de la Cañada; Dra. Margarita Bernabé Pineda, Vice-Rectora Académica; C.P. Jaime Rodolfo Reyes Toscano, Auditor Interno; M.A. Shirley Merino Pérez, Jefa del Departamento de Recursos Materiales; en la sede de la obra abajo descrita, a fin de constatar lo siguiente:

DATOS GENERALES DE LA OBRA					
Descripción de la Obra	Clave interna de Identificación de la Obra	Modalidad de Ejecución		Fecha de:	
		Administración Directa	Licitación/ Concurso	Inicio de la Obra	Términación de la Obra
REEMPLAZO DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS TECNOLOGÍA LED EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	FAM-IES/0864/211892/2021 FAM-IES/1441/212750/2021	X	X	15-dic-21	09-feb-22

Obra de continuidad	SI ()	NO (X)
Etapas Número	UNO	

SEDE DE LA OBRA					
Dirección postal	Localidad, Población o Ciudad	Municipio	Clave y nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus
Universidad de la Cañada, Carretera Teotitlán-San Antonio Nanahuatipan Km 1.7, Paraje Titlacuatitla	Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	20ESU3009F	Universidad de la Cañada	Universidad de la Cañada



UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Clave interna de identificación de la obra:

FAM-IES/0864/211892/2021
FAM-IES/1441/212750/2021

Table with 2 columns: TRABAJO EJECUTADO, Equipamiento, Remodelación/Adecuación/Ampliación

Table with 2 columns: NÚMERO DE ESPACIOS QUE INCLUYE LA OBRA, Descripción, Número

Table with 2 columns: RECURSOS FAM, A) Obra apoyada una sola vez, B) Obra apoyada en más de un ejercicio

Los asistentes proceden a hacer un recorrido por la obra mencionada y acto seguido el L.C.E. Alfonso Martínez López, Vice-Rector de Administración; hace entrega de la misma a la CC. Dra. Margarita Bernabé Pineda, Vice-Rectora Académica, quien recibe a entera satisfacción, firmando al calce para constancia.

Entrega
L.C.E. Alfonso Martínez López
Vice-Rector de Administración
de la Universidad de la Cañada

Recibe
Dra. Margarita Bernabé Pineda
Vice-Rectora Académica
de la Universidad de la Cañada

Testigo
C.P. Jaime Rodolfo Reyes Toscano
Auditor Interno de la
Universidad de la Cañada

Testigo
M.A. Shirley Merino Pérez
Jefa del Departamento de Recursos Materiales y Adquisiciones de la
Universidad de la Cañada



UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Clave interna de identificación de la obra: **FAM-IES/0239/210616/2021**
FAM-IES/1174/212392/2021

Siendo las 16:00 hrs del día 16 de diciembre del año 2021, se reunieron los CC. LCE. Alfonso Martínez López, Vice-Rector de Administración de la Universidad de la Cañada; Dra. Margarita Bernabé Pineda, Vice-Rectora Académica; L.C.E. Arisema Arollo Bonilla, Jefa del Departamento de Servicios Escolares y el C.P. Jaime Rodolfo Reyes Toscano, Auditor Interno; en las sedes de la obra abajo descrita, a fin de constatar lo siguiente:

DATOS GENERALES DE LA OBRA					
Descripción de la Obra	Clave interna de Identificación de la Obra	Modalidad de Ejecución		Fecha de:	
		Administración Directa	Licitación/ Concurso	Inicio de la Obra	Términación de la Obra
EQUIPAMIENTO DE AULAS GENERALES, INTERACTIVA Y AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	FAM-IES/0239/210616/2021 FAM-IES/1174/212392/2021	X	X	06-dic-21	16-dic-21

Obra de continuidad	SI ()	NO (X)
Etapa Número	UNO	

SEDE DE LA OBRA					
Dirección postal	Localidad, Población o Ciudad	Municipio	Clave y nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus
Universidad de la Cañada, Carretera Teotitlán-San Antonio Nanahuatipan Km 1.7, Paraje Titlacuatitla	Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	20ESU3009F	Universidad de la Cañada	Universidad de la Cañada

Handwritten signatures and initials in blue ink:
 - A large signature on the right side of the first table.
 - A signature below the second table.
 - A signature below the third table.
 - A signature below the fourth table.



UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Clave interna de identificación de la obra: **FAM-IES/0239/210616/2021**
FAM-IES/1174/212392/2021

TRABAJO EJECUTADO	
Equipamiento	X
Remodelación/Adecuación/Ampliación	

NÚMERO DE ESPACIOS QUE INCLUYE LA OBRA	
Descripción	Número
Aulas/Salones	X
Talleres	
Laboratorios	
Cubículos	
Bibliotecas	
Auditorios	X
C. de Cómputo	X
C. de Lenguas	
Aulas Magnas/Usos Múltiples	
Oficinas administrativas	
Áreas comunes	
Otros	

RECURSOS FAM	
A) Obra apoyada una sola vez	
Año de financiamiento	2021
Monto aportado por el FAM	802,033.04
Monto total ejercido del FAM	802,033.04
Remanente	0.00
Costo total de la Obra	802,033.04
B) Obra apoyada en más de un ejercicio	
Año	Monto
2015	
2016	
2017	
2018	
2019	
2020	
Total aportado por FAM	\$ 802,033.04
Costo total de la Obra	\$ 802,033.04
Total metros cuadrados de la obra	N/A

Los asistentes proceden a hacer un recorrido por la obra mencionada y acto seguido el L.C.E. Alfonso Martínez López, Vice-Rector de Administración; hace entrega de la misma a la CC. Dra. Margarita Bernabé Pineda, Vice-Rectora Académica de la Universidad de la Cañada; quien recibe a entera satisfacción, firmando al calce para constancia.

Entrega
L.C.E. Alfonso Martínez López Vice-Rector de Administración de la Universidad de la Cañada

Recibe
Dra. Margarita Bernabé Pineda Vice-Rectora Académica de la Universidad de la Cañada

Testigo
C.P. Jaime Rodolfo Reyes Toscano Auditor Interno de la Universidad de la Cañada

Testigo
L.C.E. Arisema Arolio Bonilla Jefa del Departamento de Servicios Escolares de la Universidad de la Cañada.



UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Clave interna de identificación de la obra: **FAM-IES/0827/211835/2021**

Siendo las 16:00 hrs del día 2 de diciembre del año 2021, se reunieron los CC. LCE. Alfonso Martínez López, Vice-Rector de Administración de la Universidad de la Cañada; Dra. Margarita Bernabé Pineda, Vice-Rectora Académica, M.B.E.I. Hector García Ángeles, Jefe de Biblioteca en la sede de la obra abajo descrita y la M.A. Shirley Merino Pérez, Jefa del Departamento de Recursos Materiales; a fin de constatar lo siguiente:

DATOS GENERALES DE LA OBRA					
Descripción de la Obra	Clave interna de Identificación de la Obra	Modalidad de Ejecución		Fecha de:	
		Administración Directa	Licitación/ Concurso	Inicio de la Obra	Términación de la Obra
EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	FAM-IES/0827/211835/2021		X	05-nov-21	04-dic-21

Obra de continuidad	SI ()	NO (x)
Etapa Número	UNO	

SEDE DE LA OBRA					
Dirección postal	Localidad, Población o Ciudad	Municipio	Clave y nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus
Universidad de la Cañada, Carretera Teotitlán-San Antonio Nanahuatipan Km 1.7, Paraje Titlacuatitla	Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	20ESU3009F	Universidad de la Cañada	Universidad de la Cañada

Hector García

[Signature]

[Signature]



UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Clave interna de identificación de la obra: **FAM- IES/0827/211835/2021**

TRABAJO EJECUTADO	
Equipamiento	X
Remodelación/Adecuación/Ampliación	

NÚMERO DE ESPACIOS QUE INCLUYE LA OBRA	
Descripción	Número
Aulas/Salones	
Talleres	
Laboratorios	
Cubículos	
Bibliotecas	X
Auditorios	
C. de Cómputo	
C. de Lenguas	
Aulas Magnas/Usos Múltiples	
Oficinas administrativas	
Áreas comunes	
Otros	


RECURSOS FAM	
A) Obra apoyada una sola vez	
Año de financiamiento	2021
Monto aportado por el FAM	343,335.68
Monto total ejercido del FAM	343,335.68
Remanente	0
Costo total de la Obra	\$ 343,335.68
B) Obra apoyada en más de un ejercicio	
Año	Monto
2015	
2016	
2017	
2018	
2019	
2020	
Total aportado por FAM	\$ 343,335.68
Costo total de la Obra	\$ 343,335.68
Total metros cuadrados de la obra	N/A

Los asistentes proceden a hacer un recorrido por la obra mencionada y acto seguido el L.C.E. Alfonso Martínez López, Vice-Rector de Administración; hace entrega de la misma a la CC. Dra. Margarita Bernabé Pineda, Vice-Rectora Académica; quien recibe a entera satisfacción, firmando al calce para constancia.


Entrega


 L.C.E. Alfonso Martínez López
 Vice-Rector de Administración
 de la Universidad de la Cañada


Recibe


 Dra. Margarita Bernabé Pineda
 Vice-Rectora Académica
 de la Universidad de la Cañada

Testigo


 M.B.E.I. Héctor García Ángeles
 Jefe de Biblioteca
 de la Universidad de la Cañada

Testigo


 M.A. Shirley Merino Pérez
 Jefa del Departamento de Recursos Materiales y Adquisiciones de
 la Universidad de la Cañada



UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

HOJA No. 1

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

“CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.”

OBRA	ESTADO	020 OAXACA
“CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.”	NUM. DE OBRA	FAM-IES/0323/210800/2021
NOMBRE DE ESCUELA	PROGRAMA	127- INCREMENTO A LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR
UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	SUBPROGRAMA	01 CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR
LOCALIDAD	MODALIDAD	CONTRATO DE OBRA PUBLICA
0001 TEOTITLAN DE FLORES MAGON	FUENTE	E RECURSO FEDERALES
MUNICIPIO	RAMO	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
543 TEOTITLAN DE FLORES MAGON	FONDO	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES - EDUCATIVA SUPERIOR CAPITAL, FAM IES CAPITAL, EJERCICIO 2021
REGION		
01 CAÑADA		
FECHA DE INICIO		
1 de octubre de 2021		
FECHA DE TÉRMINO		
22 de enero de 2022		

EN LA CIUDAD DE TEOTITLAN DE FLORES MAGON, OAX. A LAS 11:00 HRS. DEL 22 DE ENERO DE 2021. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCION ABAJO MENCIONADA.

TRABAJO EJECUTADO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA					
	A AULAS	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXOS	L ADAPTACIONES LOCALES	O OTROS SISTEMA FOTOVOLTAICO
OBRA NUEVA	X					
AMPLIACIÓN						
REPARACIÓN						
TERMINACIÓN						X
EQUIPO Y MOBILIARIO						

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.”

COMPRENDE UNA SUPERFICIE DE 895.33 M2, TIENE LA CAPACIDAD DE GENERAR HASTA 151.8 KW, SE INTERCONECTARÁ A LA PLANTA DE EMERGENCIA Y SUBESTACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (C.F.E.), CON LA FINALIDAD DE APROVECHAR LOS RECURSOS NATURALES DE LA ZONA Y CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SERVICIO DE C.F.E. MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DE INVERSORES.

AREA CONSTRUIDA:	895.33 M ²	INVERSIÓN EJERCIDA	\$	4,597,661.24
EDIFICIOS:	M ²	CONSTRUCCIÓN:	\$	4,597,661.24
PAVIMENTOS:	M ²	MOB. Y EQUIPO:	\$	
OTROS:	M ²			
SUP. TERRENO:	M ²			

SERVICIOS MUNICIPALES

EL EDIFICIO SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA	<input type="checkbox"/>	DRENAJE	<input type="checkbox"/>	ELECTRIFICACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>
------	--------------------------	---------	--------------------------	-----------------	-------------------------------------

RC
Rodrigo Carro López
CALR740428UG5



Universidad de la Cañada

HOJA No. 3

NUM. DE OBRA

FAM-IES/0323/210860/2021

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA Y ACTO SEGUIDO LA PERSONA FISICA RODOLFO CARRO LÓPEZ , REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL M. EN C. RODOLFO CARRO LÓPEZ, HACE ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ, VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.

1.- OBRA CIVIL	100%	1.1. EDIFICACIÓN	100%
2. MOBILIARIO		1.2 OBRA EXTERIOR	100%
3.-EQUIPO			
3.-REPARACIÓN			

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

ENTREGA POR LA CONTRATISTA

RECIBE POR LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

FIRMA

Rodolfo Carro Lopez
CALR740423110

FIRMA

L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ

NOMBRE:

M. EN C. RODOLFO CARRO LÓPEZ

NOMBRE:

L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ

CARGO:

PERSONA FISICA

CARGO:

VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION UNCA Y REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGOS:

POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

FIRMA

NOMBRE:

CARGO:

POR LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

FIRMA

FIRMA

NOMBRE:

ARQ. MELANY CUEVAS MANUEL

NOMBRE:

CP. CLAUDIA ARELI SANTIAGO DELGADO

CARGO:

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA UNCA

CARGO:

JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA UNCA

OBSERVACIONES:

NINGUNA

Universidad de la Cañada
VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN



UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Clave interna de identificación de la obra: FAM-IES/0323/210860/2021

Siendo las 11:00 hrs del día 22 del mes de enero del año 2022, se reunieron los CC. LCE. Alfonso Martínez López, Vice-Rector de Administración de la Universidad de la Cañada y el M. en C. Rodolfo Carro López, como Persona Física en la sede de la obra abajo descrita, a fin de constatar lo siguiente:

DATOS GENERALES DE LA OBRA



Descripción de la Obra	Clave interna de Identificación de la Obra	Modalidad de Ejecución		Fecha de:	
		Administración Directa	Licitación/ Concurso	Inicio de la Obra	Términación de la Obra
"CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA."	FAM-IES/0323/210860/2021		X	01-oct-21	22-ene-22

Obra de continuidad	SI ()	NO (X)
Etapas Número	1 (UNO)	

SEDE DE LA OBRA

Dirección postal	Localidad, Población o Ciudad	Municipio	Clave y nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus
Universidad de la Cañada, Carretera Teotitlán-San Antonio Nanahuatipan Km 1.7, Paraje Titlacuatitla	Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	20ESU3009F	Universidad de la Cañada	Universidad de la Cañada


RC
Rodolfo Carro López
CALR740428UC5



Universidad de la Cañada

UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Clave interna de identificación de la obra: **FAM-IES/0323/210860/2021**

TRABAJO EJECUTADO	
Construcción, nueva obra	X
Remodelación/Adecuación/Ampliación	

NÚMERO DE ESPACIOS QUE INCLUYE LA OBRA	
Descripción	Número
Aulas/Salones	
Talleres	
Laboratorios	
Cubículos	
Bibliotecas	
Auditorios	
C. de Cómputo	
C. de Lenguas	
Aulas Magnas/Usos Múltiples	
Oficinas administrativas	
Áreas comunes	
Otros (SISTEMA FOTOVOLTAICO)	X

RECURSOS FAM	
A) Obra apoyada una sola vez	
Año de financiamiento	2021
Monto aportado por el FAM	4,597,661
Monto total ejercido del FAM	4,597,661
Remanente	0
Costo total de la Obra	4,597,661
B) Obra apoyada en más de un ejercicio	
Año	Monto
2014	
2015	
2016	
2017	
2018	
2019	
Total aportado por FAM	4,597,661.24
Costo total de la Obra	4,597,661.24
Total metros cuadrados de la obra	895.33 M ²

Los asistentes proceden a hacer un recorrido por la obra mencionada y acto seguido el M. en C. Rodolfo Carro López hace entrega de la misma al L.C.E. Alfonso Martínez López, Vice-Rector de Administración de la Universidad de la Cañada, quien recibe a entera satisfacción, firmando al calce para constancia

Entrega
M. EN C. RODOLFO CARRO LÓPEZ PERSONA FISICA <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> </div>

Recibe
L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ Vice-Rector de Administración de la Universidad de la Cañada <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> </div>

Festigo
ARQ. MELANY CUEVAS MANUEL Jefe de Depto. de Proyectos, Construcción y Mantenimiento de la Universidad de la Cañada. <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> </div>
