



UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

"2021, Año del Reconocimiento al Personal de Salud, por la Lucha Contra el Virus SARS-CoV2, COVID-19"

Área:	Vice-Rectoría de Administración.
Oficio No.:	VRAD/E/174/2021.
Asunto:	Informe trimestral del FAM 2021.

DOCTOR
ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARAZ
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL "DGESUP"
P R E S E N T E:

En atención al oficio número: 511/2021.-0504-34 signado con fecha 16 de febrero de 2021 y por instrucciones del Dr. Modesto Seara Vázquez, Rector de la Universidad de la Cañada; por este conducto me permito remitirle el Informe de Avance de los proyectos apoyados a través del Fondo de Aportaciones Múltiples del ejercicio 2021, correspondiente al trimestre julio-septiembre, con fecha corte 30 de septiembre de 2021, debidamente requisitado y digitalizado en formato PDF con sus respectivos archivos en Excel.

De conformidad con lo señalado en el oficio de referencia y derivado de la Contingencia Sanitaria del COVID 19, la entrega de este informe se remite de manera electrónica a los correos cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx, jcarlosv@nube.sep.gob.mx y claudia.duenas@nube.sep.gob.mx y posteriormente se hará llegar en original y memoria USB.

Sin otro particular, le reitero mi distinguida consideración.

ATENTAMENTE

"praeteritum noscere, posterum molior"
Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca
08 de octubre de 2021

L.C.E. Alfonso Martínez López
Vice-Rector de Administración



Universidad de la Cañada
VICE-RECTORÍA DE
ADMINISTRACIÓN

C.c.p.- DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ.- Rector de la Universidad de la Cañada "UNCA".- Para su superior conocimiento.
DR. FRANCISCO LUCIANO CONCHEIRO BÓRQUEZ.- Subsecretario de Educación Superior.- Para su conocimiento.
DRA. CARMEN ENEDINA RODRÍGUEZ ARMENTA.- Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural "DGESUI".- Mismo fin.
M.A. MAGALY NICTEXA FIERRO MUÑOZ.- Representante Institucional UNCA.- Mismo fin.
Archivo.

CARRETERA TEOTITLÁN-SAN ANTONIO NANAHUATIPAN KM. 1.7, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, OAX.

TEL.: 01 (236) 37 2 07 12, 37 2 07 15 y 37 2 07 47.

www.unca.edu.mx

2021

AÑO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:
JUL-SEP/2021
FECHA DE CORTE: 30/09/2021

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Nombre: Universidad de la Cañada
Entidad federativa: Oaxaca
Clave Inst: 20MSU0032V

Universidad de la Cañada

Nombre: L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ
Cargo: VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Teléfono: (296) 372 07 18, Ext.: 200
Correo electrónico: vica_admin@unca.edu.mx

Presidencia

Nombre: ARO. MELANY CUEVAS MANUEL
Cargo: JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
Teléfono: (296) 372 07 18, Ext.: 208
Correo electrónico: superior@unca.edu.mx

Obras y Mantenimiento

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fecha ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada			Cuenta con Actas	
		Obras de construcción	Equipamiento	Adquisiciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentado				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			Entrega- Recepción (Acta Inquinto)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa		
																							¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?
1	TERMINACIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.						\$ 12,771,580.00	\$ 613,583.55	\$ 1,358,006.45	ESPACIOS DEPORTIVOS	1	710.00	SE REALIZÓ EL ARMADO DE LAS ARMADURAS A1 Y P1, LOS TENSORES, LARGUEROS Y CONEXIONES.	CONTRAFLEAMBIOS, CONTRAIRENTOS, CANAL PLUVIAL, LAMINA MULTITECHO Y CISTERNA DE ALMACEN PLUVIAL.	38%	16/08/21	23/11/21	OBRA EN PROCESO	NO	-	-	NO	NO	\$0.00
										TOTAL	1	710.00	GLOBAL DEL PROYECTO											
2	REEMPLAZO DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS TECNOLOGÍA LED EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.	X					\$ 486,682.00	\$ -	\$ 486,682.00	ESPACIO EDUCATIVOS	6 EDIFICIOS	-	-	-	0%	-	-	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NO	-	-	NO	NO	\$0.00
										TOTAL	6 EDIFICIOS	6.00	GLOBAL DEL PROYECTO											
3	EQUIPAMIENTO DE AULAS GENERALES, INTERACTIVA Y AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.	X					\$ 802,033.04	\$ -	\$ 802,033.04	AULAS Y AUDITORIO	2 EDIFICIOS	-	-	-	0%	-	-	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NO	-	-	NO	NO	\$0.00
										TOTAL	2 EDIFICIOS	6.00	GLOBAL DEL PROYECTO											
4	ADECUACIÓN Y MEJORA DEL AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.	X					\$ 289,029.00	\$ -	\$ 289,029.00	ADECUACION	1 EDIFICIO	-	SE REALIZÓ EL RETIRO DE LAS BUTACAS EXISTENTES Y COLADO DEL FORRO DE HULE DE LOS PISOS, SE CORTÓ Y DEMOLÓ EL FRISO PARA LA AMPHACION DE LA ZONA CENTRAL.	FORJADO DE ESCALÓN Y COLADO DEL MISMO, REUBICACION DE SILLAS EXISTENTES Y NUEVAS, PINTURA EN ESCALONES Y COLOCACION DE ALFOMBRA	4%	20/09/21	14/11/21	OBRA EN PROCESO	NO	-	-	NO	NO	\$0.00
										TOTAL	1 EDIFICIO	6.00	GLOBAL DEL PROYECTO											
5	EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.	X					\$ 343,335.66	\$ -	\$ 343,335.66	BIBLIOTECA	1 EDIFICIO	-	-	-	0%	-	-	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NO	-	-	NO	NO	\$0.00
										TOTAL	1 EDIFICIO	6.00	GLOBAL DEL PROYECTO											

2021



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
JUL-SEP/2021
FECHA DE Corte: 30/09/2021

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Nombre: Universidad de la Cañada
Entidad federativa: Oaxaca
Clave Inst 911 2045U002V

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ
Cargo: VICE RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Teléfono: (376) 372 07 18, Ext. 200
Correo electrónico: vica_admin@unca.edu.mx

Paralelo

Obras y Mantenimiento

Nombre: ARIQ MELANY CUEVAS MANUEL
Cargo: JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
Teléfono: (376) 372 07 18, Ext. 208
Correo electrónico: superint-obras@unca.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fecha ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obras de infraestructura	Equipamiento	Administración y servicios	Rehabilitación				Proyecto experimental	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción
6	AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.				\$ 4,223,000.00	\$ -	\$ 4,223,000.00	BIBLIOTECA	1	EDIFICIOS	0.00	SE REALIZÓ EL DESPALME, LA EXCAVACION, EL ARMADO DEL ACERO EN CIMENTACION, COLADO DE ZAPATAS, MUROS DE CONCRETO, COLUMNAS Y MURETE DE ENRIASE.	RELLENO DE MATERIAL DE BANCO Y SELECTO, CADENA DE DESPLANTE, MUROS DE TABIQUE Y CONCRETO ARMADO, COLUMNAS Y ANCLAJE DE PLACAS METALICAS PARA ESTRUCTURA Y COLOCACION DE LOSA ACERO	13%	23/08/21	19/01/22	OBRA EN PROCESO	NO	-	-	NO	NO	\$0.00
		TOTAL		1	EDIFICIOS	0.00																	
7	CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	X			\$ 4,587,861.24	\$ -	\$ 4,587,861.24	ADECUACION EN TALLER DE ALIMENTOS Y FARMACOLOGIA	1		277.00	SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DESPALME DEL TERRENO	CONSTRUCCION DE LA CASETA DE INVERSORES, EXCAVACION PARA COLOCACION DE POSTES PARA SISTEMA UNICAP, INSTALACION DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS E INSTALACION DE INVERSORES	2%	01/10/21	31/12/21	OBRA EN PROCESO	NO	-	-	NO	NO	\$0.00
		TOTAL		1		277.00																	
					\$13,916,336.96	\$613,863.68	\$12,701,747.41																



DI. MODESTO VÁZQUEZ
Nombre y firma del titular de la IES

ARIQ MELANY CUEVAS MANUEL
Nombre y firma del titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturará los espacios, equipamiento, obras o proyectos, se podrán anexar fotos como sea necesario.
2 En este espacio se reflejarán los avances y acciones realizadas a realizar, mismas que se verán reflejadas en el reporte fotográfico.
3 Es importante que los formatos de este reporte sean digitalizados. Todos en dos dígitos: día, mes y año.

Universidad de la Cañada
RECTORÍA

Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2021

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
JUL-SEP/2021
FECHA DE CORTE 35/09/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance

38%

PRIMORDIAL 1 Nombre de la obra: **TERMINACIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

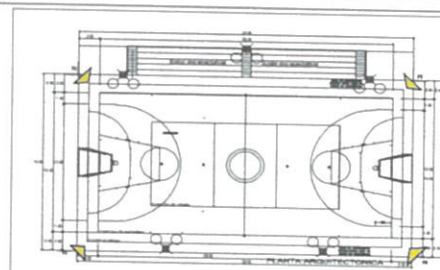

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlán- San Antonio Nanahuatipán Km. 1.7; Paraje Titlacuatilla, Teotitlán de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: ARMADURAS A1 Y P1



F2: ARMADURAS A1 Y P1

Comentarios de los trabajos realizados:




F3: ARMADURAS A1 Y P1



F4: TIPOLOGÍA Y CONDICIONES



F5: LANTERNAS


DR. MODERNO SEARA VAZQUEZ
Nombre y firma del Titular de la IES


ARQ. MELANY CUEVAS MANUEL
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se libere reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

Universidad de la Cañada

RECTORÍA

Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2021

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
JUL-SEP/2021

FECHA DE CORTE 30/09/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad de la Cañada


Porcentaje de avance

0%

PRIMARIDAD 2 Nombre de la obra:

REEMPLAZO DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS TECNOLOGÍA LED EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.

GRUPO DE LOCALIZACIÓN

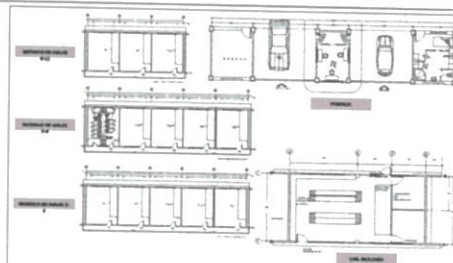

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nahuatipan Km. 1.7; Paraje Tiltacutilla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS

EN PROCESO ADMINISTRATIVO

EN PROCESO ADMINISTRATIVO

Comentarios de los trabajos realizados:

EN PROCESO ADMINISTRATIVO

EN PROCESO ADMINISTRATIVO

EN PROCESO ADMINISTRATIVO



DR. MODERATO BEARA VAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES



ARQ. MELANY CUEVAS MANUEL

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se genere reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

Universidad de la Cañada

RECTORÍA

Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2021

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
JUL-SEP/2021

FECHA DE CORTE 30/09/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance


0%

PRIORIDAD **3**

Nombre de la obra:

EQUIPAMIENTO DE AULAS GENERALES, INTERACTIVA Y AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

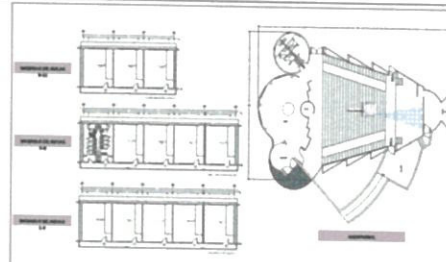

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7, Paraje Titlacuatlan, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS

EN PROCESO ADMINISTRATIVO

EN PROCESO ADMINISTRATIVO

Comentarios de los trabajos realizados:

EN PROCESO ADMINISTRATIVO

EN PROCESO ADMINISTRATIVO

EN PROCESO ADMINISTRATIVO


Nombre y firma del Titular de la IES
DR. MOSESINO SEARA VAZQUEZ


Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES
ARIZ MELCANY DEJES MANUEL

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se aneza una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, instalaciones y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2021

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
JUL-SEP/2021
FECHA DE CORTE 30/08/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance
4%

PRIORIDAD **4** Nombre de la obra: **ADECUACIÓN Y MEJORA DEL AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.**


CRÓQUIS DE LOCALIZACIÓN




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlán- San Antonio Nahuatpan Km. 1.7, Paraje Titlacuatitla, Teotitlán de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: DESMONTAJE DE BUTACAS



F2: RETIRO DE FORRO EN PISO

Comentarios de los trabajos realizados:



F3: REMOCIÓN DE PISO



F4: DEMOLICIÓN DE PISO



F5: LIMPIEZA DE PISO



DR. MOISÉS BEARRA VAZQUEZ
Nombre y Apellido Titular de la IES

ARIQ MELARY CUEVAS MANUEL
Nombre y Apellido Titular de Obras y Mantenimiento de la IES



Para el presente reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

RECTORÍA

Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2021

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
JUL-SEP/2021

FECHA DE CORTE 30/09/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

0%

PRIMORDIAL 5 Nombre de la obra: **EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.**

ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipán Km. 1.7, Paraje Titlacuatitla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS

EN PROCESO ADMINISTRATIVO

EN PROCESO ADMINISTRATIVO

Comentarios de los trabajos realizados:

EN PROCESO ADMINISTRATIVO

EN PROCESO ADMINISTRATIVO

EN PROCESO ADMINISTRATIVO


Nombre y firma del Titular de la IES


Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe prueba fotográfica de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

Universidad de la Cañada
RECTORÍA

Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2021

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
JUL-SEP/2021

FECHA DE CORTE 30/09/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance

13%

PRIORIDAD **6**

Nombre de la obra: **AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.**

GRUPO DE LOCALIZACIÓN

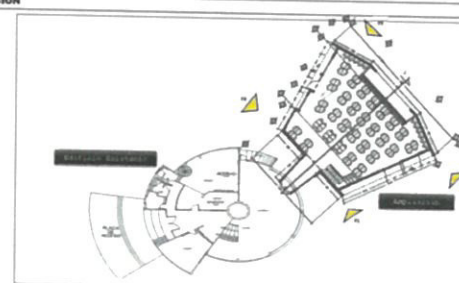

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipán Km. 1.7; Paraje Tiliacuattla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: ORIENTACION



F2: ORIENTACION

Comentarios de los trabajos realizados:



F3: ORIENTACION



F4: ORIENTACION



UNCA
DR. MOISES ESARA VAZQUEZ
Nombre y firma del Titular de la IES

UNCA
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestana, se podrán copiar tantas pestanas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

Universidad de la Cañada

RECTORÍA

2021

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
JUL-SEP/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance

2%

PRECEDENCIA **7** Nombre de la obra: **CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatlipan Km. 1.7; Paraje Titlacuatla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: SUPERFICIE ANTERIOR



F2: LIMPIEZA Y DESPALME

Comentarios de los trabajos realizados:



F3: LIMPIEZA Y DESPALME



F4: LIMPIEZA Y DESPALME



DR. MOISÉS BEZA VAZQUEZ
Nombre y Firma del Titular de la IES

CARLOS MELANY CUEVAS MANUEL
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que en cada reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

Universidad de la Cañada

RECTORÍA

Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
