

Área:	Vice-Rectoría de Administración.
Oficio No.:	UNCA/VRAD/E/004/2022.
Asunto:	Informe del Cuarto Trimestre del FAM 2021.

Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca; a 10 de enero de 2022.

**DOCTOR**

**ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARAZ**

DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL “DGESUP”

P R E S E N T E:

En atención al oficio número: 511/2021.-0504-34 signado con fecha 16 de febrero de 2021 y por instrucciones del Dr. Modesto Seara Vázquez, Rector de la Universidad de la Cañada; por este conducto me permito remitirle el Informe de Avance de los proyectos apoyados a través del Fondo de Aportaciones Múltiples del ejercicio 2021, correspondiente al trimestre octubre-diciembre, con fecha corte 31 de diciembre de 2021, debidamente requisitado y digitalizado en formato PDF con sus respectivos archivos en Excel.

De conformidad con lo señalado en el oficio de referencia y derivado de la Contingencia Sanitaria del COVID 19, la entrega de este informe se remite de manera electrónica a los correos [cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx](mailto:cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx), [jcarlosv@nube.sep.gob.mx](mailto:jcarlosv@nube.sep.gob.mx) y [claudia.duenas@nube.sep.gob.mx](mailto:claudia.duenas@nube.sep.gob.mx) y posteriormente se hará llegar en original y memoria USB.

Sin otro particular, le reitero mi distinguida consideración.

**ATENTAMENTE**

*“praeteritum noscere, posterum molior”*

**L.C.E. Alfonso Martínez López**  
Vice-Rector de Administración



Universidad de la Cañada  
VICE-RECTORÍA DE  
ADMINISTRACIÓN

C.c.p.- DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ.- Rector de la Universidad de la Cañada “UNCA”.- Para su superior conocimiento.  
DR. FRANCISCO LUCIANO CONCHEIRO BÓRQUEZ.- Subsecretario de Educación Superior.- Para su conocimiento.  
DRA. CARMEN ENEDINA RODRÍGUEZ ARMENTA.- Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural “DGESUP”.- Mismo fin.  
M.A. MAGALY NICTEXA FIERRO MUÑOZ.- Representante Institucional UNCA.- Mismo fin.  
Archivo.

2021

AÑO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**OCT-NOV/2021**  
FECHA DE CORTE: 31/12/2021

**REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL**

**DATOS DE LA UNIVERSIDAD**



Nombre: **Universidad de la Cañada**

Entidad federativa: **Oaxaca**

Código Inst: 911-20MSU0032V

Nombre: **L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ**  
Cargo: **VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN**  
Teléfono: **(236) 372 07 15, Ext: 200**  
Correo electrónico: **vica\_admin@unca.edu.mx**

Nombre: **ARO MELANY CUEVAS MAJUEL**  
Cargo: **JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**  
Teléfono: **(236) 372 07 15, Ext: 200**  
Correo electrónico: **supervision obras@unca.edu.mx**

**DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO**

**OBRA CONCLUIDA**

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto 1			Acciones que sustentan el avance 2	Acciones por realizar	% de avance	Fechas 3		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas																
		Obras de construcción	Equipamiento	Adaptaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacios/equipos	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta físico)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa													
																									Cuenta con Actas												
1	TERMINACIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA X UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.					\$ 2,771,500.00	\$ 2,771,500.00	\$ -	ÁREA DE JUEGOS	1	510.00	CONTRAFLEANS E.O.S, CONTRATEMTO S. CANAL PLUVIAL, LAMPARA MULTITECHO, CISTERNA DE ALMACEN PLUVIAL Y PRIMERA ETAPA DE BANOS VESTIDORES	-	-	100%	16/08/21	23/11/21	OBRA CONCLUIDA	NO, AUN FALTA LA TERMINACIÓN DE LOS BANOS VESTIDORES.	-	-	SI	SI	\$ 2,771,600.00													
		ÁREA DE SEGURIDAD LIBRE DE OBSTACULOS	1	102.00																																	
		ÁREA DE GRADAS O ESPECTADORES	1	63.00																																	
		ÁREA DE BANCO DE JUGADORES Y MESA DE CONTROL	1	35.00																																	
<b>TOTAL</b>									<b>4</b>	<b>710.00</b>	<b>GLOBAL DEL PROYECTO</b>																										
2	REEMPLAZO DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS TECNOLOGÍA LED EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.	X				\$ 300,124.05	\$ -	\$ 300,124.05	ESPACIO EDUCATIVOS	12 EDIFICIOS	-	SE COMPROMETIO EL RECURSO	SUMINISTRO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS	0%	15/12/21	12/02/22	EL RECURSO SE COMPROMETIO EN SU TOTALIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SIN EMBARGO EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS ES DE 60 DIAS NATURALES CABE MENCIONAR QUE EL PAGO DEL RECURSO ES EL 100% A LA ENTREGA DE LOS BIENES.	NO, UNA VEZ SUMINISTRADOS LOS BIENES FALTA LA INSTALACIÓN DE LOS MISMOS.	-	-	NO	NO	\$ 0.00														
		<b>TOTAL</b>									<b>12 EDIFICIOS</b>													<b>0.00</b>	<b>GLOBAL DEL PROYECTO</b>												
3	EQUIPAMIENTO DE AULAS GENERALES, INTERACTIVA Y AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.	X				\$ 681,827.79	\$ 681,827.79	\$ -	AULAS Y AUDITORIO	2 EDIFICIOS	-	SE REALIZARON LOS SUMINISTROS DE LOS EQUIPOS Y SUS INSTALACIONES	INSTALACIÓN DE EQUIPOS	100%	06/12/21	03/02/22	OBRA CONCLUIDA	NO, FALTA COMPLETAR LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS	-	-	SI	NO	\$ 681,827.79														
		<b>TOTAL</b>									<b>2 EDIFICIOS</b>													<b>0.00</b>	<b>GLOBAL DEL PROYECTO</b>												
3	EQUIPAMIENTO DE AULAS GENERALES, INTERACTIVA Y AUDITORIO DE LA CAÑADA. SEGUNDA ETAPA	X				\$ 140,205.25	\$ 140,205.25	\$ -	AULAS Y AUDITORIO	2 EDIFICIOS	-	SE COMPROMETIO EL RECURSO	SUMINISTRO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS	100%	07/12/21	04/02/22	EL RECURSO SE COMPROMETIO EN SU TOTALIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE MATERIALES SERÁN DURANTE EL MES DE ENERO DE 2022.	NO	-	-	NO	NO	\$ 0.00														
		<b>TOTAL</b>									<b>2 EDIFICIOS</b>													<b>0.00</b>	<b>GLOBAL DEL PROYECTO</b>												
4	ADECUACIÓN Y MEJORA DEL AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.	X				\$ 289,029.00	\$ 289,029.00	\$ -	ADECUACION	1 EDIFICIO	-	FORJADO DE ESCALÓN Y COLLADO DEL MISMO, REUBICACIÓN DE SILLAS EXISTENTES Y NUEVAS, PINTURA EN ESCALONES Y COLOCACION DE ALFOMERA	-	-	100%	20/09/21	14/11/21	OBRA CONCLUIDA	NO, SOLO SE TRATA DE LA ADECUACIÓN DE UN EDIFICIO EXISTENTE	-	-	SI	SI	\$ 289,029.00													
		<b>TOTAL</b>									<b>1 EDIFICIO</b>														<b>0.00</b>	<b>GLOBAL DEL PROYECTO</b>											

2021



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**OCT-NOV/2021**  
FECHA DE CORTE: 31/10/2021

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad de la Cañada**  
Entidad federativa: **Oaxaca**  
Código Inst 911: 2043X0032V

Planes de  
Nombre: **L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ**  
Cargo: **VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN**  
Teléfono: **(236) 372 07 15, Ext. 201**  
Correo electrónico: **vice\_admin@unca.edu.mx**

RESPONSABLES

Obras y Mantenimiento  
Nombre: **ARG. MELANY CUEVAS MANUEL**  
Cargo: **JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**  
Teléfono: **(236) 372 07 15, Ext. 201**  
Correo electrónico: **supervision-obras@unca.edu.mx**

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada					
		Obras de construcción	Equipamiento	Adquisición y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustancial	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta final)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa
5	EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.	X				\$ 343,335.68	\$ 343,335.68	\$ -	BIBLIOTECA	1	EDIFICIO	0.00	SE REALIZARON LOS SUMINISTROS	INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE LAS MESAS.	100%	05/11/21	04/12/21	SE HABILITARÁ TEMPORALMENTE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON LAS MESAS Y SILLAS PARA HACER USO DE ESPACIOS AL AIRE LIBRE Y REDUCIR ASÍ LA POSIBILIDAD DE CONTAGIOS DE COVID-19 ENTRE LOS ALUMNOS.	NO	-	-	SI	NO	\$343,335.68
									TOTAL	1	EDIFICIO	0.00												
6	AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.					\$ 4,223,000.00	\$ 1,586,771.98	\$ 2,716,228.02	SALA DE LECTURA PLANTA BAJA	1	145.00	RELENO DE MATERIAL DE BARRIDO Y SELECTO.	Muros de tabique en recaro nivel, estructura de acero en azotea con metal y techos y acabados	GLOBAL DEL PROYECTO		OBRA EN PROCESO	NO	-	-	NO	NO	10.00		
									SALA DE LECTURA PLANTA ALTA	1	150.00	CAJENA DE DEPLANTE.		40%	23/08/21								19/01/22	
									AREA DE ESCALERAS	1	10.00	Muros de tabique en recaro nivel, estructura de acero en azotea con metal y techos y acabados												
									PASEO DE INTERCONEXIÓN	1	10.00	COLUMNAR Y ANCLADO DE PLACAS METÁLICAS PARA ESTRUCTURA Y COLOCACIÓN DE LOSA ACERO.												
									TOTAL	1	325.00													
7	CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	X				\$ 4,597,681.24	\$ 1,295,532.29	\$ 3,302,129.95	CUARTO DE INVERSORES	1	13.33	CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA DE INVERSORES, EXCAVACION PARA COLADO DE DADOS, ASENTAMIENTO DE PLACAS, FABRICACIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS, DUCTERÍA E INSTALACIÓN DE INVERSORES.	INSTALACION DE ESTRUCTURA, MÓDULOS FOTOVOLTAICOS Y CERCADO.	35%	01/10/21	31/12/21	OBRA EN PROCESO	NO	-	-	NO	NO	10.00	
									TOTAL	2	806.33													
						<b>\$14,416,830.96</b>	<b>\$7,008,291.99</b>	<b>\$8,507,038.97</b>																

DR. MCGESTO SEARA VAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES

1 Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta fotos como sea necesario.  
2 En esta sección se midió la forma bruta y concreta los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.  
3 Es importante que las fichas de inicio y término estén actualizadas. Todos en dos dígitos, dd, mm y aa.



Universidad de la Cañada  
RECTORÍA

ARG. MELANY CUEVAS MANUEL  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES



Universidad de la Cañada  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,  
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2021

AÑO

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**OCT-DIC/2021**  
FECHA DE CORTE: 31/12/2021

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Universidad de la Cañada

Porcentaje de avance

**100%**

PRIOIDAD **1** Nombre de la obra: **TERMINACIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.**

GRUPOS DE LOCALIZACIÓN

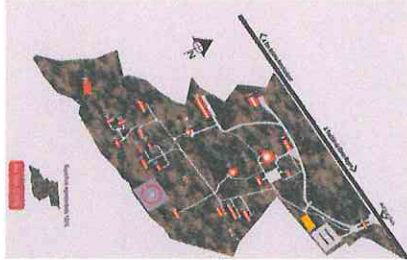

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlán- San Antonio Nahuatlápan Km. 1.7; Paraje Tilacuautla, Teotitlán de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1. BALOS VESTIDORES 1A ETAPA



F2. COLOCACION DE CONTRAFLANJEO Y MULTYTECHO

Comentarios de los trabajos realizados:



F3. COLOCACION DE CONTRAFLANJEO Y MULTYTECHO



F4. COLOCACION DE CONTRAVIENTO



F5. COLOCACION DE CONTRAFLANJEO Y MULTYTECHO

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ  
Nombre y firma del Titular de la IES

*[Handwritten signature]*  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES



Universidad de la Cañada  
RECTORÍA



Universidad de la Cañada  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,  
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Es importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestifia, se podrán copiar tantas pestifias como sea necesario. En caso de reparaciones, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2021

AÑO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**OCT-DIC/2021**  
FECHA DE CORTE: 31/12/2021


REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance  
**0%**

PRIOIRAS 2 Nombre de la obra: **REEMPLAZO DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS TECNOLOGÍA LED EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

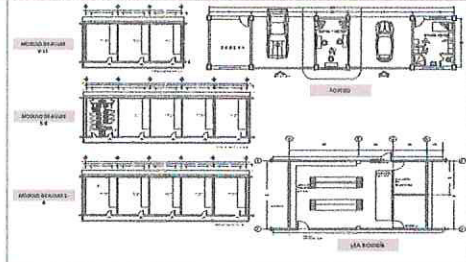

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nahuatipan Km. 1.7; Paraje Titlacuatlán, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS

EL RECURSO SE COMPROMETIO EN SU TOTALIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SIN EMBARGO EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS ES DE 60 DIAS NATURALES. CABE MENCIONAR QUE EL PAGO DEL RECURSO ES EL 100% A LA ENTREGA DE LOS BIENES.

EL RECURSO SE COMPROMETIO EN SU TOTALIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SIN EMBARGO EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS ES DE 60 DIAS NATURALES. CABE MENCIONAR QUE EL PAGO DEL RECURSO ES EL 100% A LA ENTREGA DE LOS BIENES.

Comentarios de los trabajos realizados:


EL RECURSO SE COMPROMETIO EN SU TOTALIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SIN EMBARGO EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS ES DE 60 DIAS NATURALES. CABE MENCIONAR QUE EL PAGO DEL RECURSO ES EL 100% A LA ENTREGA DE LOS BIENES.

EL RECURSO SE COMPROMETIO EN SU TOTALIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SIN EMBARGO EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS ES DE 60 DIAS NATURALES. CABE MENCIONAR QUE EL PAGO DEL RECURSO ES EL 100% A LA ENTREGA DE LOS BIENES.

EL RECURSO SE COMPROMETIO EN SU TOTALIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SIN EMBARGO EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS ES DE 60 DIAS NATURALES. CABE MENCIONAR QUE EL PAGO DEL RECURSO ES EL 100% A LA ENTREGA DE LOS BIENES.

DR. MODESTO SERRA YAZQUEZ  
Nombre y firma del Titular de la IES

ARQ. MELANY CUEVAS MANUEL  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES



Universidad de la Cañada  
RECTORÍA



Universidad de la Cañada  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,  
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Es importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestañita, se podrán copiar tantas pestañitas como sea necesario. Equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2021

AÑO

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**OCT-DIC/2021**

FECHA DE CORTE: 31/12/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad de la Cañada


Porcentaje de avance

**100%**

PRECEDENCIA **3**

Nombre de la obra: **EQUIPAMIENTO DE AULAS GENERALES, INTERACTIVA Y AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.**


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuallipan Km. 1.7, Paraje Titlacuatilla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS

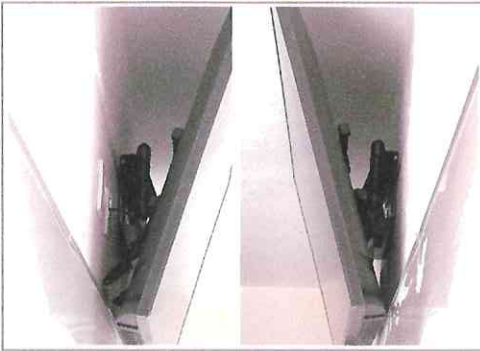

F1



F2

Comentarios de los trabajos realizados:



F3



F4



DR. MODESTO SEARA VIZQUEZ  
Nombre y firma del Titular de la IES


ABD. MELANY CUEVAS ISRAHEL  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para el equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



Universidad de la Cañada

RECTORÍA



Universidad de la Cañada  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,  
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2021

AÑO

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**OCT-DIC/2021**  
FECHA DE CORTE: 31/12/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance

**100%**

PRORIDAD **4**

Nombre de la obra: **ADECUACIÓN Y MEJORA DEL AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.**

CROQUI DE LOCALIZACIÓN

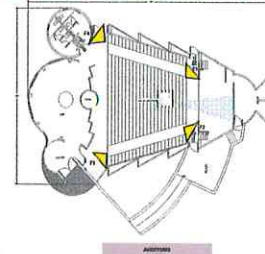

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlán- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7; Paraje Tillacuatlán, Teotitlán de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: MONTAJE DE BUTACAS



F2: MONTAJE DE BUTACAS


Comentarios de los trabajos realizados:



F3: MONTAJE DE BUTACAS



F4: COLOCACIÓN DE ALFOMBRA

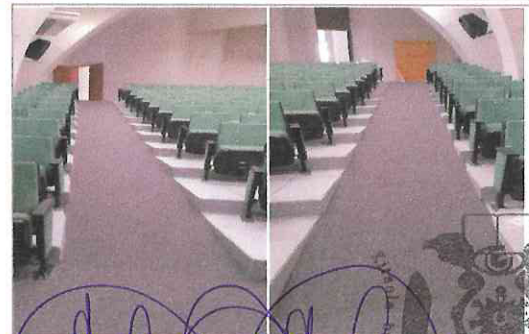

ARD. MELANY CUYAS MANUEL

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



Universidad de la Cañada

RECTORÍA

Universidad de la Cañada  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,  
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2021

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
OCT-DIC/2021

FECHA DE CORTE: 31/12/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIOIRIDAD 5 Nombre de la obra: EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.





Universidad de la Cañada

Porcentaje de avance

100%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

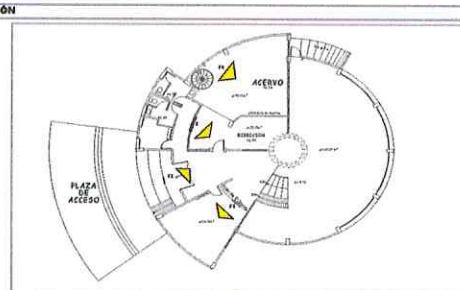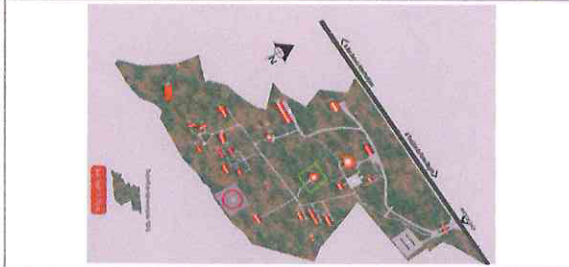

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan-San Antonio Nahuatlapan Km. 1.7; Paraje Tiltlacuatilla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1. SUBMINISTRO DE SILLAS



F2. SUBMINISTRO DE SILLAS

Comentarios de los trabajos realizados:



F3. SUBMINISTRO DE MESAS DE TRABAJO



F4. SUBMINISTRO DE MESAS DE TRABAJO



DR. MODESTO SERRA VAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES

ARG. MELANY CUELLAS MANUEL

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES



Universidad de la Cañada

RECTORÍA

Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

Universidad de la Cañada  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,  
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO



2021

AÑO

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES





DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**OCT-DIC/2021**  
FECHA DE CORTE: 31/12/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

 Universidad de la Cañada Porcentaje de avance <h1>40%</h1>	PRIORIDAD <b>6</b> Nombre de la obra: <b>AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.</b>	<b>CROQUIS DE LOCALIZACIÓN</b> 	<b>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</b> Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipán Km. 1.7. Paraje Titlacuatilla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.
			


FOTOS

 <p>F1: FACHADA NORTE</p>	 <p>F2: PERSPECTIVA</p>	Comentarios de los trabajos realizados:
 <p>F3: PERSPECTIVA</p>	 <p>F4: FACHADA PONIENTE</p>	

DR. NICOLÁS SERRA YAZQUEZ  
 Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



Universidad de la Cañada  
RECTORIA

Universidad de la Cañada  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,  
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2021

AÑO

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**OCT-DIC/2021**  
FECHA DE CORTE: 31/12/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Universidad de la Cañada

Porcentaje de avance

**35%**

PRISACIDAD **7** Nombre de la obra: **CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlán- San Antonio Nahuatlán Km. 1.7, Paraje Titlacuabla, Teotitlán de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: CASITA DE INVERSORES



F2: ÁREA DE JARDÍN SOLAR

Comentarios de los trabajos realizados:



F3: CEMENTO PARA ESTRUCTURA



F4: INSTALACION DE INVERSOR



F5: INSTALACION DE INVERSORES

DR. MODESTO SANCHEZ VAQUEZ  
Nombre y firma del Titular de la IES

[Signature]  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.



Universidad de la Cañada

RECTORÍA



Universidad de la Cañada  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,  
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
