



UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

Área:	Vice-Rectoría de Administración.
Oficio No.:	UNCA/VRAD/E-170/2022.
Asunto:	Informe trimestral del FAM 2022.

Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca; a 04 de julio de 2022.

Doctor

Eduardo Gerardo Rosas González

Director de Fortalecimiento Institucional
Dirección General de Educación Superior
Universitaria e Intercultural "DGESUI"

Presente:

En atención al oficio número: 511/2022-0826-37 signado con fecha 18 de febrero de 2022 y por instrucciones del Rector de la Universidad de la Cañada, Dr. Modesto Seara Vázquez; por este conducto me permito enviarle el Informe de Avance de los proyectos apoyados a través del Fondo de Aportaciones Múltiples del ejercicio 2022, correspondiente al trimestre abril-junio, con fecha corte 30 de junio de 2022, debidamente requisitado y digitalizado en formato PDF con sus respectivos archivos en Excel.


Por lo antes expuesto, remito a usted el reporte actualizado en archivo electrónico formatos Excel y PDF a los correos: rocioc@nube.sep.gob.mx y cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

"praeteritum noscere, posterum molior"

L.C.E. Alfonso Martínez López
Vice-Rector de Administración



Universidad de la Cañada

VICE-RECTORÍA DE
ADMINISTRACIÓN

Con copia para:

- Dr. Modesto Seara Vázquez.- Rector de la Universidad de la Cañada.- Para su superior conocimiento.
 - Dr. Francisco Luciano Concheiro Bórquez.- Subsecretario de Educación Superior.- Para su conocimiento.
 - Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta.- Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural "DGESUI".- Mismo fin.
 - M.A. Magaly Nictexa Fierro Muñoz.- Representante Institucional ante el Programa "RIP UNCA".- Mismo fin.
 - Arq. Melany Cuevas Manuel.- Jefa del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento.- Mismo fin
- Archivo.

2022



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
ABR-JUN/2022
FECHA DE CONT: 30/06/2022

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad de la Cañada**

Entidad federativa: **Oaxaca**

Clave Inst 911: **20MSU0032V**

RESPONSABLES

Planación	Obras y Mantenimiento
Nombre: L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ	Nombre: ARG. MELANY CUEVAS MANUEL
Cargo: VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN	Cargo: JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
Teléfono: (238) 372 07 15, Ext.: 200	Teléfono: (238) 372 07 15, Ext.: 200
Correo electrónico: vice_admin@unca.edu.mx	Correo electrónico: supervision-obras@unca.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto	Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto 1			Acciones que sustentan el avance 2	Acciones por realizar	% de avance	Fecha 3		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas																																			
						Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa																																	
1	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.	X	\$6,664,029.00	\$ -	\$ 6,664,029.00	<table border="1"> <tr><td>Sistemas Inteligentes de Distribuidos</td><td>1</td><td>90.30</td></tr> <tr><td>Redes</td><td>1</td><td>82.30</td></tr> <tr><td>Electrónica</td><td>1</td><td>63.40</td></tr> <tr><td>Vestibulo de acceso y área de Técnico</td><td>1</td><td>74.60</td></tr> <tr><td>Sanitarios</td><td>1</td><td>10.10</td></tr> <tr><td>Corredor</td><td>1</td><td>14.30</td></tr> <tr><td>Investigación de Desarrollo de Software</td><td>1</td><td>90.20</td></tr> <tr><td>Área Ux</td><td>1</td><td>88.00</td></tr> <tr><td>Innovación Educativa</td><td>1</td><td>78.00</td></tr> <tr><td>Vestibulo</td><td>1</td><td>78.00</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td>10</td><td>678.00</td></tr> </table>	Sistemas Inteligentes de Distribuidos	1	90.30	Redes	1	82.30	Electrónica	1	63.40	Vestibulo de acceso y área de Técnico	1	74.60	Sanitarios	1	10.10	Corredor	1	14.30	Investigación de Desarrollo de Software	1	90.20	Área Ux	1	88.00	Innovación Educativa	1	78.00	Vestibulo	1	78.00	TOTAL	10	678.00		0%			EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NO	-	-	NO	NO	50.00			
Sistemas Inteligentes de Distribuidos	1	90.30																																																			
Redes	1	82.30																																																			
Electrónica	1	63.40																																																			
Vestibulo de acceso y área de Técnico	1	74.60																																																			
Sanitarios	1	10.10																																																			
Corredor	1	14.30																																																			
Investigación de Desarrollo de Software	1	90.20																																																			
Área Ux	1	88.00																																																			
Innovación Educativa	1	78.00																																																			
Vestibulo	1	78.00																																																			
TOTAL	10	678.00																																																			
2	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE SERVICIOS GENERALES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.	X	\$2,001,185.00	\$ -	\$ 2,001,185.00	<table border="1"> <tr><td>Herrería, albañilería y jardinería</td><td>1</td><td>24.40</td></tr> <tr><td>Bodega de Herramientas</td><td>1</td><td>39.20</td></tr> <tr><td>Vestibulo</td><td>1</td><td>48.00</td></tr> <tr><td>Área de Intendencia</td><td>1</td><td>16.90</td></tr> <tr><td>Oficina DPCM</td><td>1</td><td>25.10</td></tr> <tr><td>instalaciones/ Choferes</td><td>1</td><td>16.70</td></tr> <tr><td>Carpintería</td><td>1</td><td>21.00</td></tr> <tr><td>Servicio de Conector</td><td>1</td><td>16.10</td></tr> <tr><td>Área de Trabajo</td><td>1</td><td>85.40</td></tr> <tr><td>Lavaderos</td><td>1</td><td>5.00</td></tr> <tr><td>Sanitarios</td><td>1</td><td>21.50</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td>11</td><td>322.00</td></tr> </table>	Herrería, albañilería y jardinería	1	24.40	Bodega de Herramientas	1	39.20	Vestibulo	1	48.00	Área de Intendencia	1	16.90	Oficina DPCM	1	25.10	instalaciones/ Choferes	1	16.70	Carpintería	1	21.00	Servicio de Conector	1	16.10	Área de Trabajo	1	85.40	Lavaderos	1	5.00	Sanitarios	1	21.50	TOTAL	11	322.00		0%			EN PROCESO ADMINISTRATIVO	NO	-	-	NO	NO	50.00
Herrería, albañilería y jardinería	1	24.40																																																			
Bodega de Herramientas	1	39.20																																																			
Vestibulo	1	48.00																																																			
Área de Intendencia	1	16.90																																																			
Oficina DPCM	1	25.10																																																			
instalaciones/ Choferes	1	16.70																																																			
Carpintería	1	21.00																																																			
Servicio de Conector	1	16.10																																																			
Área de Trabajo	1	85.40																																																			
Lavaderos	1	5.00																																																			
Sanitarios	1	21.50																																																			
TOTAL	11	322.00																																																			
			\$9,465,214.00	\$0.00	\$9,465,214.00																																																

DR. MODESTO BEARA VARGUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES

ARG. MELANY CUEVAS MANUEL

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturarán los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas filas como sea necesario.

2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.



Universidad de la Cañada

Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2022

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
ABR-JUN/2022

FECHA DE CORTE: 30/06/2022

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad de la Cañada


Porcentaje de avance

0%

PRORIDAD **1**

Nombre de la obra: **CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7; Paraje Tiliacuatlla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: SUPERFICIE A CONSTRUIR



F2: SUPERFICIE A CONSTRUIR

Comentarios de los trabajos realizados:



F3: SUPERFICIE A CONSTRUIR



F4: SUPERFICIE A CONSTRUIR



F5: SUPERFICIE A CONSTRUIR

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES

ARC. MELANY CUEVAS MANUEL

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, su uso es obligatorio en las partes que se requiera necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma forma como Anexo 2. Lugar antes, durante y después de la obra.



Universidad de la Cañada



Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2022

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
ABR-JUN/2022

FECHA DE CORTE: 30/07/2022

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad de la Cañada

Porcentaje de avance



0%

PRIMORDIA **2**

Nombre de la obra:

CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE SERVICIOS GENERALES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

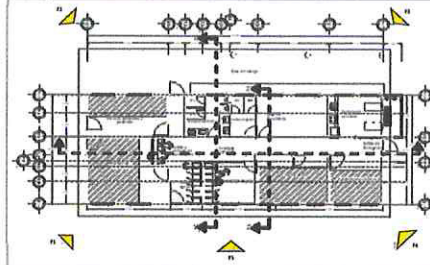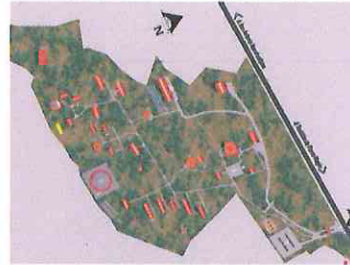

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7; Paraje Tiltlacuiltila, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: SUPERFICIE A CONSTRUIR



F2: SUPERFICIE A CONSTRUIR

Comentarios de los trabajos realizados:



F3: SUPERFICIE A CONSTRUIR



F4: SUPERFICIE A CONSTRUIR



DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES

ARQ. MELANY CUEVAS MANUEL

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se pide que en la parte superior del expediente se anexe el expediente. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, misma angulo y lugar para el inicio durante y despues de la obra.



Universidad de la Cañada



Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
