



UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA  
VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

"2018, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL"

Oficio No.: VRAD/E/270/2018.

Teotitlán de Flores Magón, Oax., a 09 de noviembre de 2018.

**DOCTOR**  
**SALVADOR ALEJANDRO MALO ÁLVAREZ**  
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN  
SUPERIOR UNIVERSITARIA DGESU  
P R E S E N T E:

Por este conducto y en atención al oficio 511-3/2018.-0511 de fecha 23 de mayo de 2018 y en alcance al similar 511/2015.-0373 envío el informe de los avances con fecha corte 31 de octubre del año 2018, de las obras apoyada a través del Recurso FAM 2018. (anexo CD con información magnética)

Por lo antes expuesto, remito a usted el reporte actualizado en archivo electrónico formato Excel y de manera electrónica a los correos [rocioc@nube.sep.gob.mx](mailto:rocioc@nube.sep.gob.mx), [cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx](mailto:cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx) y [jcarlosv@nube.sep.gob.mx](mailto:jcarlosv@nube.sep.gob.mx)

Sin otro particular, le reitero mi más distinguida consideración.

**ATENTAMENTE**

*"praeteritum noscere, posterum molior"*

L.C.E. ALEJANDRO MARTÍNEZ LÓPEZ  
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA  
VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN



C.c.p.- DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ.- Rector de la Universidad de la Cañada.- Para su superior conocimiento.  
Archivo.



2018

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**octubre\_2018**

FECHA DE CORTE: 31/10/2018

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad de la Cañada


Porcentaje de avance

0

PRIMORDIAL 1

Nombre de la obra: **Equipamiento del Laboratorio de Investigación de la Universidad de la Cañada**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

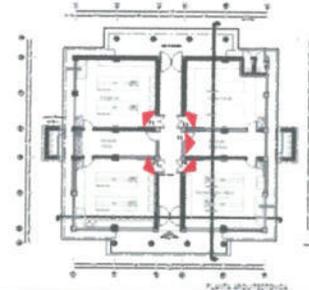

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlán- San Antonio Nanahuatipán Km. 1.7, Paraje Titlacuatitla, Teotitlán de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: Vista Interior Inorganica



F2: Vista Interior Instrumental

Comentarios de los trabajos realizados:

Aun no se tienen trabajos realizados, debido a que el estatus de la obra se encuentra "en proceso Administrativo"



F3: Vista Interior Almacan de Reactivos



F4: Vista Interior Bromatologia/Micro



F5: Vista Interior Organica

DR. MODESTO DEBARA VAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES



ARG. MELANY CUEVAS MANGEL

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES



\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2018

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**octubre\_2018**  
FECHA DE CORTE: 31/10/2018

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance  
**0**

PROYECTO 2 Nombre de la obra: **Mantenimiento de diversas áreas de la Universidad de la Cañada**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7; Paraje Tiltlacustitla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: Fachada principal biblioteca



F2: Área superior de biblioteca para instalar Domo

Comentarios de los trabajos realizados:

Aun no se tienen trabajos realizados, debido a que la obra debe iniciar formalmente con fecha 05 de noviembre de 2018 según contrato.



F3: Fachada auditorio



F4: Puerta CAMPCE del edificio de Aulas



F5: Fachada Centro de Idiomas

DR. MODESTO SEANA VAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES

DR. MELANY CHEVARRÍA

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

UNCA  
Universidad de la Cañada  
RECTORÍA



Universidad de la Cañada  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,  
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2018

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**octubre\_2018**  
FECHA DE CORTE: 31/10/2018

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Porcentaje de avance

0

PRORIDAD: 3 Nombre de la obra: **Construcción de una Cancha de Usos Múltiples, en la Universidad de la Cañada.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

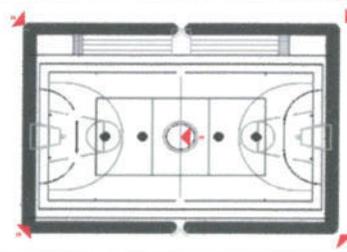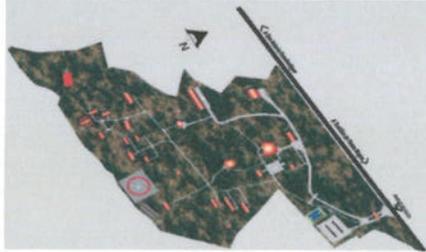

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7; Paraje Titlacuatilla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: habilitado y armado de acero de refuerzo en columnas



F2: excavación y alise de bases


Comentarios de los trabajos realizados:

Con fecha 23 de octubre de 2018 se dio inicio a los trabajos de la construcción de la cancha de usos múltiples, se realizó el despeje, sepaizó trazo y nivelación, se inició la excavación y se suministraron materiales como acero de refuerzo y labicon.

Se habilitó el acero para zapatas aisladas y columnas.



F3: Limpieza, nivelación y habilitado de acero de refuerzo



F4: excavación



F5: habilitado y armado con acero de refuerzo en columnas

DR. MICOPEPUEBLA VAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES

ING. MELVIN CERVANTES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



Universidad de la Cañada

RECTORÍA



Universidad de la Cañada  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,  
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2018

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA


Mes reportado  
**octubre\_2018**  
FECHA DE CORTE: 31/10/2018

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance  
**0**

Nombre de la obra: **Reemplazo de Boilers de gas por Calentadores solares e implementación de Wathorímetros en el Edificio de Departamentos de la Universidad de la Cañada**

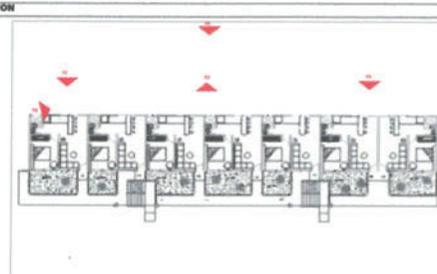

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO  
Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7; Paraje Titicuatilla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



F1: Fachada posterior del Edificio




F2: Fachada posterior lado poniente


Comentarios de los trabajos realizados:  
Aun no se tienen trabajos realizados, debido a que el estatus de la obra se encuentra "en proceso Administrativo"



F3: Área para instalación de Wathorímetros

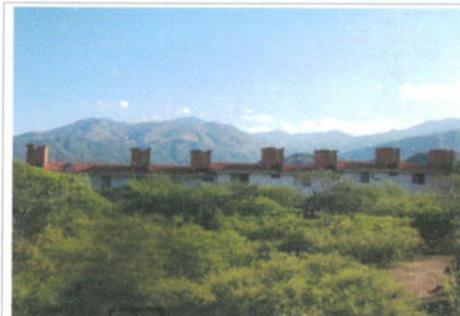

F4: Fachada posterior

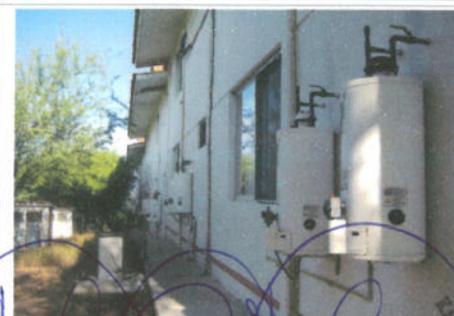

F5: Perspectiva Fachada posterior

DR. MOSES SERNA VAZQUEZ

Nombre y firma del Titular de la IES

ARG. SECURITY-GARVÍS MANUEL

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una planilla, se podrán copiar tantas planillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma zona, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



Universidad de la Cañada  
**RECTORÍA**

*Enseña brinda va*  
**UNCA**  
UNIVERSITARIUM NAVAORUM, PAVITRUM MOLLOR  
estijite

Universidad de la Cañada  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,  
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
