



UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

"2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DE OAXACA A LA REPÚBLICA MEXICANA"



Área:	Vice-Rectoría de Administración.
Oficio No.:	UNCA/VRAD/E-186/2024.
Asunto:	Informe del segundo trimestre del FAM 2024.

Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca; a 08 de julio de 2024.

Doctora

Carmen Enedina Rodríguez Armenta
Directora General de Educación Superior
Universitaria e Intercultural "DGESUP"
Secretaría de Educación Pública

Presente:

Con At'n a: **Dr. Eduardo Gerardo Rosas González**
Director de Fortalecimiento Institucional

En seguimiento al oficio número: 511/2024-0622-41 signado con fecha 07 de febrero de 2024 y por instrucciones de la Mtra. María de los Ángeles Peralta Arias, Rectora de la Universidad de la Cañada; por este conducto me permito remitirle el informe de avance de los proyectos apoyados a través del Fondo de Aportaciones Múltiples del ejercicio 2024, correspondiente al trimestre abril-junio, con fecha de corte 30 de junio de 2024, debidamente requisitado y digitalizado en formato PDF con su respectivo archivo en Excel.


Por lo antes expuesto, remito a usted el reporte actualizado en archivo electrónico formatos Excel y PDF, a los correos: rocioc@nube.sep.gob.mx y cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

"praeteritum noscere, posterum molior"

L.C.E. Alfonso Martínez López
Vice-Rector de Administración



Universidad de la Cañada

VICE-RECTORÍA DE
ADMINISTRACIÓN

Con copia para:

- Mtra. María de los Ángeles Peralta Arias.- Rectora de la Universidad de la Cañada.- Para su superior conocimiento.
 - Dr. Francisco Luciano Concheiro Bórquez.- Subsecretario de Educación Superior, SEP.- Para su conocimiento.
 - Mtro. Farid Acevedo López.- Secretario de Finanzas del Estado de Oaxaca.- Mismo fin.
 - Mtra. Delfina Elizabeth Guzmán Díaz.- Secretaria de Educación del Estado de Oaxaca.- Mismo fin.
 - Lic. Emmanuel Alejandro López Jarquín.- Director General del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa, OICIFED.- Mismo fin.
 - M.A. Magaly Nictexa Fierro Muñoz.- Representante Institucional, UNCA.- Mismo fin.
 - I.E. Armando Marín Nieto.- Encargado del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento, UNCA. Mismo fin.
- Archivo.

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL


DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad de la Cañada**
 Entidad federativa: **OAXACA**
 Círculo: **9112046000207**


RESPONSABLES

Nombre: L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ Cargo: VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN Teléfono: (236) 372 07 16, Ext: 200 Correo electrónico: hca_alfonso@unca.edu.mx	Nombre: ING. ANIBALDO MARIENIETO Cargo: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO Teléfono: (236) 372 07 16, Ext: 208 Correo electrónico: supervision-obras@unca.edu.mx
---	---


Prioridad	ID de acuerdo con el EFIAN	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto	Monto autorizado (A)	CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA						Monto ejecutado (D)	Remanente (E) = B-D	Espacios Habilitados y Disponibles (programados/autorizados)			Acciones que plantea en el avance	% de avance	Fechas Reales		Observaciones	OBRA CONCLUIDA					
					No. (s) de Contrato (s)	Fecha Programada		Monto Contratado (B)	Contratista	Monto no Contratado (C) Diferencia entre Autorizado y Contratado C=A-B			Número por Espacio/espacio	Cantidad	Metros Cuadrados			Línea de Captura	Fecha de capt		Inversión	Entrega (Recepción (Acta de Ingreso) MONTO)	Fecha	Acta Administrativa de Entrega (Recepción Formado OGE(SU) MONTO)	Fecha	
						INICIO	TÉRMINO																			Inicio
					GLOBAL DEL PROYECTO																					
1	5	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS, TALLERES Y EDIFICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.	X	\$ 8,071,747.00	-	-	-	\$ -	-	\$ 8,071,747.00	\$ -	\$ -	Laboratorio de Tecnologías de Información Laboratorio Clínico Laboratorio de Investigación Laboratorio Farmacología Laboratorio de Química Edificio de Servicios Generales	0.00%			EN PROCESO ADMINISTRATIVO									
2	6	AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE CAFETERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.	X	\$ 4,560,000.00	-	-	-	\$ -	-	\$ 4,560,000.00	\$ -	\$ -	Cafetería	0.00%			EN PROCESO ADMINISTRATIVO									
3	3	ADECUACIÓN DE EDIFICIO PARA UN LABORATORIO CLÍNICO UNIVERSITARIO.	X	\$ 1,000,000.00	-	-	-	\$ -	-	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	Laboratorio	0.00%			EN PROCESO ADMINISTRATIVO									
5	1	MANTENIMIENTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.	X	\$ 1,380,721.00	-	-	-	\$ -	-	\$ 1,380,721.00	\$ -	\$ -	Mantenimiento y rehabilitación de mobiliario existente Instalación de Reos economizadores y de Bocas	0.00%	01/12/23	23/05/24	EN PROCESO ADMINISTRATIVO									
				\$15,012,468.00							\$0.00	\$0.00	TOTAL	0.00%												



JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO



VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN



RECTORÍA

1 Se capturan los espacios que concierne a la obra o proyecto. Se podrán anotar tanto ítems como sub ítems.
 2 En esta sección se redacta de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se van actualizando al reportar los avances.
 3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: 01/01/2023.

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

ABRIL - JUNIO - 2024

Fecha de elaboración: 01/07/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD: 1 Nombre de la obra: EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS, TALLERES Y EDIFICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

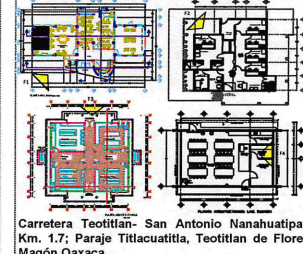

Porcentaje de avance

0.00%


FOTOS




F1: LABORATORIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



F2: LABORATORIO CLÍNICO UNIVERSITARIO




Observaciones:



F3: LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN



F4: LABORATORIO DE QUÍMICA





F5: LABORATORIO DE FARMACOLOGÍA

OBRAS
ING. ARMANDO MARÍN NIETO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.

PLANEACIÓN
VIC. ALFONSO MARRAZQUEZ LÓPEZ
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

PROFESORA
MTRA. MARIA DE LOS ANGELES PERALTA ARIAS.



Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

RECTORÍA

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

ABRIL - JUNIO - 2024

Fecha de elaboración: 01/07/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD 2 Nombre de la obra: AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE CAFETERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.



Universidad de la Cañada

Porcentaje de avance

0.00%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO





UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS





Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7; Paraje Ttlacuatlita, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS

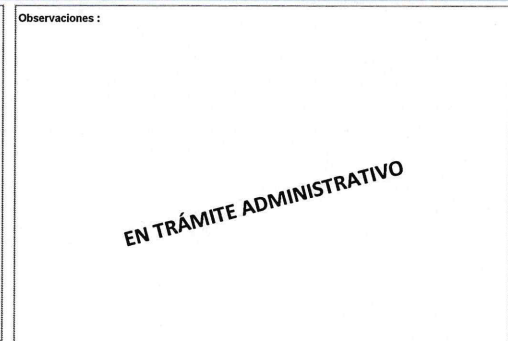


Observaciones :




Universidad de la Cañada

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

NOTA: Este informe que se anexa reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN



RECTORÍA

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

ABRIL - JUNIO - 2024

Fecha de elaboración: 01/07/2024

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD 3 Nombre de la obra: ADECUACIÓN DE EDIFICIO PARA UN LABORATORIO CLÍNICO UNIVERSITARIO.


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Carretera Teotitlan- San Antonio Nahuatipan Km. 1.7; Paraje Tiltlacatitla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.



Porcentaje de avance

0.00%

FOTOS

EN TRÁMITE ADMINISTRATIVO

EN TRÁMITE ADMINISTRATIVO

Observaciones :

EN TRÁMITE ADMINISTRATIVO

EN TRÁMITE ADMINISTRATIVO

EN TRÁMITE ADMINISTRATIVO


OBRAS
ING. ARMANDO MARIN NIETO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.

PLANEACIÓN
L.C. ALFONSO MARTÍNEZ LAPEZ
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN


REGISTRO
MTRA. MARIA DE LOS ANGELES PERALTA ARIAS.



DEPARTAMENTO DE PR. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO



VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN



RECTORÍA

NOTA: Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para el equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

ABRIL - JUNIO - 2024

Fecha de elaboración: 01/07/2024

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD 5 Nombre de la obra: MANTENIMIENTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.



Universidad de la Cañada

Porcentaje de avance

0.00%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7; Paraje Tittlacuatitla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS

EN TRÁMITE ADMINISTRATIVO

EN TRÁMITE ADMINISTRATIVO

EN TRÁMITE ADMINISTRATIVO

F1: Sanitarios Institutos

F2: Sanitarios generales

Observaciones :

EN TRÁMITE ADMINISTRATIVO

EN TRÁMITE ADMINISTRATIVO

EN TRÁMITE ADMINISTRATIVO

F3: sanitarios auditorio


F4: sanitarios secretarías

F5: Sanitarios biblioteca

OBRAS
ING. ARMANDO MARÍN NIETO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.

PLANIFICACIÓN
LIC. ALFONSO MARTÍNEZ LOPEZ
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

RECTORÍA
MTRA. MARIA DE LOS ANGELES PERALTA ARIAS.



Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

Universidad de la Cañada

RECTORÍA
