



# UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

## VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

“2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DE OAXACA A LA REPÚBLICA MEXICANA”



Área:	Vice-Rectoría de Administración.
Oficio No.:	UNCA/VRAD/E-294/2024.
Asunto:	Informe del tercer trimestre del FAM 2024.

Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca; a 08 de octubre de 2024.

Doctora

**Carmen Enedina Rodríguez Armenta**  
Directora General de Educación Superior  
Universitaria e Intercultural “DGESUI”  
Secretaría de Educación Pública

Presente:

Con At'n a: **Dr. Eduardo Gerardo Rosas González**  
Director de Fortalecimiento Institucional

En seguimiento al oficio número: 511/2024-0622-41 signado con fecha 07 de febrero de 2024 y por instrucciones de la Mtra. María de los Ángeles Peralta Arias, Rectora de la Universidad de la Cañada; por este conducto me permito remitirle el informe de avance de los proyectos apoyados a través del Fondo de Aportaciones Múltiples del ejercicio 2024, correspondiente al trimestre julio–septiembre, con fecha de corte 30 de septiembre de 2024, debidamente requisitado y digitalizado en formato PDF con su respectivo archivo en Excel.


Por lo antes expuesto, remito a usted el reporte actualizado en archivo electrónico formatos Excel y PDF, a los correos: rocioc@nube.sep.gob.mx y cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

*“praeteritum noscere, posterum molior”*

  
L.C.E. Alfonso Martínez López  
Vice-Rector de Administración



Universidad de la Cañada

VICE-RECTORÍA DE  
ADMINISTRACIÓN

Con copia para:

- Mtra. María de los Ángeles Peralta Arias.- Rectora de la Universidad de la Cañada.- Para su superior conocimiento.
  - Dr. Francisco Luciano Concheiro Bórquez.- Subsecretario de Educación Superior, SEP.- Para su conocimiento.
  - Mtro. Farid Acevedo López.- Secretario de Finanzas del Estado de Oaxaca.- Mismo fin.
  - Mtra. Delfina Elizabeth Guzmán Díaz.- Secretaria de Educación del Estado de Oaxaca.- Mismo fin.
  - Lic. Emmanuel Alejandro López Jarquín.- Director General del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa, OICIFED.- Mismo fin.
  - pas. C.P. Cristino Alberto Guerrero Hernández.- Representante Institucional, UNCA.- Mismo fin.
  - I.E. Armando Marín Nieto.- Encargado del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento, UNCA. Mismo fin.
- Archivo.

2024



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE PORTAFOLIO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y período de reporte  
**JULIO - SEPTIEMBRE - 2024**  
Fecha de elaboración: 03/10/2024

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad de la Cañada  
Entidad federativa: OAXACA  
Código VIT: 3000000000

Personero

Nombre: ING. ARMANDO MARRÍN NETO  
Cargo: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO  
Teléfono: (091) 372 07 15, Ext. 208  
Correo electrónico: armando.marrin@unca.edu.mx

OPRA / Mantenimiento

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO


OPRA CONCLUIDA

Presupuesto	Número del proyecto	Tipo de proyecto	Monto autorizado (M)	CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA					Monto ejecutado (D)	Remanente (D) R.S.O.	Españoles fabricados (programados/ejecutados)			Acciones que están en el proceso	% de avance	Fechas Reales		Observaciones	Ratificación a la TESORE				Actas				
				Nº. (1) de Contrato (S)	Fecha Programada		Monto Contratado (B)	Comercista			Monto no Contratado (C) Diferencia entre Autorizado y Contratado C.A.B.	Número del Estímulo	Cantidad			Monto Contratado	Inicio		Fin	Linea de Crédito	Fecha de Pago	Fecha de Pago	Fecha de Pago	Fecha de Pago	Fecha de Pago	Fecha de Pago	
					INICIO	TERMINO																					Actas
1	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS, TALLERES Y EDIFICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.	X	\$ 8,071,747.00					\$ 8,071,747.00	\$ -		Laboratorio de Tecnología de Información 1 Laboratorio Clínico 1 Laboratorio de Investigación 1 Laboratorio Farmacológico 1 Laboratorio de Química 1 Edificio de Servicios Generales 1 <b>TOTAL 8 8.00</b>		0.00%			EN PROCESO ADMINISTRATIVO											
2	AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE CAFETERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.	X	\$ 4,560,000.00					\$ 4,560,000.00	\$ -		Cafetería 304 8.00 <b>TOTAL 304 8.00</b>		0.00%			EN PROCESO ADMINISTRATIVO											
3	ADECUACIÓN DE EDIFICIO PARA UN LABORATORIO CLÍNICO UNIVERSITARIO.	X	\$ 1,000,000.00					\$ 1,000,000.00	\$ -		Laboratorios 1 8.00 <b>TOTAL 1 8.00</b>		0.00%			EN PROCESO DE LICITACION											
5	MANTENIMIENTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.	X	\$ 1,380,721.00					\$ 1,380,721.00	\$ -		Mantenimiento y rehabilitación de mobiliario 1 Instalación de Service intercomunicador y de Brincos 1 <b>TOTAL 2 8.00</b>		0.00%			EN PROCESO DE LICITACION											
			\$13,972,468.00						\$13,972,468.00	\$0.00	\$0.00																




OAXACA  
ING. ARMANDO MARRÍN NETO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

PLANIFICACIÓN  
L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ  
VICI-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Universidad de la Cañada  
VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN



Universidad de la Cañada  
RECTORÍA

Universidad de la Cañada  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,  
CONSTRUCCIÓN Y MAN.

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:  
JULIO - SEPTIEMBRE - 2024

Fecha de elaboración: 03/10/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD: 1 Nombre de la obra: EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS, TALLERES Y EDIFICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Carretera Teotitlán- San Antonio Nanahuatipán Km. 1.7; Paraje Titlacuatitla, Teotitlán de Flores Magón Oaxaca.



Porcentaje de avance

0.00%

FOTOS

EN TRÁMITE ADMINISTRATIVO

F1: LABORATORIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

EN TRÁMITE ADMINISTRATIVO

F2: LABORATORIO CLIMATO UNIVERSITARIO

Observaciones :

EN TRÁMITE ADMINISTRATIVO

F3: LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN

EN TRÁMITE ADMINISTRATIVO

F4: LABORATORIO DE QUÍMICA

EN TRÁMITE ADMINISTRATIVO

F5: LABORATORIO DE FARMACOLOGÍA

UNCA  
Universidad de la Cañada  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,  
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

OBRA  
ING. ARMANDO MARRÍN NIETO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.

PLANEACIÓN  
L.C.E ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ  
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

RECTORA  
MTRA. MARIA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS.

NOTA:

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

UNCA  
Universidad de la Cañada  
VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

UNCA  
Universidad de la Cañada  
RECTORÍA

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:  
JULIO - SEPTIEMBRE - 2024

Fecha de elaboración: 03/10/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRORIDAD 2 Nombre de la obra: AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE CAFETERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.



Universidad de la Cañada

Porcentaje de avance

0.00%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO




CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

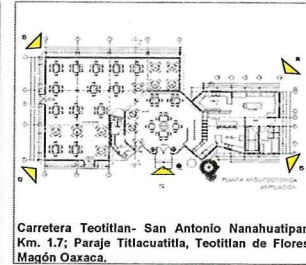

FOTOS



Observaciones:



OBRAS  
ING. ARMANDO MARÍN NIETO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.

PLANEACIÓN  
L.D. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ  
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

RECTORA  
MTRA. MARIA DE LOS ANGELES PERALTA ARIAS.

NOTA:

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial: se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

RECTORÍA

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y Año que se reporta  
JULIO - SEPTIEMBRE - 2024

Fecha de elaboración: 03/10/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Universidad de la Cañada

Porcentaje de avance

0.00%

PRIOIDAD: 3 Nombre de la obra: ADECUACIÓN DE EDIFICIO PARA UN LABORATORIO CLÍNICO UNIVERSITARIO.


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7; Paraje Tittlacuatilla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.


FOTOS



F1:




F2:




Observaciones:



F3:



F4:



F5:

OBRAS



ING. ARMANDO MARÍN NIÑO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.

PLANEACIÓN

LIC. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ  
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

RECTORIA

DR. MARIA DE LOS ANGELES PERALTA ARIAS.



\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta  
JULIO - SEPTIEMBRE - 2024

Fecha de elaboración: 03/10/2024

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

 Universidad de la Cañada Porcentaje de avance <b>0.00%</b>	PRIORIDAD <b>5</b> Nombre de la obra: <b>MANTENIMIENTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.</b>	<b>GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</b> 	<b>CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO</b> 	<b>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS</b>  Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipán Km. 1.7; Paraje Tihlacuatitla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOTOS

EN PROCESO DE LICITACIÓN <small>F1: Servicios Jurídicos</small>	EN PROCESO DE LICITACIÓN <small>F2: Servicios Generales</small>	Observaciones :
EN PROCESO DE LICITACIÓN <small>F3: Servicios Académicos</small>	EN PROCESO DE LICITACIÓN <small>F4: Servicios Económicos</small>	EN PROCESO DE LICITACIÓN <small>F5: Servicios Bibliotecarios</small>



OBRAS  
 ING. ARMANDO MORALES  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.



VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN  
 L.C.E ALFONSO MARTÍNEZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



RECTORÍA  
 MTRA. MARIA DE LOS ANGELES PERALTA ARIAS.

NOTA: Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. El primer día de mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

Universidad de la Cañada  
 VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

Universidad de la Cañada  
 RECTORÍA
